



# PREFEITURA DE VALINHOS

Ofício nº 517/2020-DTL/GP/P

Valinhos, em 26 de maio de 2020

Ref.: Requerimento nº 632/20-CMV

Vereador Alécio Cau

Processo administrativo nº 8.159/2020-PMV

Excelentíssima Senhora Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **Alécio Cau**, consultada a área competente da Municipalidade, referente à existência de aditivos contratuais na construção da escola dos Cocais, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

1. Foi realizado algum aditivo contratual?
  - a. Caso positivo encaminhar cópias.
2. Qual foi a justificativa para o aditivo contratual?
  - a. Enviar cópia da justificativa.
3. Conforme o edital da concorrência disponível no site da prefeitura municipal de Valinhos, no item 12.3.2:

"Atestado(s) ou certidão (ões) emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado em nome da **LICITANTE** que comprove sua capacidade operacional e desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação devidamente registrado no CREA ou no CAU, comprovando a execução de obra(s) de características semelhantes à licitada, onde constem os serviços de maior relevância e nos seguintes quantitativos mínimos :

-Execução de mínimo 1.780m<sup>2</sup> (mil setecentos e oitenta metros quadrados) de piso cerâmico esmaltado com textura semi-rugosa PEI-5 resistência química A, para áreas internas, assentado com argamassa mista ou similar;

-Execução de no mínimo 5.018m<sup>2</sup> (cinco mil e dezoito metros quadrados) de aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos ou similar;

-Execução de no mínimo 1.780m<sup>2</sup> (mil setecentos e oitenta metros quadrados ) de argamassa de regularização cim/areia 1:3 esp= até 2,50cm ou similar ;

CÂMARA MUNICIPAL VALINHOS PROTOCOLO 27/05/2020 12:24 00000001579



# PREFEITURA DE VALINHOS

- Execução de no mínimo 1.126m<sup>2</sup> (mil cento e vinte e seis metros quadrados) de emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 45 mm ou similar;
- Execução de mínimo de 187 (cento e oitenta e sete) luminárias tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa, ou similar;
- Execução de no mínimo 425m<sup>2</sup> (quatrocentos e vinte e cinco metros quadrados) de revestimento em epoxi autonivelante 2 mm<sup>2</sup> ou similar;
- Execução de no mínimo 1.266 m<sup>2</sup> (mil duzentos e sessenta e seis metros quadrados) de verniz sintético brilhante em concreto ou tijolo, duas demãos ou similar;
- Execução de no mínimo 1.015 m(mil e e quinze metros) de rodapé cerâmica antiderrapante altura 7cm (monoqueima) uso exclusivo padrão creche ou similar;
- Execução de no mínimo 626 m<sup>2</sup> (seiscentos e vinte e seis metros quadrados) de forro em placas de gesso, para ambientes comerciais ou similar;
- Execução de no mínimo 323m<sup>2</sup> (trezentos e vinte e três metros quadrados) de execução de passeio (calçada) em concreto (cimento/areia/seixo rolado), preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento ou similar;
- Execução de no mínimo de 1.780 m<sup>2</sup> ( mil setecentos e oitenta metros quadrados) de Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base (TOTAL 3 CM) ou similar;
- Execução de no mínimo 118 m<sup>2</sup> (cento e dezoito metros quadrados) de chapisco rustico traco 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 2cm, preparo manual da argamassa ou similar;
- Execução de instalação elétrica, com a utilização de no mínimo 3.800 (três mil e oitocentos) metros de cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm<sup>2</sup>, anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais ou similar
- Execução de no mínimo 104m<sup>3</sup> (cento e quatro metros cúbicos) de reaterro interno (edificações) compactado manualmente ou similar.
- Execução de no mínimo 250m<sup>2</sup> (duzentos e cinquenta metros quadrados) de cobertura com telha de aço zincado, trapezoidal, espessura de 0,5mm, incluindo acessórios (FECHAMENTO LATERAL) ou similar
- Execução de Projeto executivo de proteção contra incêndio que contemple área mínima de 2.000m<sup>2</sup> (dois mil metros quadrados) ou similar



# PREFEITURA DE VALINHOS

- Execução no mínimo 501m<sup>2</sup> (quinhentos e um metros quadrados) de pintura para telhas de alumínio com tinta esmalte automotiva ) ou similar
- Execução de instalação elétrica com a utilização de no mínimo 1.750 m (mil setecentos e cinco metros) de cabo de cobre flexível isolado, 6 mm<sup>2</sup>, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais ou similar
- Execução de no mínimo 38m<sup>2</sup> (trinta e oito ) metros quadrados de alambrado em tubos de aço galvanizado, com costura, din 2440, diametro 2", altura 3m, fixados a cada 2m em blocos de concreto, com tela de arame galvanizado revestido com pvc, fio 12 bwg e malha 7,5x7,5cm ou similar
- Execução de no mínimo 125m (cento e vinte e cinco metros) de tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante ou similar. "

Algum destes itens foi suprimido ou estornado em parte ou na sua totalidade?

- a. Caso positivo especificar o(s) item(ns), a quantidade, o percentual e sua(s) justificativa(s) para o estorno ou supressão.

**Resposta:** Encaminho, na forma do anexo, as informações disponibilizadas pelo Secretário de Licitações, capazes de esclarecer os questionamentos apresentados pelo nobre Vereador requerente.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.

  
**ORESTES PREVITALE JÚNIOR**  
Prefeito Municipal

Anexo: 57 folhas.

A

Sua Excelência, a senhora

**DALVA DIAS DA SILVA BERTO**

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

(PMB/pmb)



# PREFEITURA DE VALINHOS

Fls. Nº 1685	Rubrica
Proc. Nº/Ano	245/18

**CI nº 177 / 2019 – DOP / SOSP / 2019.**

Valinhos, 15 de agosto de  
2019.

**Para:** Secretaria de Licitações  
**De:** Secretaria de Obras e Serviços Públicos / Departamento de Obras  
Públicas

**Assunto:** Aditivo do valor contratual do Contrato nº 181/2018, Ordem  
de Execução de Serviços nº 02/2019 de 30/01/2019 – Término EMEB  
Alvorada.

Solicitamos a elaboração de um aditivo de valor contratual para  
o Contrato nº 181/2018 que trata da contratação de empresa  
especializada de engenharia, para a execução do término da construção  
da EMEB ALVORADA localizada na Rua Antônio Carlos Prado, 17, Parque  
dos Cocais, conforme o que segue:

- Item 1.0; 7.0; 12.0; 16.0; 17.0; 19.0; 21.0 e 22.0- reposições em  
função dos vandalismos e furtos ocorridos após o término do processo  
licitatório;
- Itens 2.0 e 3.0 – alterados em função dos novos projetos estruturais  
(anexos);
- Itens 4.0; 13.0; 15.0; 18.0 mantidos inalterados;
- Itens 5.0 e 6.0, excluídos;
- Itens 8.0; 9.0; 10.0; 20.0 reduzidos em função da verificação "in  
loco";
- Item– 11.0; adequações de projeto para atender às solicitações da  
Secretaria da Educação. A inclusão do item 11.10I – Janela de aço  
basculante, se faz necessária em virtude de a fachada leste ser toda aberta  
e receber uma incidência muito grande de ventos e chuva, além de pôr em  
risco a vida dos alunos devido sua altura;



# PREFEITURA DE VALINHOS

Fls. Nº **1686** Rubrica

Proc. Nº/Ano **245/18**

- Item 14.0 – necessidade de readequação dos quadros de distribuição, verificação e melhoria da rede de alimentação dos aparelhos de ar condicionado, previstos no projeto (anexos);

Ficando na seguinte situação:

- Contrato com o valor de R\$ 2.178.349,25
- Aditivo com o valor de R\$ 254.441,03

Sendo assim o aditivo solicitado representa 13,23% do valor inicial do contrato conforme previsto na Lei 8666/93, anexos a nova planilha de custos com a sua respectiva memória de cálculo, novo projeto estrutural do muro de arrimo frontal, novo projeto da mureta de contenção, novo projeto dos quadros elétricos e demais adequações para atender aos ajustes solicitados pela Secretaria de Educação.

Desta forma nada mais a acrescentar ao solicitado, submetendo o exposto a considerações e determinações superiores quanto a continuidade do pedido.

Eng.º Fernando Silva de Barros  
**Departamento de Obras  
Públicas**  
Diretor

Eng.º Gerson Luís Segato  
**Secretaria de Obras e  
Serviços Públicos**  
Secretário



# PREFEITURA DE VALINHOS

Ofício nº 032/2020

**Da:** Secretaria de Licitações

**Para:** Gabinete do Prefeito/Departamento Técnico-Legislativo

**Assunto:** Resposta ao Requerimento nº 632/2020

Diante da solicitação formulada pelo Departamento Técnico-Legislativo, através da Comunicação Interna nº 668/2020 - DTL/GP, que solicitou informações, para instruir a resposta ao Requerimento nº 632/2020, de autoria do Vereador Alécio Cau, informar o que segue:

1. Foram realizados 02 (dois) termos aditivos, conforme cópias em anexo.
2. Cópia das justificativas, em anexo.
3. O Item 12.3.2 do Edital, prescreve sobre as condições para comprovação da capacidade técnica operacional. Esta comprovação é realizada ANTES mesmo da classificação e consequente homologação da contratação.

Cumprе esclarecer ao Nobre Edil, que para efeito de qualificação técnica operacional das empresas licitantes, a Administração deve, com base a teor do artigo 30, inciso II da Lei Federal nº 8666/1993, exigir atestados referentes à sua capacitação técnica, com vistas à *“comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação”*.

A Lei nº 8.666/93 não estabelece limites para exigências quanto à capacitação técnico-operacional de empresas licitantes, devendo tais limites serem estabelecidos em cada caso, como o foram por ocasião do Edital.




## **PREFEITURA DE VALINHOS**


Ainda, o art. 37, XXI da Constituição Federal, em sua parte final, “*exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações*”, reflete que o propósito da exigência de qualificação técnica é garantir iguais oportunidades de contratação com o Poder Público, não a todo e qualquer interessado, indiscriminadamente, mas sim, APENAS aqueles que cumprirem os requisitos mínimos do Edital.

Assim, as licitantes apenas são classificadas e declaradas vencedoras após o cumprimento de TODAS as cláusulas do Edital.

Portanto, a comprovação da capacidade técnica é sempre TOTAL, nos Termos de cada Edital, nunca parcial, não havendo que se falar em “supressão” ou “estorno” de cláusulas Edilícias, como perguntou o Nobre Edil.

Valinhos, 21 de maio de 2020.

  
**Monica Viviane Faria Dantas**  
Diretora de Compras e Expediente

  
**Markson Elianai Vieira**  
Secretário de Licitações



# PREFEITURA DE VALINHOS

Fis. Nº 1685 Rubrica

Proc. Nº/Ano 245/18

**CI nº 177 / 2019 – DOP / SOSP / 2019.**

Valinhos, 15 de agosto de  
2019.

**Para:** Secretaria de Licitações

**De:** Secretaria de Obras e Serviços Públicos / Departamento de Obras Públicas

**Assunto:** Aditivo do valor contratual do Contrato nº 181/2018, Ordem de Execução de Serviços nº 02/2019 de 30/01/2019 – Término EMEB Alvorada.

Solicitamos a elaboração de um aditivo de valor contratual para o Contrato nº 181/2018 que trata da contratação de empresa especializada de engenharia, para a execução do término da construção da EMEB ALVORADA localizada na Rua Antônio Carlos Prado, 17, Parque dos Cocais, conforme o que segue:

- Item 1.0; 7.0; 12.0; 16.0; 17.0; 19.0; 21.0 e 22.0- reposições em função dos vandalismos e furtos ocorridos após o término do processo licitatório;
- Itens 2.0 e 3.0 – alterados em função dos novos projetos estruturais (anexos);
- Itens 4.0; 13.0; 15.0; 18.0 mantidos inalterados;
- Itens 5.0 e 6.0, excluídos;
- Itens 8.0; 9.0; 10.0; 20.0 reduzidos em função da verificação "in loco";
- Item- 11.0; adequações de projeto para atender às solicitações da Secretaria da Educação. A inclusão do item 11.10I – Janela de aço basculante, se faz necessária em virtude de a fachada leste ser toda aberta e receber uma incidência muito grande de ventos e chuva, além de pôr em risco a vida dos alunos devido sua altura;





# PREFEITURA DE VALINHOS

Fls. Nº 1686 Rubrica

Proc. Nº/Ano 245/18

- Item 14.0 – necessidade de readequação dos quadros de distribuição, verificação e melhoria da rede de alimentação dos aparelhos de ar condicionado, previstos no projeto (anexos);

Ficando na seguinte situação:

- Contrato com o valor de R\$ 2.178.349,25
- Aditivo com o valor de R\$ 254.441,03

Sendo assim o aditivo solicitado representa 13,23% do valor inicial do contrato conforme previsto na Lei 8666/93, anexos a nova planilha de custos com a sua respectiva memória de cálculo, novo projeto estrutural do muro de arrimo frontal, novo projeto da mureta de contenção, novo projeto dos quadros elétricos e demais adequações para atender aos ajustes solicitados pela Secretaria de Educação.

Desta forma nada mais a acrescentar ao solicitado, submetendo o exposto a considerações e determinações superiores quanto a continuidade do pedido.

Eng.º Fernando Silva de Barros  
**Departamento de Obras  
Públicas**  
Diretor

Eng.º Gerson Luís Segato  
**Secretaria de Obras e  
Serviços Públicos**  
Secretário



**Obra:** Término da Construção da EMEB Alvorada  
**Local:** R. Antônio Carlos Prado - Parque dos Cocais - Valinhos - SP  
**Contrato:** 181/2018  
**Prazo:** 18 meses  
**Data Base:** mar/18  
**Revisão:** 0

**CPOS-171-SD-NOV/2017**  
**SINAPI-SD-JAN/2018**  
**SIURB-EDIF-SD-JUL/2017**

Item	Descrição dos Serviços	Un	Quant.	Preço Unitário Final	Contratado	INCLUSÕES		EXCLUSÕES		Total Geral/Final	
						Quant.	Total	Quant.	Total	Quant.	Total
3	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-60 Ø 5,0mm - montagem. Af_12/2015	kg	210,40	9,19	1.933,20	50,24	461,62			260,64	2.394,82
4	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-50 Ø 12,5mm - montagem. Af_12/2015	kg	570,60	5,27	3.008,72	355,08	1.872,30			925,68	4.881,02
5	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-50 Ø 16,0mm - montagem. Af_12/2015	kg	785,60	4,85	3.810,07	225,89	1.095,54			1.011,49	4.905,61
6	Concretagem de pilares, fck=25Mpa, c/ uso de bomba em edificação c/ seção média de pilares menor ou igual a 0,25m² - lançamento, adensamento e acabamento. Af_12/2015	m³	22,67	311,59	7.063,81			-22,67	-7.063,81		
7	Alvenaria embasamento esp. = 20cm bloco concreto	m³	13,60	329,85	4.485,98			-13,60	-4.485,98		
8	Chapisco rustico traço 1:3 (cimento e areia grossa), esp. = 2cm, preparo manual da argamassa	m²	236,60	10,63	2.516,08			-236,60	-2.516,08		
9	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400lts, aplicada manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m², esp. = 20mm, c/ execução de taliscas. Af_06/2014	m²	108,94	26,70	2.908,59			-108,94	-2.908,59		
20	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. Af_06/2014	m²	108,94	2,10	228,27			-108,94	-228,27		
21	Aplicação manual de pintura c/ tinta látex PVA em paredes, duas demãos. Af_06/2014	m²	108,94	8,16	888,44			-108,94	-888,44		
22	Impermeabilização de estruturas enterradas, c/ tinta asfáltica, duas demãos	m²	18,20	10,34	188,17	99,95	1.033,40			118,15	1.221,58
23	Impermeabilização de superfície c/ argamassa de cimento e areia (média), traço 1:3, c/ aditivo impermeabilizante, esp. = 2cm	m²	167,29	41,34	6.915,30			-33,58	-1.388,10	133,71	5.527,19
24-1	Estaca escavada mecanicamente, s/ fluido estabilizante, Ø 25cm, até 9,00m de comprimento, concreto lançado por caminhão betoneira (exclusive mobilização e desmobilização). Af_02/2015	m		37,89		125,20	4.744,10			125,20	4.744,10
25-1	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-50 Ø 6,3mm - montagem. Af_12/2015	kg		7,80		143,10	1.116,29			143,10	1.116,29
26-1	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-50 Ø 8,0mm - montagem. Af_12/2015	kg		7,41		167,97	1.244,20			167,97	1.244,20
27-1	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-50 Ø 10,0mm - montagem. Af_12/2015	kg		5,97		1.142,55	6.822,24			1.142,55	6.822,24
28-1	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-50 Ø 20,0mm - montagem. Af_12/2015	kg		4,42		350,30	1.547,21			350,30	1.547,21
29-1	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 19x19x39cm (esp. = 19cm) de paredes c/ área líquida menor que 6m² s/ vãos e argamassa de assentamento c/ preparo em betoneira. Af_06/2014. Af_06/2014	m²		75,98		26,20	1.990,70			26,20	1.990,70
<b>Mureta de Contenção</b>						<b>28.970,11</b>	<b>4.711,00</b>		<b>-21.961,56</b>		<b>1.718,55</b>
1	Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, s/ transporte)	m³	97,95	14,68	1.437,67			-97,95	-1.437,67		
2	Transporte local c/ caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada (para distâncias superiores a 4km)	m³ x Km	117,54	1,20	141,07			-117,54	-141,07		
3	Reatero interno (edificações) compactado manualmente	m³	97,95	46,27	4.531,73			-97,95	-4.531,73		
4	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,50m excluindo esgotamento / escoramento	m³	4,11	76,31	313,63			-0,06	-4,58	4,05	309,05
5	Estaca a trado (broca) Ø 25cm c/ concreto fck=15Mpa + 20kg aço/m³ moldado "in-loco"	m	42,00	92,70	3.893,35			-42,00	-3.893,35		
6	Fôrma tábuas p/ concreto em fundação s/ reaproveitamento	m²	58,12	62,66	3.642,08			-56,08	-3.514,00	2,04	128,09
7	Lastro de brita	m³	0,59	107,29	63,30					0,59	63,30
8	Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-60 Ø 5,0mm - montagem. Af_12/2015	kg	84,80	10,41	882,60			-84,80	-882,60		

Proc. Nº/Ano **16888**  
**245/18**  
 Rubrica

Obra: Término da Construção da EMEB Alvorada  
 Local: R. Antônio Carlos Prado - Parque dos Cocais - Valinhos - SP

CPOS-171-SD-NOV/2017  
 SINAPI-SD-JAN/2018  
 SIURB-EDJF-SD-JUL/2017

Contrato: 181/2018  
 Prazo: 18 meses  
 Data Base: mar/18  
 Revisão: 0

Item	Descrição dos Serviços	Un	Quant.	Preço Unitário Final	Contratado	INCLUSÕES		EXCLUSÕES		Total Geral Final	
						Quant.	Total	Quant.	Total	Quant.	Total
9	Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-50 Ø 10,0mm - montagem. Af. 12/2015	kg	151,00	6,49	980,41			-151,00	-980,41		
10	Formas manuseáveis para paredes de concreto moldadas in loco, de edificações de pavimento único, em painéis de fachada sem vãos. Af. 06/2015	m²	55,96	11,09	620,42			-55,96	-620,42		
11	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-60 Ø 5,0mm - montagem. Af. 12/2015	kg	103,20	9,19	948,22		-614,83			36,29	333,40
12	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-50 Ø 10,0mm - montagem. Af. 12/2015	kg	231,00	5,97	1.379,38			-61,60	-367,84	169,40	1.011,55
13	Concretagem de pilares, fck=25Mpa, c/ uso de bomba em edificação c/ seção média de pilares menor ou igual a 0,25m² - lançamento, adensamento e acabamento. Af. 12/2015	m³	8,54	311,59	2.661,00			-5,96	-1.857,25	2,58	803,75
14	Alvenaria embasamento esp = 20cm bloco concreto	m³	6,80	329,85	2.242,99			-6,80	-2.242,99		
15	Chapisco rústico traço 1:3 (cimento e areia grossa), esp.= 2cm, preparo manual da argamassa	m²	96,90	10,63	1.030,47			-53,70	-571,06	43,20	459,40
16	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico c/ betoneira 400lts, aplicada manualmente em faces internas de paredes de ambientes c/ área maior que 10m², esp.= 20mm, c/ execução de taliscas. Af. 06/2014	m²	50,92	26,70	1.359,51		-253,11			41,44	1.106,41
17	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. Af. 06/2014	m²	51,90	2,10	108,75			-10,46	-21,92	41,44	86,83
18	Aplicação manual de pintura c/ tinta látex PVA em paredes, duas demãos. Af. 06/2014	m²	51,90	8,16	423,26			-10,46	-85,30	41,44	337,96
19	Impermeabilização de estruturas enterradas, c/ tinta asfáltica, duas demãos.	m²	26,42	10,34	273,16		33,91			29,70	307,07
20	Impermeabilização de superfície c/ argamassa de cimento e areia (média), traço 1:3, c/ aditivo impermeabilizante, esp.= 2cm.	m²	49,28	41,34	2.037,10			-19,58	-809,38	29,70	1.227,71
21.1	Estaca escavada mecanicamente, s/ fluido estabilizante, Ø 25cm, até 9,00m de comprimento, concreto lançado por caminhão betoneira (exclusive mobilização e desmobilização). Af. 02/2015	m		37,89		15,00	568,38			15,00	568,38
22.1	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-50 Ø 6,3mm - montagem. Af. 12/2015	kg		7,80		59,40	463,36			59,40	463,36
23.1	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 19x19x39cm (esp.= 19cm) de paredes c/ área líquida menor que 6m² s/ vãos e argamassa de assentamento c/ preparo em betoneira. Af. 06/2014. Af. 06/2014	m²		75,98		59,40	4.513,27			59,40	4.513,27
<b>Dreno para Muro e Mureta</b>					<b>3.506,22</b>						<b>3.506,22</b>
1	Fornecimento e assentamento de brite 2 - drenos e filtros	m³	21,45	66,99	1.437,01					21,45	1.437,01
2	Execução de dreno c/ manta geotêxtil 200g/m²	m²	254,50	5,85	1.489,67					254,50	1.489,67
3	Tubo PVC corrugado perfurado Ø 100mm c/ junta elástica para drenagem.	m	5,40	31,82	171,85					5,40	171,85
4	Tubo PVC Ø 2" c/ material drenante para dreno/barbacã - fornecimento e instalação	m	10,50	16,41	172,29					10,50	172,29
5	Leito filtrante - colocação de areia nos filtros	m³	2,67	88,16	235,40					2,67	235,40
<b>Superestrutura</b>					<b>3.515,33</b>						<b>3.515,33</b>
1	Demolição de alvenaria estrutural de blocos vazados de concreto	m³	5,30	57,65	305,53			-5,30	-305,53		
2	Transporte de entulho c/ caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada, DMT 0,5 a 1,0km	m³	6,36	5,86	37,29			6,36	-37,29		
3	Fôrmas manuseáveis para paredes de concreto moldadas "in loco", de edificações de pavimento único, em painéis de fachada sem vãos Af. 06/2015	m²	53,35	11,09	591,48			-53,35	-591,48		
4	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-50 Ø 8,0mm - montagem. Af. 12/2015	kg	120,34	7,41	891,44			120,34	-891,44		

Próc. Nº/Ano **245/18**  
 Rubrica

**Obra:** Término da Construção da EMEB Alvorada  
**Local:** R. Antônio Carlos Prado - Parque dos Cocais - Valinhos - SP  
**Contrato:** 181/2018  
**SINAPI-SD-JAN/2018**  
**SIURB-EDIF-SD-JUL/2017**  
**Prazo:** 18 meses  
**Data Base:** mar/18  
**Revisão:** 0

Item	Descrição dos Serviços	Un	Quant.	Preço Unitário Final	Contratado	INCLUSÕES		EXCLUSÕES		Total Geral Final	
						Quant.	Total	Quant.	Total	Quant.	Total
5	Concreto fck=15Mpa, preparo c/ betoneira, s/ lançamento	m³	4,29	204,10	875,58			-4,29	-875,58		
5	Lançamento c/ uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF_12/2015	m³	4,29	189,75	814,01			-4,29	-814,01		
	<b>Cobertura</b>				<b>3.349,96</b>				<b>-2.875,11</b>		<b>474,86</b>
1	Retirada de telhas ondulada de fibro-cimento/plast ou alumínio/plana pré fabricada	m²	42,00	5,59	234,68			-42,00	-234,68		
2	Telhamento c/ telha ondulada de fibra de vidro esp. = 0,6mm, para telhado c/ inclinação maior que 10º, c/ até 2 águas, incluso içamento. AF_06/2016	m²	42,00	47,49	1.994,40			-32,00	-1.519,54	10,00	474,86
3	Telhamento c/ telha de aço/alumínio esp. = 0,5mm, c/ até 2 águas, incluso içamento. AF_06/2016 (colocação de telha de aço galvanizado trapezoidal)	m²	30,00	37,36	1.120,88			-30,00	-1.120,88		
	<b>Águas Pluviais</b>				<b>29.539,50</b>		<b>774,79</b>		<b>-17.249,32</b>		<b>13.064,97</b>
1	Tubo PVC, série R, água pluvial, Ø 75mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. AF_12/2014_p	m	61,44	29,12	1.789,07			-61,44	-1.789,07		
2	Tubo PVC, série R, água pluvial, Ø 100mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. AF_12/2014_p	m	211,55	25,83	5.465,03			-118,91	-3.071,83	92,64	2.393,19
3	Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, Ø 150mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. AF_12/2014_p	m	16,05	42,65	684,46			-16,05	-684,46		
4	Tubo de PVC para rede coletora de esgoto de parede maciça, Ø 200mm, junta elástica, instalado em local c/ nível alto de interferências - fornecimento e assentamento. AF_06/2015	m	62,36	65,43	4.080,17					62,36	4.080,17
5	Canha/canaleta de concreto simples, tipo meia cana, Ø 30cm, para água pluvial	m	25,00	23,37	584,35		46,75			27,00	631,10
6	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de esgoto sanitário, Ø 300mm, junta elástica, instalado em local c/ baixo nível de interferências (não inclui fornecimento). AF_12/2015	m	25,00	7,67	191,83		15,35			27,00	207,18
7	Tubo concreto simples Ø 400mm para drenagem - fornecimento e instalação inclusive escavação manual 1,50m³/m	m	21,18	154,85	3.279,77			-21,18	-3.279,77		
8	Grelha de fofo para canaleta L= 15cm, fornecimento e assentamento	m	2,50	120,20	300,51					2,50	300,51
9	Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, s/ transporte)	m³	29,40	14,68	431,52			-29,40	-431,52		
10	Transporte local c/ caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada (para distâncias superiores a 4km)	m³ x km	35,28	1,20	42,34			-35,28	-42,34		
11	Reaterro interno (edificações) compactado manualmente	m³	29,40	46,27	1.360,21			-29,40	-1.360,21		
12	Demolição de concreto simples	m³	0,03	158,53	4,76			-0,03	-4,76		
13	Transporte de entulho c/ caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada, DMT 0,50 a 1,00km	m³	0,03	5,86	0,18			-0,03	-0,18		
14	Concreto fck=15Mpa, preparo c/ betoneira, s/ lançamento	m³	0,03	204,10	6,12			-0,03	-6,12		
15	Lançamento c/ uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF_12/2015	m³	0,03	189,75	5,69			-0,03	-5,69		
16	Caixa de passagem 60 x 60 x 70cm fundo brita c/ tampa	un	24,00	374,12	8.978,88			-14,00	-5.237,68	10,00	33.741,20
17	Caixa de passagem 80 x 80 x 62cm fundo brita c/ tampa	un	3,00	445,23	1.335,68			-3,00	-1.335,68		
18	Ralo seco em Fofo, 100 x 165 x 50mm, c/ grelha metálica saída vertical	un	1,00	93,78	93,78					1,00	93,78
19	Ralo sifonado em Fofo 150 x 240 x 75mm, c/ grelha	un	3,00	301,72	905,15					3,00	905,15
20-1	Joelho 90º graus, PVC, serie R, água pluvial, Ø 100mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. AF_12/2014	un		23,76			712,69			30,00	712,69

**Fs. Nº** 1690  
**Prod. Nº/Aro** 245/18

Obra: Término da Construção da EMEB Alvorada  
 Local: R. Antônio Carlos Prado - Parque dos Cocais - Valinhos - SP

CPOS-171-SD-NOV/2017  
 SINAPI-SD-JAN/2018  
 SIURB-EDIF-SD-JUL/2017

Contrato: 181/2018  
 Prazo: 18 meses  
 Data Base: mar/18

Revisão: 0

Item	Descrição dos Serviços	Un	Quant.	Preço Unitário Final	Contratado	INCLUSÕES		EXCLUSÕES		Total Geral Final	
						Quant.	Total	Quant.	Total	Quant.	Total
<b>Caixa de Dissipação</b>											
1	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,50m excluindo esgotamento / escoramento	m³	90,72	76,31	17.769,69						9.147,82
2	Regularização e compactação manual de terreno c/ soquete	m²	55,64	5,76	320,75			-90,72	-6.922,80		
3	Lastro de brita	m³	1,68	107,29	180,24			-55,64	-320,75		
4	Lastro de concreto não-estrutural, esp.= 5cm, preparo c/ betoneira	m²	55,64	21,51	1.197,07			-1,68	-180,24		
5	Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5 x 10 x 20cm 1 vez (esp.= 20cm), assentado c/ argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	47,72	120,59	5.754,46			-55,64	-1.197,07		
6	Emboço cimento areia 1:4 esp.= 1,5cm incluso chapisco 1:3 eps.= 9mm	m²	72,40	43,55	3.153,06						
7	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico c/ betoneira 400lts, aplicada manualmente em faces internas de paredes de ambientes c/ área maior que 10m², esp.= 20mm, c/ execução de taliscas. Af. 06/2014	m²	9,00	26,70	240,29						
<b>Tampa de Concreto</b>											
1	Fôrma tábua p/ concreto em fundação s/ reaproveitamento	m²	1,28	62,66	80,21						420,87
2	Concreto fck=15Mpa, preparo c/ betoneira, s/ lançamento	m³	0,52	204,10	106,13						80,21
3	Lançamento c/ uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. Af. 12/2015	m³	0,52	189,75	98,67						106,13
4	Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-50 Ø 8,0mm - montagem. Af. 12/2015	kg	16,76	8,11	135,86						98,67
5	Reaterro interno (edificações) compactado manualmente	m³	71,20	46,27	3.294,12			-71,20	-3.294,12		
<b>Calçadas e Passeios Públicos</b>											
0	Capina e limpeza manual de terreno c/ pequenos arbustos	m²	665,89	1,53	43.944,00						8.093,26
0.1	Escavação manual de valas em terra compacta, prof. de 0,00m < h <= 1,00m	m³	60,36	76,31	1.021,91						1.021,91
0.2	Transporte local c/ caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada (para distâncias superiores a 4km)	m³ x km	114,66	1,20	137,61			-60,36	-4.606,04		
0.3	Espalhamento de material em botas fora, c/ utilização de trator de esteiras de 165hp	m³	99,39	0,99	98,75			-114,66	-137,61		
0.4	Execução de passeio (calçada) em concreto (cimento/areia/seixo rolado), preparo mecânico, esp.= 7cm, c/ junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento	m²	647,09	48,01	31.064,85			-99,39	-98,75		
0.5	Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, s/ transporte)	m³	11,15	14,68	163,65			-500,00	-24.003,50		
0.6	Transporte local c/ caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada (para distâncias superiores a 4km)	m³ x km	13,38	1,20	16,06			-11,15	-163,65		
0.7	Reaterro interno (edificações) compactado manualmente	m³	11,15	46,27	515,86			-13,38	-16,06		
0.8	Piso podotátil de concreto - direcional e alerta 25 x 25 x 2,50cm	Un	90,00	6,43	579,04			-11,15	-515,86		
0.9	Demolição de alvenaria estrutural de blocos vazados de concreto	m³	0,18	57,65	10,38			-90,00	-579,04		
0.10	Demolição de concreto simples (guia e sarjeta) rebacamento pne	m³	2,03	158,53	321,03			-0,18	-10,38		
0.11	Regularização e compactação de subleito até 20cm de esp.	m²	2,76	1,32	3,64			-2,03	-321,03		
0.12	Assentamento de guia (melo fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 10 x 15 x 13 x 20cm (comprimento x base inferior x base superior x altura) para urbanização interna de empreendimentos. Af. 06/2016_p	m	30,00	34,68	1.040,32			-2,76	-3,64		
0.13								-30,00	-1.040,32		



**Obra:** Término da Construção da EMEB Alvorada  
**Local:** R. Antônio Carlos Prado - Parque dos Cocais - Valinhos - SP

**Contrato:** 181/2018  
**Prazo:** 18 meses  
**Data Base:** mar/18  
**Revisão:** 0

**CPOS-171-SD-NOV/2017**  
**SINAPI-SD-JAN/2018**  
**SIURB-EDIF-SD-JUL/2017**

Item	Descrição dos Serviços	Un	Quant.	Preço Unitário Final	Contratado	INCLUSÕES		EXCLUSÕES		Total Geral Final	
						Quant.	Total	Quant.	Total	Quant.	Total
<b>4</b>	<b>Elétrica</b>				<b>251.258,50</b>	<b>215.141,34</b>	<b>-108.735,35</b>	<b>357.644,49</b>			
1.1	Luminária tipo calha, de sobrepor, c/ reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação	Un	374,00	216,66	81.031,25		-374,00	-81.031,25			
1.2	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 40 disjuntores termomagnéticos monopolares, c/ barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação (8 quadros internos e 02 de entrada)	un	12,00	825,03	9.900,38		-3,00	-2.475,10		9,00	7.425,29
1.3	Tomada 2P+T de 20A - 250V, completa	cj	254,00	21,10	5.359,77					254,00	5.359,77
1.4	Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af. 12/2015	un	100,00	23,69	2.368,87					100,00	2.368,87
1.5	Interruptor paralelo (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af. 12/2015	un	30,00	29,32	879,47					30,00	879,47
1.6	Luminária blindada arandela 45º e 90º, Refletor de Led área externa	un	10,00	749,16	7.491,55					10,00	7.491,55
1.7	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA (americano) 10 a 30A 240V, fornecimento e instalação	un	120,00	11,97	1.436,67		-120,00	-1.436,67			
1.8	Disjuntor termomagnético bipolar padrão NEMA (americano) 10 a 50A 240V, fornecimento e instalação	un	35,00	59,11	2.068,97		-35,00	-2.068,97			
1.9	Dispositivo Diferencial Residual de 25A x 30ma - 2 pólos	un	10,00	134,40	1.344,00		-10,00	-1.344,00			
1.10	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm², anti-chama 0,6/1,0kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af. 12/2015	m	7.600,00	3,08	23.401,45	3.099,43		9.543,57		10.699,43	32.945,02
1.11	Cabo de cobre flexível isolado, 6mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af. 12/2015	m	3.500,00	5,21	18.248,56		-3.020,00	-15.745,90		480,00	2.502,66
1.12	Cabo de cobre flexível isolado, 10mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af. 12/2015	m	750,00	8,84	6.632,93		-447,63	-3.958,80		302,37	2.674,13
1.13	Cabo de cobre flexível isolado, 16mm², anti-chama 450/750V, para distribuição - fornecimento e instalação. Af. 12/2015	m	250,00	12,75	3.187,35					250,00	3.187,35
1.14	Cabo de cobre flexível isolado, 35mm², anti-chama 450/750V, para distribuição - fornecimento e instalação. Af. 12/2015	m	300,00	17,69	5.306,35					300,00	5.306,35
1.15	Tomada para telefone de 4 polos padrão telebras - fornecimento e instalação	un	108,00	26,71	2.884,55					108,00	2.884,55
1.16	Cabo de cobre flexível isolado, 150mm², anti-chama 0,6/1,0kv, para distribuição - fornecimento e instalação. Af. 12/2015	m	160,00	71,06	11.369,00	5,60		397,92		165,60	11.766,92
1.17	Eletroduto rígido rosçável, PVC, Ø 85 mm (3") - fornecimento e instalação. Af. 12/2015	m	30,00	22,49	674,66		-30,00	-674,66			
1.18	Quadro Telebrás de embutir de 400 x 400 x 120mm	un	1,00	161,83	161,83					1,00	161,83
1.19	Fio telefônico tipo FI-60, para ligação de aparelhos telefônicos	m	300,00	3,02	906,03					300,00	906,03
1.20	Quadro Telebrás de embutir de 400 x 400 x 120mm (caixas de passagem de parede 40 X 40cm)	un	25,00	161,83	4.045,67					25,00	4.045,67
1.21	Interruptor pulsador de campainha ou minuteria 2A/250V c/ caixa - fornecimento e instalação (campainha/interfone)	un	2,00	19,66	39,31					2,00	39,31
1.22	Tomada para antena de TV, cabo coaxial de 9mm, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa, módulo e suporte), (ponte de TV seco para edifícios)	Un	28,00	14,70	411,52					28,00	411,52
1.23	Cabo coaxial de 9mm, conjunto montado para embutir 4" x 2" (Placa, módulo e suporte) - (ponto tomada som)	Un	36,00	13,32	479,52					36,00	479,52
1.24	Dispositivo DPS classe II, 1 polo, tensão máxima de 175V, corrente máxima de *30*ka (tipo ac) = dispositivo de proteção contra surto 175V - 40ka	un	10,00	138,75	1.387,48	22,00		3.052,46		32,00	4.439,94
1.25	Disjuntor termomagnético tripolar 150A/600V, tipo fxd / tcc - 35ka	un	10,00	439,01	4.390,08					10,00	4.390,08
1.26	Ventilador de teto	Un	8,00	254,56	2.036,44					8,00	2.036,44
1.27	Ventilador de parede	un	34,00	399,48	13.582,36					34,00	13.582,36

Proc No/Ano **1693**  
**245/18**



Obra: Término da Construção da EMEB Alvorada

Local: R. Antônio Carlos Prado - Parque dos Cocais - Valinhos - SP

Contrato: 181/2018

SIURB-EDIF-SD-JUL/2017

Prazo: 18 meses

Data Base: mar/18

Revisão: 0

Item	Descrição dos Serviços	Un	Quant.	Preço Unitário Final	Contratado	INCLUSÕES		EXCLUSÕES		Total Geral Final	
						Quant.	Total	Quant.	Total	Quant.	Total
28	Serviço: ar condicionado a frio, tipo split parede, capacidade de 9.000 btu/h	Un	4,00	2.318,50	9.274,01					4,00	9.274,01
29	Serviço: ar condicionado a frio, tipo split parede, capacidade de 18.000 btu/h	Un	2,00	2.977,32	5.954,64					2,00	5.954,64
30	Serviço: ar condicionado a frio, tipo split parede, capacidade de 21.000 btu/h	Un	3,00	3.932,92	11.798,77					3,00	11.798,77
31	Serviço: ar condicionado a frio, tipo split parede, capacidade de 24.000 btu/h	Un	2,00	4.119,77	8.239,54					2,00	8.239,54
32	Serviço: ar condicionado a frio, tipo split parede, capacidade de 30.000 btu/h	Un	1,00	4.965,51	4.965,51					1,00	4.965,51
33-1	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, Ø 30mm, c/ acessórios	m		8,00		832,05	6.654,31			832,05	6.654,31
34-1	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, Ø 50mm, c/ acessórios	m		10,29		42,00	432,16			42,00	432,16
35-1	Cabo de cobre flexível de 70mm², isolamento 0,6/1kV - Isolação HEPR 90°C	m		30,35		140,92	4.276,52			140,92	4.276,52
36-1	Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta c/ aletas duplas parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28/54W	un		127,11		31,00	3.940,53			31,00	3.940,53
37-1	Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada, c/ difusor plano em acrílico, para 4 lâmpadas fluorescentes tubulares de 14/16/18W	un		198,67		331,00	65.759,17			331,00	65.759,17
38-1	Lâmpada led tubular T8 c/ base G13, de 1600 até 1943lm - 18W	un		64,84		1.386,00	89.862,30			1.386,00	89.862,30
39-1	Luminária industrial pendente c/ refletor prismático s/ alojamento para reator, para lâmpadas vapor de sódio/metálico ou mista de 150/250/400W	un		129,92		45,00	5.846,28			45,00	5.846,28
40-1	Lâmpada de vapor de sódio elipsoidal ou tubular, base E40 de 400W	un		40,31		45,00	1.814,04			45,00	1.814,04
41-1	Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600V, corrente de 500A até 630A	un		2.774,46		1,00	2.774,46			1,00	2.774,46
42-1	Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380V, corrente de 10A até 32A	un		37,30		147,00	5.483,38			147,00	5.483,38
43-1	Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380V, corrente de 63A	un		57,44		1,00	57,44			1,00	57,44
44-1	Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 400V, corrente de 80A até 125A	un		837,63		15,00	12.564,47			15,00	12.564,47
45-1	Dispositivo Diferencial Residual de 63A x 30mA - 4 polos	un		202,08		1,00	202,08			1,00	202,08
46-1	Dispositivo Diferencial Residual de 80A x 30mA - 4 polos	un		298,59		5,00	1.492,96			5,00	1.492,96
47-1	Dispositivo Diferencial Residual de 100A x 30mA - 4 polos	un		356,87		1,00	356,87			1,00	356,87
48-1	Dispositivo Diferencial Residual de 125A x 30mA - 4 polos	un		500,18		1,00	500,18			1,00	500,18
49-1	Luminária blindada de sobrepor ou pendente em calha fechada para 2 lâmpadas fluorescentes de 32/36/40W	un		130,24		1,00	130,24			1,00	130,24
505-1	Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada, c/ difusor plano em acrílico, para 4 lâmpadas fluorescentes tubulares de 14/16/18W	un		198,67		23,00	4.569,37			23,00	4.569,37
<b>5</b>	<b>Hidráulica</b>				<b>29.414,89</b>						<b>29.414,89</b>
5.1	Revisão geral da hidráulica (linhas de água, banheiros, caixas d'água)	Vb	1,00	21.229,33	21.229,33					1,00	21.229,33
5.2	Limpeza de caixas d'água	Vb	1,00	8.185,57	8.185,57					1,00	8.185,57
<b>6</b>	<b>Revestimentos</b>				<b>532.533,86</b>		<b>10.217,82</b>				<b>-66.853,65</b>
6.1	Moldura de gesso simples, largura até 6cm	m	147,00	12,16	1.787,40					147,00	1.787,40
6.2	Blocos de vidro tipo xadrez 20 x 20 x 10cm, assentado c/ argamassa traço 1:3 (cimento e areia grossa) preparo mecânico, c/ rejuntamento em cimento branco e barras de aço	m²	28,00	421,81	11.810,75					28,00	11.810,75
6.3	Chapisco rústico traço 1:3 (cimento e areia grossa), esp. = 2cm, preparo manual da argamassa	m²	2.253,82	8,85	19.954,76					173,39	-1.555,15
6.4	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico c/ betoneira 400lts, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (s/ presença de vãos), esp. = 45mm.	m²	2.253,82	36,40	82.036,23					173,39	6.311,18
	Af_06/2014										2.080,43
											5.785,05

Obra: Término da Construção da EMEB Alvorada  
 Local: R. Antônio Carlos Prado - Parque dos Cocais - Valinhos - SP

CPOS-171-SD-NOV/2017  
 SINAPT-SD-JAN/2018  
 STURB-EDIF-SD-JUL/2017

Contrato: 181/2018  
 Prazo: 18 meses  
 Data Base: mar/18

Revisão: 0

Item	Descrição dos Serviços	Un	Quant.	Preço Unitário Final	Contratado	INCLUSÕES		EXCLUSÕES		Total Geral Final	
						Quant.	Total	Quant.	Total	Quant.	Total
5	Lona plástica preta, esp. = 150micra	m²	4.446,50	5,67	25.195,65			-3.589,95	-20.342,09	856,55	4.853,55
6	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	m²	3.560,77	8,65	30.790,56			-99,75	-862,56	3.461,02	29.928,00
7	Retirada de entulho	m³	125,00	82,43	10.303,55			-21,17	-1.744,96	103,83	8.558,59
8	Argamassa de regularização cim/areia 1:3 esp. = até 2,5cm	m²	3.560,77	30,68	109.255,68			-99,75	-3.060,66	3.461,02	106.195,02
9	Piso cerâmico esmaltado c/ textura semi-ruçosa PEI-5 resistência química A, para áreas internas, assentado c/ argamassa mista	m²	3.560,77	48,59	173.008,60			-99,75	-4.846,62	3.461,02	168.161,98
10	Rodapé cerâmica antiderrapante H= 7cm (monoqueima) uso exclusivo padrão creche	m	2.031,04	21,33	43.317,41			-1.319,90	-28.150,43	711,14	15.166,98
11	Soleira em granito L= 30cm sobre argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m	80,00	149,67	11.973,42	68,27	10.217,82			148,27	22.191,23
12	Canteleira de alumínio 1" x 1", para proteção de quina de parede	m	375,00	30,64	11.491,43					375,00	11.491,43
13	Piso podotátil de concreto - direcional e alerta 25 x 25 x 2,50cm	m²	250,00	6,43	1.608,43					250,00	1.608,43
14-1	Reboco	m²		8,99		2.080,43	18.705,20			2.080,43	18.705,20
15-1	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20 x 20cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado c/ argamassa industrializada - (Recomposição de azulejos danificados)	m²				130,00				130,00	
<b>7</b>	<b>Pintura</b>				<b>230.969,89</b>		<b>19.927,56</b>		<b>-1.588,97</b>		<b>249.308,47</b>
7.1	Aplicação manual de fundo selador acrílico em superfícies externas de sacada de edifícios de múltiplos pavimentos. Af. 06/2014	m²	2.538,00	3,47	8.813,55			-457,57	-1.588,97	2.080,43	7.224,58
7.2	Aplicação manual de pintura c/ tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	m²	10.037,69	14,76	148.118,66	1.350,45	19.927,56			11.388,14	168.046,23
7.3	Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção c/ zarcão (1 demão)	m²	131,63	39,91	5.253,45					131,63	5.253,45
7.4	Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, incluso uma demão de fundo anticorrosivo. Utilização de revólver (ar-comprimido).	m²	1.070,81	16,04	17.181,11					1.070,81	17.181,11
7.5	Verniz sintético brilhante em concreto ou tijolo, duas demãos	m²	2.532,88	16,72	42.359,25					2.532,88	42.359,25
7.6	Pintura esmalte acetinado, duas demãos, sobre superfície metálica	m²	223,69	29,41	6.579,65					223,69	6.579,65
7.7	Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, incluso uma demão de fundo anticorrosivo. Utilização de revólver (ar-comprimido). (pintura caixa d'água (cilindro)	m²	40,00	16,04	641,80					40,00	641,80
7.8	Limpeza de armadura c/ escova de aço	m²	332,12	6,09	2.022,42					332,12	2.022,42
<b>8</b>	<b>Vidro</b>				<b>2.811,30</b>		<b>22.191,59</b>				<b>25.002,89</b>
8.1	Vidro liso comum transparente, esp. = 4mm	m²	23,52	111,59	2.624,52	198,87	22.191,59			222,39	24.816,11
8.2	Vidro fantasia tipo canelado, esp. = 4mm	m²	1,80	103,77	186,78					1,80	186,78
<b>9</b>	<b>Aparelhos Sanitários e Metais</b>				<b>52.616,41</b>		<b>30.940,92</b>		<b>-4.579,07</b>		<b>78.978,26</b>
9.1	Barra de apoio reta, para pessoas c/ mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/2" x 500mm	un	10,00	167,92	1.679,16	12,00	2.015,00			22,00	3.694,16
9.2	Bacia sifonada de louça c/ abertura frontal - 6lts	un	2,00	485,39	970,78			-2,00	970,78		169,78
9.3	Assento para bacia sanitária, c/ abertura frontal, para pessoas c/ mobilidade reduzida	un	9,00	568,34	5.115,08	4,00	2.273,37			13,00	7.388,44
9.4	Assento vaso sanitário infantil em plástico branco	un	6,00	54,89	329,36					6,00	329,36
9.5	Assento sanitário de plástico, tipo convencional	un	19,00	41,81	794,38					19,00	794,38
9.6	Dispenser saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente (440313)	un	6,00	36,10	216,62	1,00	36,10			7,00	252,73
9.7	Dispenser toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente. (440318)	un	5,00	77,62	388,09			-5,00	-388,09		

Item	Descrição dos Serviços	Un	Quant.	Preço Unitário Final	Contratado	INCLUSÕES		EXCLUSÕES		Total Geral Final	
						Quant.	Total	Quant.	Total	Quant.	Total
3.8	Papeleira metálica Linha Izy, código 2020.C37, Deca ou equivalente	Un	3,00	182,19	546,57	4,00	728,76			7,00	1.275,33
3.9	Espelho cristal esp. = 4mm, c/ moldura em alumínio e compensado 6mm plastificado colado	m²	1,00	395,53	395,53	11,60	4.588,11			12,60	4.983,63
3.10	Tanque de louça branca c/ coluna, 30lts ou equivalente - fornecimento e instalação.	Un	1,00	641,89	641,89					1,00	641,89
3.11	Torneira cromada tubo móvel, de mesa, Ø 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação. Af. 12/2013	un	25,00	118,93	2.973,14			-23,00	-2.735,29	2,00	237,85
3.12	Torneira cromada Ø 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão popular - fornecimento e instalação. Af. 12/2013 (jardim)	un	3,00	34,81	104,44					3,00	104,44
3.13	Válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2" x 1.1/2" para pia - fornecimento e instalação. Af. 12/2013	un	5,00	60,82	304,08			-2,00	-121,63	3,00	182,45
3.14	Engate flexível em plástico branco, Ø 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação. Af. 12/2013	un	27,00	8,17	220,46	10,00	81,65			37,00	302,11
3.15	Sifão do tipo garrafa/copo em PVC 1.1/4" x 1.1/2" - fornecimento e instalação. Af. 12/2013	un	25,00	18,33	458,18	12,00	219,93			37,00	678,11
3.16	Torneira de mesa para pia c/ bica móvel e arejador em latão fundido cromado	un	23,00	118,93	2.735,29	10,00	1.189,26			33,00	3.924,54
3.17	Torneira de parede para pia c/ bica móvel e arejador, em latão fundido cromado	un	4,00	118,93	475,70			-2,00	-237,85	2,00	237,85
3.18	Válvula de PVC para lavatório	un	6,00	6,57	39,43	31,00	203,71			37,00	243,14
3.19	Bebedouro elétrico de pressão em aço inoxidável, capacidade de refrigeração de 100lts/h	Un	5,00	2.851,89	14.259,46	1,00	2.851,89			6,00	17.111,35
3.20	Filtro pressão cunho (aquilar) c/ elem. Filtrante carvão e cel. 360/lts/h	un	5,00	296,79	1.483,94	1,00	296,79			6,00	1.780,73
3.21	Torneira de fechamento automático de parede (bebedouros)	un	22,00	293,79	6.463,32	10,00	2.937,87			32,00	9.401,19
3.22	Torneira cromada de mesa para lavatório c/ sensor de presença (torneira para lavatório c/ sensor (PNE))	un	10,00	839,36	8.393,55	2,00	1.678,71			12,00	10.072,26
3.23	Tanque de inox 800 x 600 x 600mm (Conforme projeto) (Cozinha)	Un	1,00	3.627,97	3.627,97					1,00	3.627,97
3.24-I	Bacia sifonada de louça para pessoas c/ mobilidade reduzida - 6lts	un		485,37		3,00	1.456,10			3,00	1.456,10
3.25-I	Válvula de descarga antivandalismo, Ø 1.1/2"	un		295,12		12,00	3.541,44			12,00	3.541,44
3.26-I	Chuveiro elétrico de 6.500W/220V c/ resistência blindada	un		357,62		4,00	1.430,50			4,00	1.430,50
3.27-I	Válvula de descarga externa, tipo alavanca c/ registro próprio, Ø 1.1/4" e Ø 1.1/2" (PNE)	un		450,98		12,00	5.411,73			12,00	5.411,73
<b>0</b>	<b>Quadra Poliesportiva</b>				<b>244.739,37</b>		<b>103.780,83</b>		<b>-93.474,53</b>		<b>255.045,66</b>
0.1	Soleira em granito L= 30cm sobre argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m	2,40	149,67	359,20					2,40	359,20
0.2	Caixa em chapa de aço galvanizado nº 24, desenvolvimento de 60cm	m	74,80	70,96	5.307,65					74,80	5.307,65
0.3	Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, incluso uma demão de fundo anticorrosivo. Utilização de revólver (ar-comprimido).	m²	3.810,00	16,04	61.131,31					3.810,00	61.131,31
0.4	Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoaústica, incluso transporte vertical. Af. 12/2015	m²	501,09	26,66	13.358,87					501,09	13.358,87
0.5	Cobertura c/ telha de aço zincado, trapezoidal, esp. = 0,5mm, incluindo acessórios (fechamento lateral)	m²	501,09	37,36	18.722,14					501,09	18.722,14
0.6	Retirada de telhas ondulada de fibra-cimento/plástica ou alumínio/plana pré-fabricada (revisão e troca de telhas translúcida)	m²	70,00	5,59	391,14					70,00	391,14
0.7	Telhamento c/ telha ondulada de fibra de vidro esp. = 0,6mm, para telhado c/ inclinação maior que 10°, c/ até 2 águas, incluso içamento. Af. 06/2016 (revisão e troca de telhas translúcida)	m²	70,00	47,49	3.323,99					70,00	3.323,99
0.8	Rufo em chapa de aço galvanizado nº 24, desenvolvimento de 40cm	m	62,60	83,35	5.217,91					62,60	5.217,91
0.9	Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção c/ zarcão (1 demão)	m²	25,04	39,91	999,36					25,04	999,36

Obra: Término da Construção da EMEB Alvorada

Local: R. Antônio Carlos Prado - Parque dos Cocais - Valinhos - SP

CPOS-171-SD-NOV/2017

SINAPI-SD-JAN/2018

SIURB-EDIF-SD-JUL/2017

Contrato: 181/2018

Prazo: 18 meses

Data Base: mar/18

Revisão: 0

Item	Descrição dos Serviços	Un	Quant.	Preço Unitário Final	Contratado	INCLUSÕES		EXCLUSÕES		Total Geral Final	
						Quant.	Total	Quant.	Total	Quant.	Total
0.10	Eletrodo de aço galvanizado eletrolítico Ø 20mm (3/4"), tipo leve - fornecimento e instalação	m	97,44	28,52	2.778,88					97,44	2.778,88
0.11	16.04.002 qe-03 trave de futebol de salão (fundação direta)	un	2,00	2.116,05	4.232,09					2,00	4.232,09
0.12	350116 Tabela completa c/ suporte e rede para basquete	un	2,00	3.800,96	7.601,93					2,00	7.601,93
0.13	350117 Poste oficial completo c/ rede para voleibol	un	1,00	1.813,60	1.813,60					1,00	1.813,60
0.14	Verniz sintético brilhante em concreto ou tijolo, duas demãos	m²	77,80	18,73	1.457,24					77,80	1.457,24
0.15	Pintura para telhas de alumínio c/ tinta esmalte automotiva	m²	1.002,18	18,54	18.584,11					-1.002,18	-18.584,11
0.16	Limpeza geral de quadra poliesportiva	m²	851,00	5,20	4.428,64					851,00	4.428,64
0.17	Limpeza de armadura c/ escova de aço	m²	612,68	6,09	3.730,86					-612,68	-3.730,86
0.18	Remoção de calhas e condutores de águas pluviais	m	74,80	3,86	288,45					74,80	288,45
0.19	Revestimento em epóxi autonivelante 2mm	m²	851,00	83,62	71.159,56					-851,00	-71.159,56
0.20	Luminária Led refletor retangular bivolt, luz branca, 50W (refletor de led (troca))	un	12,00	749,16	8.989,86					12,00	8.989,86
0.21	Tubo PVC, série R, água pluvial, Ø 100mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. Af. 12/2014_p - (condutor (100mm) de descida das calhas e conexões - fornecimento e instalação)	m	50,00	25,83	1.291,66					50,00	1.291,66
0.22	Proteção de fachada com tela de nylon	m²	460,00	20,81	9.570,90					460,00	9.570,90
0.23-I	Impermeabilização em manta asfáltica c/ armadura, tipo III-B, esp. = 4mm	m²		59,10		856,55	50.622,74			856,55	50.622,74
0.24-I	Concreto usinado, fck = 25,0Mpa - para bombeamento	m³		300,03		85,66	25.698,96			85,66	25.698,96
0.25-I	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³		60,69		59,96	3.639,14			59,96	3.639,14
0.26-I	Nivelamento de piso em concreto c/ acabadora de superfície	m²		14,18		856,55	12.141,71			856,55	12.141,71
0.26-I	Aramação em tela de aço soldada nervurada Q-138, aço CA-60, 4,2mm, malha 10X10cm	kg		6,20		1.884,41	11.678,28			1.884,41	11.678,28

Obra: Término da Construção da EMEB Alvorada  
 Local: R. Antônio Carlos Prado - Parque dos Cocais - Valinhos - SP

CPOS-171-SD-NOV/2017  
 SINAPI-SD-JAN/2018  
 SIURB-EDJF-SD-JUL/2017

Contrato: 181/2018  
 Prazo: 18 meses  
 Data Base: mar/18  
 Revisão: 0

Item	Descrição dos Serviços	Un	Quant.	Preço Unitário Final	Contratado	INCLUSÕES		EXCLUSÕES		Total Geral Final	
						Quant.	Total	Quant.	Total	Quant.	Total
<b>Proteção Contra Incêndio</b>											
1	Abrigo para bomba de incêndio	Un	2,00	1.458,37	54.418,30		5.829,96			60.248,26	
2	Conjunto motor bomba (centrifuga) 5hp (31.200 lts/h -20mca)	un	1,00	5.149,43	5.149,43					2.916,74	2.916,74
3	Conjunto motor bomba (centrifuga) 2 cv multistágio, Hman= 30 a 70mca, Q= 7,9 a 4,9 m³/h	un	1,00	1.833,22	1.833,22					1,00	1.833,22
4	Instalação de conjunto motor bomba horizontal até 10Cv	un	2,00	613,52	1.227,03					2,00	1.227,03
5	Pressostato (válvula de fluxo) c/ sensor diafragma.	un	2,00	665,45	1.330,90					2,00	1.330,90
6	Válvula de retenção horizontal de bronze Ø 2.1/2"	un	2,00	275,80	551,61					2,00	551,61
7	Tubo de aço galvanizado c/ costura, classe média, Ø 65 (2.1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. Af_12/2015	m	250,00	58,22	14.554,58					250,00	14.554,58
8	08.02.016 Proteção anticorrosiva para ramais sob a terra	m	70,00	12,02	841,50					70,00	841,50
9	Abrigo para hidrante, 90 x 60 x 17cm, c/ registro globo angular 45º Ø 2.1/2", adaptador Storz Ø 2.1/2", mangueira de incêndio 20m, redução 2.1/2 x 1.1/2" e esguicho em latão Ø 1.1/2" - fornecimento e instalação	un	12,00	815,58	9.786,94					12,00	9.786,94
10	Registro de recalque no passeio (RR-01)	un	1,00	483,71	483,71					1,00	483,71
11	Central de sistema de alarme de 13 a 24 endereços	un	1,00	1.274,31	1.274,31					1,00	1.274,31
12	Boteira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro	un	13,00	149,35	1.941,59					13,00	1.941,59
13	Botão para acionamento de sirene - eletroduto de PVC	un	13,00	67,50	877,56					13,00	877,56
14	Sirene indicador sonoro e visual	un	13,00	225,02	2.925,30					13,00	2.925,30
15	Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio (sinalização dos extintores)	un	22,00	14,12	310,57					22,00	310,57
16	Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio (sinalização dos acionadores de alarmes de incêndio)	un	12,00	14,12	169,40					12,00	169,40
17	Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio (sinalização de rotas de fuga)	un	30,00	14,12	423,50					30,00	423,50
18	Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio (sinalização das saídas)	un	15,00	14,12	211,75					15,00	211,75
19	Iluminação autônoma de emergência - Led	un	42,00	121,46	5.101,47					42,00	5.101,47
20	Extintor de incêndio tp Pó Químico 4kg fornecimento e colocação	un	12,00	112,54	1.350,49					12,00	1.350,49
21	Extintor de incêndio água-pressurizada 10lts inclusive suporte parede carga completa, fornecimento e colocação	un	10,00	115,67	1.156,69					10,00	1.156,69
22-I	Luminária de emergência autônoma c/ 2 lâmpadas fluorescentes de 8W	un		121,46		48,00	5.829,96			48,00	5.829,96
23-I	Extintor de incêndio TP Pó Químico 4kg, fornecimento e colocação	un		112,54		1,00	112,54			1,00	112,54
<b>2 Serviços Complementares</b>						<b>140.145,32</b>	<b>45.721,46</b>				
2.1	Capina e limpeza manual de terreno com pequenos arbustos	m²	267,34	1,53	410,27					267,34	410,27
2.2	Transporte local c/ caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada (para distâncias superiores a 4km)	m³ x km	40,10	1,20	48,13					40,10	48,13
2.3	Espalhamento de material em bota fora, c/ utilização de trator de esteiras de 165HP	m³	40,10	0,99	39,84					40,10	39,84
2.4	Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, s/ transporte)	m³	53,47	14,68	784,81					53,47	784,81
2.5	Transporte local c/ caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada (para distâncias superiores a 4km)	m³ x km	64,16	1,20	77,00					64,16	77,00
2.6	Reaterro interno (edificações) compactado manualmente	m³	53,47	46,27	2.473,83					53,47	2.473,83


Proc. Nº 18.694.138  
 Ano 245/18  
 Página 12 de 13

Obra: Término da Construção da EMEB Alvorada  
 Local: R. Antônio Carlos Prado - Parque dos Cocais - Valinhos - SP

CPOS-171-SD-NOV/2017  
 SINAPI-SD-JAN/2018  
 SIURB-EDIF-SD-JUL/2017

Contrato: 181/2018  
 Prazo: 18 meses  
 Data Base: mar/18  
 Revisão: 0

Item	Descrição dos Serviços	Un	Quant.	Preço Unitário Final	Contratado	INCLUSÕES		EXCLUSÕES		Total Geral Final	
						Quant.	Total	Quant.	Total	Quant.	Total
7	Plantio de grama esmeralda em rolo	m²	267,34	12,11	3.237,48	32,66	395,51			300,00	3.632,99
8	Tubo de cobre classe A, Ø 22mm (3/4"), inclusive conexões	m	12,00	56,91	682,92					12,00	682,92
9	Alambrado em tubos de aço galvanizado, c/ costura, din 2440, Ø 2", H= 3,00m, fixados a cada 2,00m em blocos de concreto, c/ tela de arame galvanizado revestido com PVC, fio 12 bwg e malha 7,5 x 7,5cm	m²	76,05	194,05	14.757,85	26,75	5.190,96			102,80	19.948,81
10	Reparo de trinças rasas até 5,0mm de largura, na massa	m	14,25	30,63	436,53					14,25	436,53
11	Demolição de alvenaria estrutural de blocos vazados de concreto	m³	0,28	57,65	16,14					0,28	16,14
12	Transporte de entulho c/ caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada, DMT 0,5 a 1,0km	m³	0,34	5,86	1,99					0,34	1,99
13	Chapisco rústico traço 1:3 (cimento e areia grossa), esp. = 2cm, preparo manual da argamassa	m²	7,13	10,63	75,82					7,13	75,82
14	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico c/ betoneira 400lts, aplicada manualmente em faces internas de paredes de ambientes c/ área maior que 10m², esp. = 20mm, c/ execução de taliscas. Af. 06/2014	m²	7,13	26,70	190,36					7,13	190,36
15	Aplicação manual de pintura c/ tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	m²	128,36	17,26	2.216,11					128,36	2.216,11
16	Verniz sintético brilhante em concreto ou tijolo, duas demãos	m²	81,43	18,73	1.525,23					81,43	1.525,23
17	Limpeza final da obra	m²	4.446,50	10,09	44.879,75					4.446,50	44.879,75
18	Aplicação manual de fundo selador acrílico em superfícies externas de sacada de edifícios de múltiplos pavimentos. Af. 06/2014	m²	7,13	3,47	24,76					7,13	24,76
19	Borracha colada - piso tátil de alerta	m²	15,00	138,27	2.073,99					15,00	2.073,99
20	Reparo divisórias em placas de gesso acartonado resistencia ao fogo 30min 73/48mm - 1s/1st	m²	92,26	129,08	11.908,72					92,26	11.908,72
21	Fôro em placas de gesso, para ambientes comerciais. Af. 05/2017_p (fôro gesso (salas de aula, pátio cozinha, informática, biblioteca))	m²	1.252,73	32,07	40.175,36					1.252,73	40.175,36
22	Tempo/bancada em granito c/ esp. = 3cm (tempo de granito (prateleiras DM1 e cozinha))	m²	9,50	925,33	8.790,59					9,50	8.790,59
23	Coifa em aço inoxidável c/ filtro e exaustor axial - área até 3,00m² (coifa c/ exaustão (cozinha))	Un	1,00	5.317,82	5.317,82					1,00	5.317,82
24-1	Lousa Branca LG-08 - Padão FDE CÓD. 16.06.090	m²		491,85		81,60	40.134,99			81,60	40.134,99
25-1	Vergas, contravergas e pilares de concreto armado	m³		1.052,21		4,22	4.442,41			4,22	4.442,41
<b>Valor Inicial do Contrato =</b>						<b>1.923.908,22</b>	<b>669.138,63</b>	<b>-414.697,59</b>	<b>2.178.349,25</b>	<b>13,23%</b>	<b>254.441,03</b>
							<b>34,78%</b>	<b>-21,55%</b>	<b>Valor do Aditivo</b>		

  
 Engº Fernando Silva de Bales  
 Departamento de Obras Públicas - DOP  
 Diretor



**TERMO ADITIVO Nº 01**  
**TERMO DE CONTRATO Nº 181/2018**  
(Aditamento Contratual)

Pelo presente **TERMO ADITIVO** que entre si celebram, de um lado, a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS**, com sede na Rua Antonio Carlos, n.º 301, Centro, Valinhos, SP, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, **ORESTES PREVILATE JÚNIOR**, devidamente assistido pelo Secretário de Licitações, **MARKSON ELIANAI VIEIRA**, pelo Secretário de Educação, **ZENO RUEDELL**, pelo Secretário de Obras e Serviços Públicos, **Engº Civil GERSON LUIS SEGATO**, e pelo Diretor do Departamento de Obras Públicas, **FERNANDO SILVA DE BARROS** e pelo Fiscal **Engº MÁRIO LUIS FERNANDES**, de ora em diante denominada pura e simplesmente **PREFEITURA** e, de outro lado, a empresa **LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.**, com sede na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, n.º 1748, 11º andar, sala 1105 e 1108, Cidade Monções, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP.: 04571-000, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 04.002.395/0001-12, neste ato representada pelo procurador, **RONALDO ALVES PEREIRA**, residente e domiciliado na cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, de ora em diante denominada pura e simplesmente **CONTRATADA**, têm entre si certo e avençado, em conformidade com os elementos e despachos constantes do **PROCESSO DE COMPRAS Nº 245/2018 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01A/2018 ADITAR O TERMO DE CONTRATO nº 181/2018**, que passa a vigor com a seguinte redação:

**DO VALOR:**

**Cláusula 14ª.** O valor total da obra passa a ser de **R\$ 2.178.349,25 (dois milhões cento e setenta e oito mil trezentos e quarenta e nove reais e vinte e cinco centavos)** devido ao pedido de aditamento no percentual de 13,23% correspondente à importância de R\$ 254.441,03 (duzentos e cinquenta e quatro mil quatrocentos e quarenta e um reais e três centavos).

**DA GARANTIA:**

**Cláusula 36ª.** Para garantir o cumprimento das obrigações contratuais, a **CONTRATADA** deverá depositar junto à Secretaria da Fazenda da **PREFEITURA**, na data da assinatura do presente Termo de Contrato, a importância de **R\$ 12.722,05 (doze mil setecentos e vinte e dois reais e cinco centavos)**, equivalente a **5% (cinco por cento) do valor total do aditamento** nas modalidades previstas no artigo 56, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores atualizações, a qual fará parte integrante deste contrato.

Neste ato ficam **RATIFICADAS** todas as demais cláusulas e parágrafos da Carta Contrato nº 181/2018, inalterados pelo presente Termo Aditivo.



**PREFEITURA DE  
VALINHOS**

Fis N° 196 3 Rubrica 2

Proc. N° / Ano

**TERMO ADITIVO Nº 01  
TERMO DE CONTRATO Nº 181/2018  
(Aditamento Contratual)**

E, por estarem assim, certas e avençadas, assinam as partes, já qualificadas no preâmbulo do presente **TERMO ADITIVO**, digitado em 02 (duas) laudas e firmado em 03 (três) vias, ficando a primeira e segunda vias em poder da Secretaria de Licitações, Compras e Suprimentos da **PREFEITURA** e a terceira via, entregue à **CONTRATADA**.

Valinhos/SP, 03 de setembro de 2019

Pela **PREFEITURA**:

  
**ORESTES PREVITALE JÚNIOR**  
Prefeito Municipal

  
**MARKSON ELIANAI VIEIRA**  
Secretário de Licitações

  
**Engº Civil GERSON LUIS SEGATO**  
Secretário de Obras e Serviços Públicos

  
**ZENO RUEDELL**  
Secretário de Educação

  
**FERNANDO SILVA DE BARROS**  
Diretor do Departamento de Obras Públicas

  
**Engº MÁRIO LUIS FERNANDES**  
Fiscal de Obras

Pela **CONTRATADA**:

  
**LEMAM CONST. E COMÉRCIO S.A.**  
RONALDO ALVES PEREIRA





# PREFEITURA DE VALINHOS

Fls N° 1964 Rubrica 9

Proc. N° / Ano

## TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

**CONTRATANTE:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS – SP.

**CONTRATADA:** LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A., inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.002.395/0001-12.

**TERMO CONTRATO Nº 181/2018**

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada de engenharia, para execução do término da construção da EMEB ALVORADA localizada na Rua Antônio Carlos Prado, Parque dos Cocais, na cidade de Valinhos, Estado de São Paulo, na qual engloba o fornecimento de material, mão-de-obra e ferramental necessário para a execução do objeto, conforme as especificações constantes neste anexo.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

**1. Estamos CIENTES de que:**

- a) O ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

**2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:**

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Valinhos, 03 de setembro de 2019

**GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:**

Nome: **GERSON LUIS SEGATO**

Cargo: Secretário de Obras e Serviços Públicos

CPF: 120.609.628-46 e RG: 9.297.434-X

Data de Nascimento: 20.06.1964

Endereço residencial completo: Rua Modesta Poli Martins, nº 51, Vila Norma, Valinhos/SP

E-mail institucional: [gsegato@yahoo.com.br](mailto:gsegato@yahoo.com.br)

E-mail pessoal: [gsegato@valinhos.sp.gov.br](mailto:gsegato@valinhos.sp.gov.br)

Telefone: (19) 38278007

Assinatura: \_\_\_\_\_

Nome: **ZENO RUEDELL**

Cargo: Secretário da Educação

CPF: 337.872.208-87 e RG: 4.322.282

Data de Nascimento: 31/08/1942

Endereço residencial completo: Rua Paulo Setubal, nº 576, Nova Valinhos, Valinhos/SP

E-mail pessoal: [zeno.ruedell42@gmail.com](mailto:zeno.ruedell42@gmail.com)

E-mail institucional: [zruedell@valinhos.sp.gov.br](mailto:zruedell@valinhos.sp.gov.br)

Telefone: (19) 38712507

Assinatura: \_\_\_\_\_

Nome: **FERNANDO SILVA DE BARROS**

Cargo: Diretor de Departamento de Obras Públicas

CPF: 331.174.386-53 e RG: 52564-D

Data de Nascimento: 24/02/1959

Endereço residencial completo: Marechal Deodoro da Fonseca, 191 – Valinhos / SP

E-mail pessoal: [fsbarros@valinhos.sp.gov.br](mailto:fsbarros@valinhos.sp.gov.br)

E-mail institucional: [fsbarros@valinhos.sp.gov.br](mailto:fsbarros@valinhos.sp.gov.br)

Telefone: (19) 38296014

Assinatura: \_\_\_\_\_



# PREFEITURA DE VALINHOS

Fis N° 1965 Rubrica 9

Proc. N° / Ano

Nome: **MÁRIO LUIS FERNANDES**

Cargo: Engenheiro

CPF: 005.637.848-30 e RG: 6.661.643-8

Data de Nascimento: 08/04/1954

Endereço residencial completo: Rua João Alencar, nº 183, Jardim Santa Helena, Valinhos/SP

E-mail pessoal: [mfernandes@valinhos.sp.gov.br](mailto:mfernandes@valinhos.sp.gov.br)

E-mail institucional: [mfernandes@valinhos.sp.gov.br](mailto:mfernandes@valinhos.sp.gov.br)

Telefone: (19) 99278-2417

Assinatura: 

## **Responsáveis que assinaram o ajuste:**

### **Pelo CONTRATANTE:**

Nome: **ORESTES PREVITALE JUNIOR**

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 079.675.168-42 e RG: 15.854.987-9

Data de Nascimento: 03/04/1967

Endereço residencial completo: Rua Paiquerê, nº 165, casa 07, Monte Carlos – Valinhos/SP

E-mail institucional: [gabinete.prefeito@valinhos.sp.gov.br](mailto:gabinete.prefeito@valinhos.sp.gov.br)

E-mail pessoal: [gabinete.prefeito@valinhos.sp.gov.br](mailto:gabinete.prefeito@valinhos.sp.gov.br)

Telefone: (19) 3849-8072

Assinatura: 

Nome: **MARKSON ELIANAI VIEIRA**

Cargo: Secretário de Licitações

CPF: 205.361.378-54 e RG: 23532735-9

Data de Nascimento: 14/12/1974

Endereço residencial: Rua Vítório Colombo Rossi, 238, Valinhos/SP

E-mail institucional: [marcksonvieira@gmail.com](mailto:marcksonvieira@gmail.com)

E-mail pessoal: [marcksonvieira@gmail.com](mailto:marcksonvieira@gmail.com)

Telefone: (19) 3327-8456

Assinatura: 

Nome: **GERSON LUIS SEGATO**

Cargo: Secretário de Obras e Serviços Públicos

CPF: 120.609.628-46 e RG: 9.297.434-X

Data de Nascimento: 20.06.1964

Endereço residencial completo: Rua Modesta Poli Martins, nº 51, Vila Norma, Valinhos/SP

E-mail institucional: [gsegato@yahoo.com.br](mailto:gsegato@yahoo.com.br)

E-mail pessoal: [gsegato@valinhos.sp.gov.br](mailto:gsegato@valinhos.sp.gov.br)

Telefone: (19) 38278007

Assinatura: 

Nome: **ZENO RUEDELL**

Cargo: Secretário da Educação

CPF: 337.872.208-87 e RG: 4.322.282

Data de Nascimento: 31/08/1942

Endereço residencial completo: Rua Paulo Setubal, nº 576, Nova Valinhos, Valinhos/SP

E-mail pessoal: [zeno.ruedell42@gmail.com](mailto:zeno.ruedell42@gmail.com)

E-mail institucional: [zruedel@valinhos.sp.gov.br](mailto:zruedel@valinhos.sp.gov.br)

Telefone(s): (19) 38712507

Assinatura: 

Nome: **FERNANDO SILVA DE BARROS**

Cargo: Diretor de Departamento de Obras Públicas

CPF: 331.174.386-53 e RG: 52564-D

Data de Nascimento: 24/02/1959

Endereço residencial completo: Marechal Deodoro da Fonseca, 191 – Valinhos / SP

E-mail pessoal: [fsbarros@valinhos.sp.gov.br](mailto:fsbarros@valinhos.sp.gov.br)

E-mail institucional: [fsbarros@valinhos.sp.gov.br](mailto:fsbarros@valinhos.sp.gov.br)

Telefone: (19) 38296014

Assinatura: 



# PREFEITURA DE VALINHOS

Fis N° 1966 Rubrica *e*

Proc. N° / Ano

Nome: **MÁRIO LUIS FERNANDES**

Cargo: Engenheiro

CPF: 005.637.848-30 e RG: 6.661.643-8

Data de Nascimento: 08/04/1954

Endereço residencial completo: Rua João Alencar, nº 183, Jardim Santa Helena, Valinhos/SP

E-mail pessoal: [mfernandes@valinhos.sp.gov.br](mailto:mfernandes@valinhos.sp.gov.br)

E-mail institucional: [mfernandes@valinhos.sp.gov.br](mailto:mfernandes@valinhos.sp.gov.br)

Telefone: (19) 99278-2417

Assinatura: 

**Pela CONTRATADA:**

Nome: **RONALDO ALVES PEREIRA**



Cargo: Procurador

CPF: 127.818.958-06 e RG: 20.616.227

Data de Nascimento: não informado

Endereço residencial completo: Rua Antonio Gomes, 315 – Guarulhos SP

Assinatura: 



Objeto: Contratação de no mínimo 10 (dez) e no máximo 90 (noventa) Recurdandos através da Fundação Professor Dr. Manoel Pedro Pimentel – FUNAP para prestação de serviços gerais à Prefeitura Municipal de Valinhos.

Fonte de Recurso: Verba própria  
Vigência: Prorrogado por 12 meses  
Valor: R\$ 1.133.168,40  
Data da Assinatura: 27/08/2019

Termo de Aditivo nº: 01  
Termo de Contrato nº: 124/2018  
Processo Compras nº: 248/2018  
Modalidade de Licitação: PP 114/2018  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Contratada: RICARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROHWEDDER-ME, com sede na Rua Monteiro de Barros, nº 390, na cidade de Vinhedo, Estado de São Paulo, CEP nº 13.280-081, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.884.574/0001-93

Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de marmiteix, para consumo de pacientes assistidos de forma intensiva e semi-intensiva pelo Centro de Atenção Psicossocial da Prefeitura do Município de Valinhos/SP.

Fonte de Recurso: Verba Própria  
Vigência: Prorrogado por 30 dias  
Valor: 17.200,00  
Data da Assinatura: 02/09/2019

Termo de Aditivo nº: 01  
Termo de Contrato nº: 181/2018  
Processo Compras nº: 245/2018  
Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01A/2018  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Contratada: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO S.A., com sede na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 1748, 11º andar, sala 1105 e 1108, Cidade Monções, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04571-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.002.395/0001-1

Objeto: Contratação de empresa especializada de engenharia, para execução do término da construção da EMBE ALVORADA localizada na Rua Antônio Carlos Prado, Parque dos Cocais, na cidade de Valinhos, Estado de São Paulo, na qual engloba o fornecimento de material, mão-de-obra e ferramental necessário para a execução do objeto, conforme as especificações constantes neste anexo

Fonte de Recurso: Própria  
Vigência: Sem alteração  
Valor: R\$ 254.441,03  
Data da Assinatura: 03/09/2019

Termo de Aditivo nº: 02  
Termo de Contrato nº: 033/2016  
Processo Compras nº: 141/2016  
Modalidade de Licitação: PP 057/2016  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Contratada: KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP, com sede à Rua Dr. Ignácio Proença de Gouvêa, nº 1.078, São Paulo, SP, CEP 02.534-010, inscrita no CNPJ/MF sob nº 61.304.069/0001-01, neste ato representada por CONCEIÇÃO DE SOUZA DOS SANTOS, portadora da Cédula de Identidade RG nº 11.039.272 SSP-SP e do CPF nº 995.074.478-49

Objeto: Contratação de empresa especializada para a locação de equipamentos digitalizadores de imagens radiográficas para utilização no setor de raios-X e mamografia do CEV - Centro de Especialidades de Valinhos e na Unidade de Pronto Atendimento - UPA - Prefeito José Spadaccia, ambos na cidade de Valinhos, São Paulo, em conformidade com o estabelecido no Anexo 01 - Características do Objeto.

Fonte de Recurso: Verba Própria  
Vigência: Prorrogado por 10 meses  
Valor: R\$ 240.000,00  
Data da Assinatura: 13/08/2019

MARKSON ELIANAI VIEIRA  
Secretário de Licitações

### RESUMO DE EDITAL

108/2019 PROCESSO DE COMPRAS Nº 330/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº

OBJETO: Exames de eletrocardiograma e eletrocardiógrafos  
DATA/HORA DA SESSÃO PÚBLICA: 19/09/19 às 14h00.

048/2019 PROCESSO DE COMPRAS Nº 124/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº

OBJETO: Fornecimento e instalação de rufos e calhas  
DATA/HORA DA SESSÃO PÚBLICA: 20/09/19 às 09h00.

101/2019 PROCESSO DE COMPRAS Nº 306/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº

OBJETO: Locação de sonorização e iluminação  
DATA/HORA DA SESSÃO PÚBLICA: 20/09/19 às 14h00.

05A/2019 PROCESSO DE COMPRAS Nº 293/2019 – TOMADA DE PREÇO Nº

OBJETO: Contratação de empresa especializada de engenharia, para a construção de ciclovias e faixas elevadas no seguinte local: Rodovia Municipal dos Andradas (divisa com a cidade de Vinhedo até 2.500 metros no sentido do Centro de Valinhos/SP, no qual engloba mão-de-obra, ferramental, equipamento(s) e fornecimento de materiais necessários a execução do objeto. "Obra de Convênio com DETRAN-SP (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE SÃO PAULO). TERMO DE CONVÊNIO Nº 104/2018

DATA/HORA DA ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 09h00 do dia

26/09/19 DATA/HORA DA SESSÃO PÚBLICA: 26/09/19 às 09h30

PRAZO DE CADASTRO: até às 16h00 do dia 23/09/19

VISITA TÉCNICA FACULTATIVA: do dia 09/09/19 até às 16h00 do dia

25/09/19, mediante agendamento junto à Secretaria de Obras e Serviços Públicos.

PROCESSO DE COMPRAS Nº 294/2019 – TOMADA DE PREÇO Nº

06A/2019 OBJETO: Contratação de empresa especializada de engenharia, para a execução de serviços de sinalização viária de ciclovia e faixa elevada no seguinte local: Rodovia Municipal dos Andradas (divisa com a cidade de Vinhedo até 2.500 me-

tros no sentido do Centro de Valinhos/SP, no qual engloba mão-de-obra, ferramental, equipamento(s) e fornecimento de materiais necessários a execução do objeto. Recurso para execução do objeto proveniente de Convênio com DETRAN-SP (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE SÃO PAULO). TERMO DE CONVÊNIO Nº 104/2018.

DATA/HORA DA ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 09h00 do dia

27/09/19 DATA/HORA DA SESSÃO PÚBLICA: 27/09/19 às 09h30

PRAZO DE CADASTRO: até às 16h00 do dia 24/09/19

VISITA TÉCNICA FACULTATIVA: do dia 09/09/19 até às 16h00 do dia 26/09/19, mediante agendamento junto à Secretaria de Mobilidade Urbana, com diretor do Departamento de Projetos, Engº José Eduardo Figueiredo, através do telefone, 38-715857, endereço Fernando Leite Ferraz, nº 705, Parque Terra Nova.

Os Editais poderão ser consultados gratuitamente no site www.valinhos.sp.gov.br. Informações: 19 3871-1213

Markson Elianai Vieira  
Secretário de Licitações

### TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Em conformidade com os elementos constantes do Processo de Compras nº 352/2019 reconhecemos a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, com base no artigo 25, caput, da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas pelas Leis Federais nº 8.883/94 e 9.648/98, visando a contratação do CONSORCIO BUS +, inscrito no CNPJ sob nº 20.336.241/0001-13, com sede na Rua Sud Menucci, nº 789, Jardim Aurélio, na Cidade de Campinas/SP, para o fornecimento de vale transporte na forma de bilhete eletrônico, no valor total de R\$279.997,00 (duzentos e setenta e nove mil, novecentos e noventa e sete reais), a serem utilizados pelos servidores municipais no deslocamento de residência-trabalho e vice-versa, com vigência da data de assinatura do contrato até 31/01/2020, no qual compreende:

Viagem	Nº de passes	Valor unitário	Valor Total
Campinas-Americana	1.500	RS 11,55	RS 17.325,00
Campinas-Hortolândia	2.500	RS 4,90	RS 12.250,00
Campinas-Indaiatuba	1.000	RS 6,25	RS 6.250,00
Campinas-Jaguariúna	1.200	RS 7,05	RS 8.460,00
Campinas-Monte Mor	1.200	RS 5,05	RS 6.060,00
Campinas-Paulínia	1.440	RS 4,95	RS 7.128,00
Campinas-Sumaré	1.080	RS 5,05	RS 5.454,00
Campinas-Valinhos	43.500	RS 4,90	RS 213.150,00
Valinhos -Vinhedo	800	RS 4,90	RS 3.920,00
<b>TOTAL</b>			<b>RS 279.997,00</b>

Valinhos, 06 de Setembro de 2019.

MARKSON ELIANAI VIEIRA  
Secretário de Licitações

WILTON LUIZ BORGES  
Secretário de Assuntos Internos

TATIANE DA SILVA OLIVEIRA  
Diretora do Departamento de Gestão de Pessoas

EDMILSON VANDERLEI BARBARINI  
Diretor de Divisão de Benefícios

Em conformidade com os elementos constantes do Processo de Compras nº 352/2019, em especial o reconhecimento da INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, RATIFICO o ato, nos termos acima descritos.

Valinhos, 06 de setembro de 2019.

ORESTES PREVITALE JUNIOR  
Prefeito Municipal

### COMUNICADOS

PROCESSO DE COMPRAS Nº 240/2019  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 87/2019 – O Pregoeiro, no uso de suas atribuições legais, COMUNICA que decidiu CLASSIFICAR as empresas conforme segue:  
- MBR COMERCIO DE MATERIAIS LTDA ME, CNPJ nº 20.204.978/0001-82, primeira classificada para o Item 8 - 1 unid. peitoral duplo, com valor total de R\$ 2.469,00; Item 9 - 1 unid. puxador de costas duplo, com valor total de R\$ 2.469,00, Item 18 - 4 unid. gangorra em nível, com valor unitário de R\$ 1.617,00 e com valor total de R\$ 6.468,00; Item 20 - 4 unid. placa orientativa, com valor unitário de R\$ 1.478,00 e com valor total de R\$ 5.912,00;

- R & D COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI, CNPJ nº 29.809.661/0001-44, primeira classificada para o Item 1 - 1 pç espaldar - ar livre, com valor total de R\$ 1.318,10; Item 7 - 1 unid. giro (rotação) diagonal duplo, com valor total de R\$ 1.226,00; Item 10 - 1 unid. abdominal simples, com valor total de R\$ 1.194,00; Item 11 - 1 unid. multi-exercitador 6x1, com valor total de R\$ 3.871,00;

- PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA, CNPJ nº 08.374.053/0001-84, primeira classificada para o Item 4 - 1 unid. simulador de cavaleiro duplo, com valor total de R\$ 2.032,00; Item 5 - 1 unid. esqui duplo, com valor total de R\$ 820,00; Item 12 - 1 unid. Alongador Triplo, com valor total de R\$ 1.426,00; Item 13 - 2 unid. escada em argolas transpassadas, com valor unitário de R\$ 2.659,00 e com valor total de R\$ 5.318,00; Item 14 - 2 unid. escada torcida, com valor unitário de R\$ 1.560,00 e com valor total de R\$ 3.120,00; Item 15 - 2 unid. multi-brinquedos 5x1, com valor unitário de R\$ 6.832,00 e com valor total de R\$ 13.664,00; Item 16 - 2 unid. carrossel, com valor unitário de R\$ 1.656,00 e com valor total de R\$ 3.312,00; Item 17 - 3 unid. balanço dois lugares, com valor unitário de R\$ 1.692,00 e com valor total de R\$ 5.076,00; Item 19 - 2 unid. escorregador, com valor unitário de R\$ 1.209,00 e com valor total de R\$ 2.418,00;

- MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICO EIRELI, CNPJ nº 10.555.495/0001-79, primeira classificada para o Item 2 - 1 unid. simulador de caminhada duplo, com valor total de R\$ 1.883,00; Item 3 - 1 unid. pressão de pernas duplo, com valor total de R\$ 1.230,00.



# PREFEITURA DE VALINHOS

CI nº 02/ 2020 – DOP / SOSP / 2020.

Valinhos, 08 de janeiro de 2020.

**Para:** Secretaria de Licitações – S.L.

**De:** Secretaria de Obras e Serviços Públicos / Departamento de Obras Públicas


**Assunto:** Aditivo Contratual.

Estamos encaminhando em anexo a seguinte documentação para o segundo **Termo Aditivo** referente ao **contrato 181/2019 da EMEB Alvorada**:


- Planilha Orçamentária.
- Memória de cálculo.
- Relatório Fotográfico.
- Justificativas para o Aditivo II do Contrato Nº. 181/2018.

Atenciosamente,

  
**Jose Eduardo Figueiredo**  
Departamento de Obras Públicas  
Diretor

  
**Eng.º Gerson Luis Segato**  
Secretaria de Obras e Serviços Públicos  
Secretário

AO  
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ADITIVOS  
Para   
S.L., em 14/01/2020

  
**Markson Elianai Vieira**  
Secretaria de Licitações  
Secretário



# PREFEITURA DE VALINHOS

## JUSTIFICATIVAS PARA O ADITIVO II DO CONTRATO No. 181/2018

ÍTEM 1.16 – Solicitação da Secretaria da Educação para isolar a quadra de esportes;  
ÍTEM 1.17, ÍTEM 1.18, ÍTEM 1.19 e ÍTEM 10.20 – Criação de vagas para estacionamento de veículos escolares e de PNE - Portadores de Necessidades Especiais;  
ÍTEM 2.30, ÍTEM 2.31, ÍTEM 2.32 e ÍTEM 2.33 – Adequação do muro de arrimo;  
ÍTEM 3.26, ÍTEM 3.27, ÍTEM 3.28, ÍTEM 3.29, ÍTEM 3.30 e ÍTEM 4.6 – Adequação da mureta de contenção do talude interno da escola;  
ÍTEM 7.21 – Adequação de projeto;  
ÍTEM 11.11 e ÍTEM 11.12 – Adequação de projeto a pedido da Secretaria da Educação  
ÍTEM 14.51, ÍTEM 14.52, ÍTEM 14.53, ÍTEM 14.54, ÍTEM 14.55 e ÍTEM 14.56 – Acréscimo de ventiladores e ar condicionado a pedido da Secretaria de Educação;  
ÍTEM 16.15 – Revestimento de paredes a pedido da Secretaria da Educação e áreas de bebedouros;  
ÍTEM 16.16 e ÍTEM 16.17 – Acabamento com reboco dos muros;  
ÍTEM 18.3 – Acréscimo na quantidade de vidros a serem instalados devido ao acréscimo de esquadrias de ferro;  
ÍTEM 19.28 – Adequação de projeto;  
ÍTEM 20.28, ÍTEM 20.29 e ÍTEM 20.30 – Adequação de projeto;  
ÍTEM 21.24, ÍTEM 21.25, ÍTEM 21.26, ÍTEM 21.27, ÍTEM 21.28, ÍTEM 21.29 e ÍTEM 21.30 – Adequação do projeto de combate a incêndio em função da nova legislação;  
ÍTEM 22.26 – Aumento das dimensões da coifa da cozinha por solicitação da Secretaria da Educação (acréscimo de 1 fogão industrial);  
ÍTEM 22.27 e ÍTEM 22.28 – Adequação de projeto;  
ÍTEM 22.28 – Acréscimo área de plantio de grama no entorno da escola.

. Novo valor do contrato = R\$ 2.345.866,38  
. Valor do Aditivo = R\$ 167.517,13

\_\_\_\_\_  
José Eduardo Figueiredo  
**Departamento de Obras Públicas**  
Públicas

Diretor

\_\_\_\_\_  
Engo. Mario Luís Fernandes  
**Departamento de Obras**

Fiscal da Obra

614-18



Obra: Término da Construção de EMBE Alvorada  
Local: R. Antônio Carlos Prado - Parque dos Cocais - Várzea - SJP

BDI  
25,00%  
21,30%

Contrato: 181/2018  
Prazo: 18 meses  
Data Base: m/18  
Revisão: 0

COOS: 171-SD-NOV/2017  
SINAPI: SD-JAN/2018  
SIURB-EDIF: SD-JUL/2017

Base	Código	Item	Descrição dos Serviços	Un	Quant	Preço de Referência	Preço Unitário Fictício	Conteúdo	CASO	INCLUIÇÕES		EXCLUSÕES		Total (em Real)	
										Quant	Total	Quant	Total	Quant	Total
COOS	02.08.020	1.1	Serviços Preliminares	m²	12,00	335,68	398,73	3.962,70	M	0,00	0,00	12,00	3.962,70	143.785,48	
COOS	02.05.210	1.2	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	4446,50	0,00	4,21	18.721,77	M	0,00	0,00	4446,50	18.721,77	4.446,50	
COOS	04.09.160	1.3	Projeto executivo de proteção contra incêndio	m²	6364,00	14,56	9,35	78.156,81	M	0,00	0,00	6364,00	8.364,00	78.156,81	
COOS	04.09.160	1.4	Localização metralha de arame metálico tipo fechadinho, inclusive montagem	m²	5,00	3,09	3,04	15,20	M	0,00	0,00	5,00	15,20	15,20	
SINAPI	74244/1	1.5	Retirada de encaixe metálico em geral	m²	7,70	107,43	108,72	837,18	E	0,00	0,00	7,70	837,18	837,18	
SINAPI	74238/2	1.6	Alambrado para queda polidispersiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, C/ costura, sin 2440, Ø 2", C/ tela de arame galvanizado, fio 14 Bwy e malha quadrada 3x3cm - resistência/cobertura	m²	1,80	1.067,02	1.049,68	1.889,43	M	0,00	0,00	1,80	1.889,43	1.889,43	
COOS	33.11.020	1.7	Rebordo em tela arame galvanizado nº 12 malha 2" e moldura em tubos de aço C/ duas folhas de abrir, incluído ferragens	m²	3,60	28,29	28,81	103,73	M	0,00	0,00	3,60	103,73	103,73	
COOS	55.01.140	1.8	Pinura estriada fresco, duas faces, sobre superfície metálica, incluído uma demão de fundo anticoncreto, utilização de rebover (recompensado)	m²	4446,50	4,85	4,77	21.215,09	M	0,00	0,00	4446,50	21.215,09	4.446,50	
COOS	54.06.040	1.9	Limpeza inicial de superfície de paredes e pisos existentes C/ hidrojetamento (Obra toda)	m²	25,00	37,41	36,80	920,05	M	0,00	0,00	25,00	920,05	920,05	
COOS	54.06.100	1.10	Guia pré-moldada reta tipo PMSF 100 - (Cx=25H=9) (ra ra 3 em cima)	m	0,60	216,72	213,54	188,12	M	0,00	0,00	0,60	188,12	188,12	
COOS	03.01.020	1.11	Base em concreto C/ fca de 20Mpa, para guias, sarjetas ou sarjetões	m²	2,03	161,15	158,53	321,82	M	0,00	0,00	2,03	321,82	321,82	
COOS	06.07.050	1.12	Demolição de concreto simples	m³	2,43	85,72	84,33	204,91	M	0,00	0,00	2,43	204,91	204,91	
COOS	54.06.020	1.13-1	Remoção de entume de obra C/ cactema metálica - material volumoso medido por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	m	23,60	38,07	38,43	907,02	I	0,00	0,00	23,60	907,02	907,02	
COOS	01.21.010	1.13-1	Guia pré-moldada curva tipo PMSF 100 - (Cx=25H=9) (ra ra 3 em cima)	bx	1,00	803,42	790,32	790,32	I	0,00	0,00	1,00	790,32	790,32	
COOS	01.21.110	1.13-1	Taxa demolição e desmontagem de equipamentos para execução de sondagem	bx	30,00	90,92	89,44	2.683,14	I	0,00	0,00	30,00	2.683,14	2.683,14	
SINAPI	74238/2	1.13-1	Sondagem de terreno à percussão (mínimo de 30m) + ponto em tela arame galvanizado nº 12 malha 2" e moldura em tubos de aço C/ duas folhas de abrir, incluído ferragens	m²	0,00	1.049,68	1.049,68	0,00	II	9,56	10.034,95	0,00	0,00	10.034,95	
COOS	54.06.040	1.13-1	Guia pré-moldada reta tipo PMSF 100 - (Cx=25H=9) (ra ra 3 em cima)	m	0,00	37,41	36,80	0,00	II	82,00	3.017,17	0,00	0,00	3.017,17	
COOS	03.01.020	1.13-II	Demolição de concreto simples	m³	0,00	161,15	158,53	0,00	II	2,25	356,70	0,00	0,00	356,70	
COOS	05.07.050	1.13-II	Rebordo de anelinho de obra C/ cactema metálica - material volumoso medido por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	m³	0,00	84,33	84,33	0,00	II	3,13	263,94	0,00	0,00	263,94	
<b>Muro de Artilho Frontal</b>										<b>26.747,05</b>		<b>0,00</b>		<b>78.216,59</b>	
COOS	07.02.020	2.1	Escavação mecânica para acerto de taludes, em material de 1ª categoria, C/ escavadeira hidráulica	m³	30,00	6,29	6,19	185,63	E	0,00	0,00	30,00	185,63	185,63	
SIURB-EDIF	10305	2.2	Argila, argila vermelha ou argila arenosa (returada na jazida, C/ transporte)	m³	0,00	14,92	14,68	0,00	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SIURB-EDIF	10310	2.3	Transporte local C/ caminhão basculante 6m³ - rodovia pavimentada (para distâncias superiores a 4km)	m³ x km	120,00	1,22	1,20	144,02	E	0,00	0,00	120,00	144,02	144,02	
SINAPI	96995	2.4	Rebordo interno (edificações) compactado manualmente	m²	0,00	47,03	46,27	0,00	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SINAPI	93358	2.5	Elevação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5m excluindo esgotamento / escoamento	m²	12,98	77,57	76,31	990,50	I	0,00	0,00	12,98	990,50	990,50	
DER	24.21.02	2.6	Estaca a tirado (broca) Ø 25cm C/concreto (Cx=15H=4 + 20kg aço/cm moldado "in loco"	m	0,00	58,21	92,70	0,00	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SIURB-EDIF	20304	2.7	Forma tabua B/ concreto em fundação C/ reaproveitamento	m²	272,76	63,70	62,66	17.092,47	I	0,00	0,00	272,76	17.092,47	17.092,47	
COOS	11.18.040	2.8	Lastro de brida	m³	6,17	109,06	107,29	661,97	I	0,00	0,00	6,17	661,97	661,97	
SINAPI	92888	2.9	Armadão de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-60 Ø 5,0mm - montagem. AF: 12/2015	kg	0,00	10,58	10,41	0,00	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SINAPI	92919	2.10	Armadão de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-50 Ø 10,0mm - montagem. AF: 12/2015	kg	0,00	6,60	6,49	0,00	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SINAPI	92921	2.11	Armadão de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-50 Ø 12,5mm - montagem. AF: 12/2015	kg	0,00	5,74	5,65	0,00	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SINAPI	92922	2.12	Formas manuseáveis para paredes de concreto moldadas "in loco" de edificações de pavimento único, em panos de betão de 4,0m. AF: 06/2015	m²	0,00	11,27	11,09	0,00	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SINAPI	92759	2.13	Armadão de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-50 Ø 5,0mm - montagem. AF: 12/2015	kg	260,64	9,34	9,19	2.394,82	I	0,00	0,00	260,64	2.394,82	2.394,82	
SINAPI	92763	2.14	Armadão de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-50 Ø 12,5mm - montagem. AF: 12/2015	kg	925,68	5,36	5,27	4.881,02	I	0,00	0,00	925,68	4.881,02	4.881,02	
SINAPI	92764	2.15	Armadão de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-50 Ø 10,0mm - montagem. AF: 12/2015	kg	1011,49	4,93	4,85	4.905,61	I	0,00	0,00	1.011,49	4.905,61	4.905,61	
SINAPI	92722	2.16	Concreção de pilares, (Cx=25H=9), C/ uso de bomba em edificação C/ seção média de pilares menor ou igual a 0,25m³ - lançamento, acabamento e acabamento. AF: 12/2015	m³	0,00	316,74	311,59	0,00	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SINAPI	81518	2.17	Alvenaria embasamento esp = 20cm bloco concreto	m³	0,00	335,30	329,85	0,00	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Obra: Término da Construção da EMEB Alvorada  
 Local: R. Antônio Carlos Prado - Parque dos Coccos - Valinhos - SP

BDI  
 25,00%  
 21,30%  
 Contrato: 181/2018  
 Prazo: 18 meses  
 Data Base: mar/18  
 Revisão: 0

Base	Código	Item	Descrição dos Serviços	Un	Quant.	Preço de Referência	Preço Unitário Final	Contratado	INCLUIÇÕES		EXCLUSÕES		Total Geral Final	
									Quant.	Total	Quant.	Total	Quant.	Total
SURB-EDIF	11-03-03	2.18	Chapisco (traço 1:3 (cimento e areia grossa), esp. = 2cm, preparo manual de argamassa	m²	0,00	10,81	10,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SINAPI	87529	2.19	Mesa única, para preenchimento de pilares, em argamassa traço 1:2,8. Preparo mecânico com betoneira rotativa, aplicada manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m² esp. = 20mm, c/ execução de taliscas. M. 06/2014	m²	0,00	27,14	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SINAPI	88485	2.20	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. M. 06/2014	m²	0,00	2,13	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SINAPI	88487	2.21	Aplicação manual de pintura c/ tinta látex, PVA em paredes, duas demãos. M. 06/2014	m²	0,00	8,29	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SINAPI	74106/1	2.22	Impermeabilização de estruturas enterradas c/ tinta asfáltica, duas demãos	m²	118,15	10,51	10,34	1.221,58	1	1.221,58	0,00	0,00	118,15	1.221,58
SINAPI	5968	2.23	Impermeabilização de superfície c/ argamassa de cimento e areia (média), traço 1:3, c/ aditivo impermeabilizante, esp. = 2cm	m²	133,71	42,82	41,34	5.527,19	1	5.527,19	0,00	0,00	133,71	5.527,19
SINAPI	90877	2.24-1	Estaca escavada mecanicamente, 1/ fluido estabilizante, Ø 25cm, até 9,00m de comprimento, concreto lançado por caminho betoneira (desmobilização). M. 02/2015	m	125,20	38,52	37,88	4.744,10	1	4.744,10	0,00	0,00	125,20	4.744,10
SINAPI	92780	2.25-1	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-50 Ø 9,3mm - montagem. M. 12/2015	kg	143,10	7,93	7,80	1.116,29	1	1.116,29	0,00	0,00	143,10	1.116,29
SINAPI	92781	2.26-1	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-50 Ø 8,9mm - montagem. M. 12/2015	kg	187,97	7,53	7,41	1.344,20	1	1.344,20	0,00	0,00	187,97	1.344,20
SINAPI	92762	2.27-1	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-50 Ø 10,0mm - montagem. M. 12/2015	kg	1142,85	6,07	5,97	6.822,24	1	6.822,24	0,00	0,00	1142,85	6.822,24
SINAPI	92765	2.28-1	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-50 Ø 9,3mm - montagem. M. 12/2015	kg	350,30	4,48	4,42	1.547,21	1	1.547,21	0,00	0,00	350,30	1.547,21
SINAPI	87451	2.29-1	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 19x19x39cm (esp. = 19cm) da parede c/ areia líquida menor que 0,75mm e argamassa de assentamento c/ preparo em betoneira. M. 06/2014, M. 09/2014	m²	26,20	77,24	75,88	1.990,70	1	1.990,70	0,00	0,00	26,20	1.990,70
SURB-EDIF	10310	2.30-II	Transporte local c/ caminho basculante 0m¹, rodovia pavimentada (para distâncias superiores a 4km)	m³ x km	0,00	1,22	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SINAPI	93356	2.31-II	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5m excluindo esgotamento / escoamento	m³	0,00	77,57	76,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SINAPI	92722	2.32-II	Concretagem de pilares, fck=25MPa, c/ uso de bomba em edifício c/ seção média de pilares menor ou igual a 0,25m¹ - lançamento, adensamento e acabamento. M. 12/2015	m³	0,00	316,74	311,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SURB-EDIF	11-03-03	2.33-II	Chapisco (traço 1:3 (cimento e areia grossa), esp. = 2cm, preparo manual da argamassa	m²	0,00	10,81	10,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Margem de Contingência</b>								<b>11.278,55</b>						<b>11.278,55</b>
SURB-EDIF	10305	3.1	Argola, argola vertical ou argola areia (feixada na jazida, 1/ transporte)	m³	0,00	14,92	14,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SURB-EDIF	40238	3.2	Transporte local c/ caminho basculante 0m¹, rodovia pavimentada (para distâncias superiores a 4km)	m³ x km	0,00	158,14	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SINAPI	96995	3.3	Relevo interno (edifícios), compactado manualmente	m³	0,00	47,03	46,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SINAPI	93358	3.4	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,50m excluindo esgotamento / escoamento	m³	4,05	77,57	76,31	309,05	1	309,05	0,00	0,00	4,05	309,05
DER	24.21.02	3.5	Estaca a traço (força) Ø 25cm c/ concreto fck=15MPa + 20kg ACQ/m¹ moldado "in-loco"	m	0,00	58,21	92,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SURB-EDIF	38048	3.6	Forma tábuas p/ concreto em fundação 1/ reaproveitamento	m²	2,04	19,70	62,66	128,09	1	128,09	0,00	0,00	2,04	128,09
CPDS	11.18.040	3.7	Leitor de bita	m²	0,59	109,06	107,29	63,30	1	63,30	0,00	0,00	0,59	63,30
SINAPI	92888	3.8	Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-60 Ø 5,0mm - montagem. M. 12/2015	kg	0,00	10,58	10,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SINAPI	92919	3.9	Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-50 Ø 10,0mm - montagem. M. 12/2015	kg	0,00	6,60	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SINAPI	91007	3.10	Formas manuseáveis para paredes de concreto moldadas in loco, de edificações de pavimento único, em obras de vertical sem vãos. M. 06/2015	m²	0,00	11,27	11,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SINAPI	92759	3.11	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-50 Ø 5,0mm - montagem. M. 12/2015	kg	36,29	9,34	9,19	333,40	1	333,40	0,00	0,00	36,29	333,40
SINAPI	92762	3.12	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos utilizando aço CA-50 Ø 5,0mm - montagem. M. 12/2015	kg	169,40	6,07	5,97	1.011,55	1	1.011,55	0,00	0,00	169,40	1.011,55
SINAPI	92722	3.13	Concretagem de pilares, fck=25MPa, c/ uso de bomba em edifício c/ seção média de pilares menor ou igual a 0,25m¹ - lançamento, adensamento e acabamento. M. 12/2015	m³	2,58	316,74	311,59	803,75	1	803,75	0,00	0,00	2,58	803,75
SINAPI	82518	3.14	Alvenaria embasamento esp. = 20cm bloco concreto	m³	0,00	335,30	329,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SURB-EDIF	11-03-03	3.15	Chapisco (traço 1:3 (cimento e areia grossa), esp. = 2cm, preparo manual da argamassa	m²	43,20	10,81	10,63	459,40	1	459,40	0,00	0,00	43,20	459,40





BDI	Desconto sobre a planilha do edital
25,00%	21,30%

Base	Código	Item	Descrição dos Serviços	Un	Quant.	Preço da Materializada	Preço Unitário Final	Contratado	CUSTO	INCLUIDAS		EXCLUIDAS		Total Geral Final	
										Quant.	Total	Quant.	Total	Quant.	Total
SIMAP1	89499	7.3	Tubo PVC, sete normal, esgoto predial, Ø 150mm, fornecido e instalado em subcoletores aforo de esgoto sanitário. Af_12/2014.p	m	0,00	43,35	42,65	0,00 E							
SIMAP1	90711	7.4	Tubo de PVC para rede coletora de esgoto de parede maciça, Ø 300mm, junta elástica, instalado em local de livre escoamento. - fornecimento e assentamento. Af_06/2015	m	62,36	56,51	55,43	4.080,17 M							
SIMURB-EDIF	64600	7.5	Calha/canalata de concreto simples, tipo meia calha, Ø 30cm, para água pluvial	m	27,00	23,76	23,37	631,10 F							
SIMAP1	92834	7.6	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de esgoto sanitário, Ø 300mm, junta elástica, instalado em local de baixo nível de interferências (não inclui fornecimento). Af_12/2015	m	27,00	7,80	7,67	207,18 F							
SIMAP1	83677	7.7	Tubo concreto simples Ø 400mm para drenagem - fornecimento e instalação inclusive escavação manual 1,50m/7m	m	0,00	157,41	154,85	0,00 E							
SIMAP1	83626	7.8	Greixa de fôrpe para calheta L= 15cm, fornecimento e assentamento	m	2,50	322,19	120,20	300,51 E							
SIMURB-EDIF	10305	7.9	Argila, argila vermelha ou argila amarela (retirada na jazida, s/ transporte)	m³	0,00	14,92	14,68	0,00 E							
SIMURB-EDIF	10310	7.10	Transporte local (caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada (para distâncias superiores a 4km))	m³ x km	0,00	1,22	1,20	0,00 E							
SIMAP1	966995	7.11	Relevo interno (edificações) compactado manualmente	m³	0,00	47,03	46,27	0,00 E							
CPDS	03.01.020	7.12	Demolição de concreto simples	m³	0,00	161,15	158,53	0,00 E							
SIMAP1	72900	7.13	Transporte de entulho (caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada, DMT 0,50 a 1,00km	m³	0,00	5,96	5,86	0,00 E							
CPDS	11.04.020	7.14	Concreto (Cx=15Mpa, preparo (C/betonaria, s/ lançamento	m³	0,00	207,47	204,10	0,00 E							
SIMAP1	92873	7.15	Lançamento (C/ uso de balde, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. Af_12/2015	m²	0,00	193,88	189,75	0,00 E							
SIMAP1	83449	7.16	Calha de passagem 80 x 80 x 70cm fundo brta (C/ Tampa	un	10,00	380,30	374,12	3.741,20 E							
SIMAP1	83450	7.17	Calha de passagem 80 x 80 x 62cm fundo brta (C/ Tampa	un	0,00	452,58	445,23	0,00 E							
CPDS	49.05.020	7.18	Pala seco em ferro, 100 x 185 x 50mm, (C/ grelha metálica saída ventral	un	1,00	95,33	93,78	0,00 M							
CPDS	49.05.040	7.19	Pala sifonado em ferro, 150 x 240 x 25mm, (C/ grelha	un	3,00	306,70	301,72	905,15 M							
SIMAP1	88584	7.20-1	Desbaste 800 gramas, PVC, canteiro de obras, fornecido e instalado	un	30,00	24,15	23,76	712,69 I							
CPDS	49.06.580	7.21-1+1	*Grelha com calha e cesto coletor para lixo, em aço inox com 1m de largura *	m	0,00	816,93	805,57	0,00 II							
SIMAP1	93358	8.1	<b>Calha de Desbaste</b> Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,50m excluindo espalhamento / escoramento	m³	0,00	77,57	76,31	0,00 E							
SIMAP1	94097	8.2	Regularização e compactação manual de terreno (C/ soquete	m²	0,00	5,86	5,76	0,00 E							
CPDS	11.18.040	8.3	Lastro de brta	m³	0,00	109,06	107,29	0,00 E							
SIMAP1	96619	8.4	Lastro de concreto rba-estrutural, esp = 5cm, preparo (C/ betonaria	m²	0,00	21,87	21,51	0,00 E							
SIMAP1	72131	8.5	Armadura em tipo de armaço maciço 5 x 10 x 20cm 1 vez (esp = 20cm), assentado (C/ argamassa traço 1:2:8 (cimento, areia e areia)	m²	47,72	122,58	120,59	5.754,46 M							
SIMURB-EDIF	04-02-20	8.6	Emboço cimento areia 1:4 esp = 1,5cm incluso chapisco 1:3 eps = 9mm	m²	72,40	44,27	43,55	3.153,06 M							
SIMAP1	87529	8.7	Massa lince, para revestimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico (C/ betonaria 400lit, aplicada manualmente em faces internas de paredes de ambientes (C/ área maior que 10m², esp = 20mm, (C/ execução de listras. Af_06/2014	m²	9,00	27,14	26,70	240,29 M							
SIMURB-EDIF	20304	9.1	<b>Tampa de Concreto</b> Forma deba pl concreto em (fundido) (C/ reboco/entamento	m³	1,20	63,70	62,66	430,87 M							
CPDS	11.04.020	9.2	Concreto (Cx=15Mpa, preparo (C/ betonaria, s/ lançamento	m³	0,52	207,47	204,10	1.021,91 M							
SIMAP1	92873	9.3	Lançamento (C/ uso de balde, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. Af_12/2015	m³	0,52	193,88	189,75	98,67 M							
SIMAP1	92917	9.4	Armadura de fundações, estruturas de concreto armado, exteio vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilização esp Cx=50 Ø 8.0mm - montagem. Af_12/2015	kg	16,76	8,24	8,11	135,86 M							
SIMAP1	966995	9.5	Relevo interno (edificações) compactado manualmente	m³	0,00	47,03	46,27	0,00 E							
SIMAP1	728592	10	<b>Calçadas e Passarelas Rápidas</b> Capina e limpeza manual de terreno (C/ pequenos arbustos	m²	665,89	1,56	1,53	6.013,26 M							
SIMAP1	93158	10.2	Escavação manual de valas em terra compacta, prof. de 0,00m < h <= 1,00m	m³	0,00	77,57	76,31	0,00 E							
SIMURB-EDIF	10310	10.3	Transporte local (C/ caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada (para distâncias superiores a 4km)	m³ x km	0,00	1,22	1,20	0,00 E							
SIMAP1	83344	10.4	Execução de passeio (calçada) em concreto (cimento/areia/sabo rodado), preparo mecânico, esp = 7cm, (C/ junta de dilatação em madeira, incluso benfiteio e adensamento	m²	0,00	1,01	0,99	0,00 E							
SIMAP1	94995	10.5		m²	147,09	48,80	48,01	7.061,35 E							
										<b>6.013,26</b>	<b>847,24</b>	<b>0,00</b>	<b>6.013,26</b>	<b>847,24</b>	
										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
										<b>6.013,26</b>	<b>847,24</b>	<b>0,00</b>	<b>6.013,26</b>	<b>847,24</b>	





Obras: Término da Construção da EMBE Avenida  
Local: R. Antônio Carlos Prado - Parque dos Cocais - Valinhos - SP

Base	Código	Item	Descrição dos Serviços	Un	Quant.	Preço Referência	Preço Unitário Final	Contratado	Caso	INCLUIÇÕES		EXCLUSÕES		Total Geral Final	
										Quant.	Total	Quant.	Total	Quant.	Total
MERCADO		14	Iluminação	un	0,00	220,24	216,66	363.233,88	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MERCADO	14.1	14.1	Luminária tipo caixa, de sobrepõe, c/ reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação	un	9,00	838,66	825,03	7.425,29	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SINAPI	17131/7	14.2	Quadro de distribuição de energia de embuhr, em chapa metálica, para 40 disjuntores (termomagnéticos monopólares, c/ Baranento frático e neutro, fornecimento e instalação (8 quadros internos e 02 de entrada)	un	254,00	21,45	21,10	5.359,77	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPDS	40.04.460	14.3	Tomada 2P+1 de 20A - 250V, completa	un	100,00	21,08	23,69	2.368,87	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SINAPI	19193	14.4	Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, induzido suporte e placa - fornecimento e instalação, Al. 12/2015	un	30,00	29,80	29,32	879,47	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SINAPI	91955	14.5	Interruptor paralelo (1 módulo), 10A/250V, induzido suporte e placa - fornecimento e instalação, Al. 12/2015	un	10,00	761,53	749,16	7.491,55	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPDS	41.31.500	14.6	Luminária bandada arandela 45º e 90º, Refletor de Led área externa	un	0,00	12,17	11,97	0,00	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SINAPI	93657	14.7	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA (americano) 10 a 30A 240V, fornecimento e instalação, Al. 12/2015	un	0,00	60,09	59,11	0,00	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SINAPI	93656	14.8	Disjuntor termomagnético bipolar padrão NEMA (americano) 10 a 50A 240V, fornecimento e instalação, Al. 12/2015	un	0,00	136,62	134,40	0,00	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPDS	37.17.060	14.9	Dispositivo Diferencial Residual de 25A x 30mA - 2 polos	un	0,00	10899,43	3,08	32.945,02	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SINAPI	91927	14.10	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm², anti-chama 0,6/1,0kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação, Al. 12/2015	m	250,00	12,96	12,75	3.187,35	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SINAPI	91930	14.11	Cabo de cobre flexível isolado, 10mm², anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação, Al. 12/2015	m	300,00	17,98	17,69	5.306,35	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SINAPI	92985	14.14	Tomada para telefone de 4 polos padrão telefones - fornecimento e instalação	un	109,00	27,15	26,71	2.884,55	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SINAPI	2337	14.15	Cabo de cobre flexível isolado, 150mm², anti-chama 0,6/1,0kV, para distribuição - fornecimento e instalação, Al. 12/2015	m	165,60	72,23	71,06	11.766,92	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SINAPI	93011	14.17	Eletroduto rígido rasteável, PVC, Ø 85 mm (3") - fornecimento e instalação, Al. 12/2015	m	0,00	22,86	22,49	0,00	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPDS	37.01.080	14.18	Quadro telefônico de embuhr de 400 x 400 x 120mm	un	1,00	164,50	161,83	161,83	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPDS	39.11.090	14.19	Fio telefônico tipo F1-60, para ligação de aparelhos telefônicos	m	300,00	3,07	3,02	906,03	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPDS	37.01.080	14.20	Quadro telefônico de embuhr de 400 x 400 x 120mm (caixas de passagem de parede 40 x 40cm)	un	25,00	164,50	161,83	4.045,67	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SINAPI	83403	14.21	Interruptor pulsador de campanha ou maninera 2A/250V c/ caixa - fornecimento e instalação (campanha/intervios)	un	2,00	19,98	19,66	39,31	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPDS		14.22	Tomada para antena de TV, cabo coaxial de 5mm, conjunto montado para embuhr 4" x 2" (placa, molde e suporte) - (monte de TV seco para edifícios)	un	28,00	14,94	14,70	411,52	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPDS	37.24.032	14.24	Cabo coaxial de 5mm, conjunto montado para embuhr 4" x 2" (placa, molde e suporte) - (monte Tomada Seca)	un	36,00	13,54	13,32	479,52	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPDS	37.25.100	14.25	Dispositivo DPS classe II, 1 polo, tensão máxima de 175V, corrente máxima de *30VA (tipo ac) = dispositivo de proteção contra surto 175V - 40KA	un	32,00	141,04	138,75	4.439,94	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MERCADO	MERCADO	14.26	Disjuntor termomagnético tripolar 150A, 600V, tipo Fd / Icc - 35KA	un	10,00	446,26	439,01	4.390,08	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SINAPI	171071	14.27	Ventilador de teto	un	8,00	258,76	254,56	2.036,44	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MERCADO	MERCADO	14.28	Ventilador de parede	un	34,00	406,08	399,48	13.582,36	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPDS	43.07.340	14.29	Serviço: ar condicionado a frio, tipo split parede, capacidade de 9.000 btuh	un	4,00	2.356,80	2.318,50	9.274,01	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MERCADO	MERCADO	14.30	Serviço: ar condicionado a frio, tipo split parede, capacidade de 18.000 btuh	un	2,00	3.026,50	2.977,32	5.954,64	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPDS	43.07.350	14.31	Serviço: ar condicionado a frio, tipo split parede, capacidade de 24.000 btuh	un	2,00	3.997,89	3.932,92	11.798,77	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPDS	43.07.360	14.32	Serviço: ar condicionado a frio, tipo split, capacidade de 30.000 btuh	un	2,00	4.187,82	4.119,77	8.239,54	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPDS	38.13.010	14.33-1	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, Ø 30mm, c/ acessórios	m	1,00	5.047,53	4.965,51	4.965,51	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPDS	38.13.020	14.33-2	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, Ø 50mm, c/ acessórios	m	832,00	8,13	8,00	6.656,31	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPDS	38.13.030	14.33-3	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, Ø 75mm, c/ acessórios	m	42,00	10,46	10,28	432,18	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPDS	38.13.040	14.33-4	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, Ø 100mm, c/ acessórios	m	140,92	30,85	30,38	4.276,52	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPDS	41.14.840	14.36-1	Luminária reequipar de sobrepõe tipo caixa aberta c/ alças duplas parabólicas para 2	un	31,00	129,22	127,11	3.940,53	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPDS	41.14.780	14.37-1	Luminária reequipar de sobrepõe tipo caixa fechada, c/ difusor plano em acrílico, para 4	un	331,00	201,86	198,47	65.759,17	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPDS	41.02.650	14.38-1	Lâmpada led tubular 78 c/ Base G13, 1931m - 18W	un	1386,00	65,97	64,84	89.843,50	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPDS	41.14.810	14.39-1	Luminária industrial pendente c/ refletor parabólico 2 / montagem para reator, para	un	45,00	132,02	129,82	5.844,28	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPDS	41.08.260	14.40-1	Lâmpada de vapor de sódio halógena ou tubular, base E40 de 400W	un	45,00	40,98	40,31	1.814,04	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BDI 25,00%  
Desconto sobre a planilha do edital 21,30%  
CPDS-171-SD-NOV/2017  
SINAPI-SD-JAN/2018  
SINAPI-EDIF-SD-JUL/2017  
Contrato: 181/2018  
Prazo: 18 meses  
Data Base: mar/18  
Revisão: 0

Obra: Término da Construção da EMBE Alvorada  
Local: R. Antônio Carlos Prado - Parque dos Cocais - Valinhos - SP

Contrato: 181/2018  
Preço: 18 meses  
Data base: mar/18  
Revisão: 0

Base	Código	Item	Descrição dos Serviços	Un	Quant.	Preço de Referência	Preço Utilizado Final	Contratado	CASO		MIGRAÇÕES		EXCLUSÕES		Total Geral Final	
									Quant.	Total	Quant.	Total	Quant.	Total	Quant.	Total
CPOS	37.13.730	14.41-1	Disjuntor série universal, em caixa mediana, término fixo e magnético situável, tripolar 400V, corrente de 500A até 630A	un	1,00	2.820,43	2.774,46	2.774,46	I	0,00	0,00	1,00	2.774,46	0,00	2.774,46	
CPOS	37.13.840	14.42-1	Mini-disjuntor termomagnético, Bipolar 220/230V, corrente de 10A até 32A	un	147,00	37,92	37,30	5.483,38	I	0,00	0,00	147,00	5.483,38	0,00	5.483,38	
CPOS	37.13.900	14.43-1	Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/230V, corrente de 63A	un	1,00	58,39	57,44	57,44	I	0,00	0,00	1,00	57,44	0,00	57,44	
CPOS	37.17.090	14.44-1	Dispositivo Diferencial Residual de 63A x 30mA - 4 polos	un	15,00	831,33	837,83	12.984,47	I	0,00	0,00	15,00	12.984,47	0,00	12.984,47	
CPOS	37.17.100	14.45-1	Dispositivo Diferencial Residual de 80A x 30mA - 4 polos	un	1,00	205,43	202,08	202,08	I	0,00	0,00	1,00	202,08	0,00	202,08	
CPOS	37.17.110	14.47-1	Dispositivo Diferencial Residual de 100A x 30mA - 4 polos	un	5,00	302,54	298,89	1.482,96	I	0,00	0,00	5,00	1.482,96	0,00	1.482,96	
CPOS	37.17.114	14.48-1	Dispositivo Diferencial Residual de 125A x 30mA - 4 polos	un	1,00	362,78	356,87	356,87	I	0,00	0,00	1,00	356,87	0,00	356,87	
CPOS	41.13.050	14.49-1	Luminária binodada de sobrepôr ou pendente em caixa fechada para 2 lâmpadas fluorescentes de 32/30/40W	un	1,00	508,47	500,18	500,18	I	0,00	0,00	1,00	500,18	0,00	500,18	
CPOS	41.14.780	14.50-1	Luminária retangular de sobrepôr tipo caixa fechada, c/ difusor plano em acrílico, para 4 lâmpadas fluorescentes tubulares de 14/16/18W	un	1,00	132,40	130,24	130,24	I	0,00	0,00	1,00	130,24	0,00	130,24	
SURB-EDIF	13.10.71	14.51-II	Ventilador de parede	un	0,00	201,96	198,67	4.559,37	I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CPOS	43.07.340	14.52-II	Tomada 2P+T de 20A - 250V, completa	un	0,00	406,08	399,48	0,00	II	30,00	11.984,44	0,00	30,00	11.984,44	0,00	11.984,44
CPOS	40.04.460	14.53-II	Cabo de cobre flexível isolado, 25mm <sup>2</sup> , anti-chama 0,6/1,0kv, para circuitos terminais - com isolamento e instalação, AL-21/2015	un	0,00	3.026,50	2.877,32	0,00	II	1,00	2.877,32	0,00	1,00	2.877,32	0,00	2.877,32
SINAPI	9.927	14.54-II	Elaboração de projeto de adequação do sistema de energia elétrica junto a concessionária, com medição em baixa tensão e demand até 75 KVA	m	0,00	21,45	21,10	0,00	II	68,00	1.434,90	0,00	68,00	1.434,90	0,00	1.434,90
CPOS	01.06.020	14.55-II	Caixa de medição externa tipo "M" (900 x 1200 x 270) mm, padrão Eletropaulo	un	0,00	3,13	3,08	0,00	II	634,10	1.921,69	0,00	634,10	1.921,69	0,00	1.921,69
CPOS	36.03.060	14.56-II	Medidor de gás simples, língua de 6cm	un	0,00	18.229,63	17.932,80	0,00	II	1,00	17.932,80	0,00	1,00	17.932,80	0,00	17.932,80
MERCADO	MERCADO	15	Instalação	un	0,00	1.071,74	1.054,27	0,00	II	1,00	1.054,27	0,00	1,00	1.054,27	0,00	1.054,27
MERCADO	MERCADO	15.1	Revestimento	un	1,00	21.580,00	21.229,33	21.229,33	M	0,00	0,00	0,00	1,00	21.229,33	0,00	21.229,33
CPOS	22.20.050	16.1	Medidor de gás simples, língua de 6cm	un	1,00	8.320,78	8.185,57	8.185,57	M	0,00	0,00	0,00	1,00	8.185,57	0,00	8.185,57
SINAPI	7.2175	16.2	Blocos de vidro tipo xedrez 20 x 20 x 10cm, assentado c/ argamassa traço 1:3 (cimento e areia grossa) preparado mecânico, c/ rejuntamento em cimento branco e barras de aço	m <sup>2</sup>	147,00	12,36	12,16	1.787,40	M	0,00	0,00	147,00	1.787,40	0,00	1.787,40	
SURB-EDIF	11.03-03	16.3	Chapisco (cunco traço 1:3 (cimento e areia grossa), esp. = 2cm, preparo manual de argamassa	m <sup>2</sup>	2090,43	9,00	8,85	18.419,61	E	0,00	0,00	2090,43	18.419,61	0,00	18.419,61	
SINAPI	87801	16.4	Emboço ou massa branca em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico c/ betonaria 400lit, aplicada manualmente em juntas, cegos de fachada (c/ presença de vidro), esp. = 45mm, AL-06/2014	m <sup>2</sup>	2080,43	37,00	36,40	75.725,05	E	0,00	0,00	2080,43	75.725,05	0,00	75.725,05	
SINAPI	66053	16.5	Lona plástica preta, esp. = 150micra	m <sup>2</sup>	856,55	5,76	5,67	4.853,55	E	0,00	0,00	856,55	4.853,55	0,00	4.853,55	
CPOS	03.04.020	16.6	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	m <sup>2</sup>	3461,02	8,79	8,65	29.928,00	E	0,00	0,00	3461,02	29.928,00	0,00	29.928,00	
CPOS	05.07.040	16.7	Retirada de emboço	m <sup>2</sup>	101,83	83,79	82,43	8.558,59	E	0,00	0,00	101,83	8.558,59	0,00	8.558,59	
SURB-EDIF	05.01-40	16.8	Argamassa de regularização cm/areia 1:3 esp. = até 2,5cm	m <sup>2</sup>	3461,02	31,19	30,68	106.195,02	E	0,00	0,00	3461,02	106.195,02	0,00	106.195,02	
CPOS	18.06.062	16.9	Piso cerâmico esmaltado c/ textura semi-lucosa PEI-5 resistência química A, para áreas interiores, assentado c/ argamassa traço 1:3 esp. = até 2,5cm	m <sup>2</sup>	3461,02	49,39	48,59	168.161,98	E	0,00	0,00	3461,02	168.161,98	0,00	168.161,98	
CPOS	18.06.063	16.10	Rodapé cerâmico antiderrapante 14x7cm (monocolor), uso exclusivo pedrão c/entre	m	711,14	21,68	21,33	15.166,98	E	0,00	0,00	711,14	15.166,98	0,00	15.166,98	
CPOS	19.01.390	16.11	Soliera em granito L= 10cm sobre argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m	148,27	152,14	149,67	22.191,23	M	0,00	0,00	148,27	22.191,23	0,00	22.191,23	
SINAPI	73900/2	16.12	Cantoneira de alumínio 1" x 1", para proteção de quina de parede	m	375,00	31,15	30,64	11.491,43	M	0,00	0,00	375,00	11.491,43	0,00	11.491,43	
CPOS	30.04.030	16.13	Piso podotátil de concreto - direcional e alerta 25 x 25 x 2,50cm	m <sup>2</sup>	250,00	6,54	6,43	1.608,43	M	0,00	0,00	250,00	1.608,43	0,00	1.608,43	
CPOS	37.02.220	16.14-1	Reboco	m <sup>2</sup>	2080,43	9,14	8,99	18.705,30	I	0,00	0,00	2080,43	18.705,30	0,00	18.705,30	
SURB-EDIF	11-03-03	16.15-II	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20 x 20cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado c/ argamassa industrializada - (composição de azulejos danificados)	m <sup>2</sup>	0,00	65,97	65,88	8.564,20	II	130,00	8.564,20	0,00	130,00	8.564,20	0,00	8.564,20
SINAPI	87801	16.17-II	Chapisco (cunco traço 1:3 (cimento e areia grossa), esp. = 2cm, preparo manual de argamassa)	m <sup>2</sup>	0,00	9,00	8,85	2.081,96	II	231,75	2.081,96	0,00	231,75	2.081,96	0,00	2.081,96
SINAPI	88413	17.1	Emboço ou massa branca em argamassa traço 1:3:8, preparo mecânico c/ betonaria 400lit, aplicada manualmente em juntas, cegos de fachada (c/ presença de vidro), esp. = 45mm, AL-06/2014	m <sup>2</sup>	0,00	37,00	36,40	0,00	II	231,75	2.081,96	0,00	231,75	2.081,96	0,00	2.081,96
SINAPI	89887	17.2	Aplicação manual de pintura c/ tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	m <sup>2</sup>	11380,14	15,00	14,76	168.046,23	I	0,00	0,00	11380,14	168.046,23	0,00	168.046,23	
<b>Pintura</b>																
Aplicação manual de fundo selador acrílico em superfícies externas de teladas de edifícios de múltiplos pavimentos, AL-06/2014				m <sup>2</sup>	2080,43	3,53	3,47	7.224,58	E	0,00	0,00	2080,43	7.224,58	0,00	7.224,58	
Aplicação manual de pintura c/ tinta látex acrílica em paredes, duas demãos				m <sup>2</sup>	11380,14	15,00	14,76	168.046,23	I	0,00	0,00	11380,14	168.046,23	0,00	168.046,23	

Objeto: Término da Construção da EMEB Alvorada  
Local: R. Antônio Carlos Prado - Parque dos Coques - Vilinhos - SP

Contrato: 181/2018  
Prazo: 18 meses  
Data Base: mar/18  
Revisão: 0

BDI  
25,00%  
21,10%

CPDS-171-SO-NOV/2017  
SIMAP1-SD-JAN/2018  
SUIRB-EDIF-SO-JUL/2017

Base	Código	Item	Descrição dos Serviços	Un	Quant.	Preço da Unidade	Preço Unitário Final	Contratado	Quant.	INCLUIDAS		EXCLUIDAS		Total Geral Final	
										Total	Quant.	Total	Quant.	Total	
SIMAP1	95468	17.2	pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção / zarcado (1 demão)	m²	131,63	40,57	39,91	5.253,45	M	0,00	0,00	0,00	131,63	5.253,45	
SIMAP1	74149/1	17.4	pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, incluída uma demão de fundo anticorrosivo. Utilização de revólver (ar-comprimido)	m²	1.070,81	16,31	16,04	17.181,11	M	0,00	0,00	0,00	1.070,81	17.181,11	
CPDS	33.03.710	17.5	Verniz sintético brilhante em concreto ou bloco, duas demãos	m²	2.532,88	17,00	16,72	42.359,25	M	0,00	0,00	0,00	2.532,88	42.359,25	
CPDS	33.11.020	17.6	Pintura esmalte acrílico, duas demãos, sobre superfície metálica	m²	223,69	29,91	29,41	6.579,65	M	0,00	0,00	0,00	223,69	6.579,65	
SIMAP1	74149/1	17.7	pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, incluída uma demão de fundo anticorrosivo. Utilização de revólver (ar-comprimido). (incluindo caixa d'água (cilindro)	m²	40,00	16,31	16,04	641,80	M	0,00	0,00	0,00	40,00	641,80	
CPDS	01.23.020	17.8	Limpeza de estrutura / escova de aço	m²	332,12	6,19	6,09	2.022,42	E	0,00	0,00	0,00	332,12	2.022,42	
SUIRB-EDIF	14-01-03	18.1	Vidro liso comum transparente, esp. = 4mm	m²	222,39	113,43	111,59	25.002,49	I	0,00	0,00	0,00	222,39	25.002,49	
SUIRB-EDIF	14-01-11	18.2	Vidro fantasia tipo catedral, esp. = 4mm	m²	1,80	105,48	103,77	186,78	M	0,00	0,00	0,00	1,80	186,78	
SUIRB-EDIF	14-01-03	18.3.11	Vidro liso comum transparente, esp. = 4mm	m²	0,00	113,43	111,59	0,00	IT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18		0											
		19	<b>Aparelhos Sanitários e Mobília</b>					<b>78.978,26</b>						<b>16.708,81</b>	
CPDS	30.01.020	19.1	Bancal de apoio para pessoas c/ mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1,1/2" x 50mm	un	22,00	170,69	167,92	3.694,16	I	0,00	0,00	0,00	22,00	3.694,16	
CPDS	30.08.020	19.2	Beca sifonada de louça / abertura frontal - 6lts	0	0,00		485,39	0,00	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CPDS	30.08.020	19.3	Assento para banha sanitária / abertura frontal para pessoas c/ mobilidade reduzida	un	13,00	577,73	568,34	7.388,44	I	0,00	0,00	0,00	13,00	7.388,44	
MERCADO	MERCADO	19.4	Assento vaso sanitário infantil em plástico branco	un	6,00	55,20	54,89	329,36	M	0,00	0,00	0,00	6,00	329,36	
MERCADO	MERCADO	19.5	Assento sanitário de plástico, tipo convencional	un	16,00	42,50	41,81	668,95	E	0,00	0,00	0,00	16,00	668,95	
CPDS	44.03.13	19.6	Dispenser saboneteira Linha Excelência, código 7009, Melhoramentos ou equivalente (440313)	un	7,00	36,70	36,10	252,79	I	0,00	0,00	0,00	7,00	252,79	
CPDS	44.03.18	19.7	Dispenser toalha Linha Excelência, código 7007, Melhoramentos ou equivalente (440318)	un	0,00	78,90	77,62	0,00	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MERCADO	MERCADO	19.8	Papelaria médica Linha Izi, código 2020.C17, Beza ou equivalente	un	7,00	182,20	182,19	1.275,33	I	0,00	0,00	0,00	7,00	1.275,33	
SIMAP1	74125/2	19.9	Espelho cristal esp. = 4mm, c/ moldura em alumínio e compensado 6mm plastificado cobado	m²	12,60	402,06	395,53	4.989,63	I	0,00	0,00	0,00	12,60	4.989,63	
SIMAP1	8087/2	19.10	Tanque de louça branca / coluna, 30lts ou equivalente - fornecimento e instalação. M.12/2013	un	1,00	652,49	641,89	641,89	M	0,00	0,00	0,00	1,00	641,89	
SIMAP1	86909	19.11	Fornelha cromada tubo móvel, de mesa, Ø 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, pedida alto	un	2,00	74,84	74,84	149,68	E	0,00	0,00	0,00	2,00	149,68	
SIMAP1	86914	19.12	Fornelha cromada Ø 1/2" ou 3/4" para tanque, pedida popular - fornecimento e instalação. M.12/2013 (Jardim)	un	3,00	29,96	34,81	104,44	M	0,00	0,00	0,00	3,00	104,44	
SIMAP1	86878	19.13	Válvula em metal cromado tipo americana 3/1/2" x 1/2" para pia - fornecimento e instalação. M.12/2013	un	3,00	39,56	60,82	182,45	E	0,00	0,00	0,00	3,00	182,45	
SIMAP1	86884	19.14	Fogão freixe em plástico branco, Ø 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação. M.12/2013	un	37,00	8,30	8,17	302,11	I	0,00	0,00	0,00	37,00	302,11	
SIMAP1	86882	19.15	Sifão do tipo garrafão em PVC 1,1/4" x 1,1/2" - fornecimento e instalação. M.12/2013	un	37,00	18,53	18,32	678,11	I	0,00	0,00	0,00	37,00	678,11	
CPDS	44.03.590	19.16	Torneira de mesa para pia c/ bica móvel e arçador em latão fundido cromado	un	33,00	120,59	118,93	3.924,54	I	0,00	0,00	0,00	33,00	3.924,54	
CPDS	44.03.470	19.17	Torneira de parede para pia c/ bica móvel e arçador, em latão fundido cromado	un	2,00	57,28	57,28	114,56	E	0,00	0,00	0,00	2,00	114,56	
CPDS	44.20.390	19.18	Válvula de PVC para lavatório	un	37,00	4,88	4,88	180,76	I	0,00	0,00	0,00	37,00	180,76	
MERCADO	MERCADO	19.19	Bebedouro elétrico de pressão em aço inoxidável, capacidade de refrigeração de 100l/h	un	6,00	2.899,00	2.851,89	17.111,35	I	0,00	0,00	0,00	6,00	17.111,35	
SUIRB-EDIF	10.13.79	19.20	Filtro pressão como (qualquer) c/ elem. Filtreiras carvão e cel. 360lts/h	un	6,00	231,66	236,79	1.420,74	I	0,00	0,00	0,00	6,00	1.420,74	
SUIRB-EDIF	10.14.16	19.21	Torneira de fechamento automático de bacia (bebedouros)	un	32,00	298,54	293,79	9.401,15	I	0,00	0,00	0,00	32,00	9.401,15	
SUIRB-EDIF	10.14.11	19.22	Torneira para lavatório c/ sensor (PNE)	un	12,00	853,22	839,36	10.072,36	I	0,00	0,00	0,00	12,00	10.072,36	
MERCADO	MERCADO	19.23	Tanque de inox 800 x 600mm (conforme projeto) (Cozinha)	un	1,00	3.697,90	3.627,97	3.627,97	M	0,00	0,00	0,00	1,00	3.627,97	
CPDS	30.08.060	19.24.1	Bacia sanitária de louça para pessoas c/ mobilidade reduzida - 6lts	un	3,00	493,41	488,37	1.465,10	I	0,00	0,00	0,00	3,00	1.465,10	
CPDS	47.04.080	19.25.1	Válvula de descarga anti-vandalismo, Ø 1,1/2"	un	12,00	300,01	295,12	3.541,44	I	0,00	0,00	0,00	12,00	3.541,44	
CPDS	43.03.080	19.26.1	Chuveiro elétrico de 6.500W/220V c/ resistência blindada	un	4,00	363,55	357,62	1.430,50	I	0,00	0,00	0,00	4,00	1.430,50	
CPDS	47.04.080	19.27.1	Válvula de descarga externa, tipo alavanca c/ registro próprio, Ø 1,1/4" e Ø 1,1/2" (PNE)	un	12,00	458,45	450,98	5.411,73	I	0,00	0,00	0,00	12,00	5.411,73	
CPDS	44.06.010	19.28.11	Lavatório coletivo em aço inoxidável	m	0,00	828,42	814,92	0,00	IT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20	<b>Queda de Polípetos</b>	0				<b>258.049,86</b>						<b>16.705,81</b>	
CPDS	19.01.390	20.1	Socora em garrafa L= 30cm sobre arganassa trava 1.4 (tombo e areia)	m	2,40	152,14	149,67	359,20	M	0,00	0,00	0,00	2,40	359,20	
SIMAP1	34238	20.2	Calha em cobre ou aço galvanizado no 24, desenvolvimento de 60cm	m	74,80	57,54	70,96	5.307,65	M	0,00	0,00	0,00	74,80	5.307,65	
								<b>258.049,86</b>					<b>8.886,48</b>		<b>276.649,21</b>
								<b>359,20</b>					<b>0,00</b>		<b>359,20</b>
								<b>5.307,65</b>					<b>0,00</b>		<b>5.307,65</b>



Obras: Término da Construção da EMBE Alvorada  
Local: R. Antônio Carlos Prado - Parque dos Cocais - Vilinhos - SP

Bot 126,00% Desconto sobre a planilha de ateli 21,30%  
CROS-171-SD-NOV/2017  
SIMAP1-SD-JAN/2018  
SIURB-EDIF-SD-JUL/2017  
Contrato: 181/2018  
Prazo: 18 meses  
Data Base: mar/18  
Revisão: 0

Nome	Código	Item	Descrição dos Serviços	Un	Quant.	Preço Unitário Retenvido	Preço Unitário Final	Contratado	INCLUIDOS		EXCLUIDOS		Total Geral Final	
									Quant.	Total	Quant.	Total	Quant.	Total
SIURB-EDIF	24145/1	20.3	Pinura esmalte frozo, duas demãos, sobre superfície metálica, incluso um demão de fundo antiorçoso. Utilização de removedor (re-comprimido).	m²	3810,00	16,31	16,04	61.131,31	0,00	0,00	3.810,00	61.131,31	0,00	3.810,00
SIURB-EDIF	92669	20.4	Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para uma ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termocustada, incluso transporte vertical. At. 1/2/2015	m²	501,09	27,10	26,66	13.358,87	0,00	0,00	501,09	13.358,87	0,00	501,09
SIURB-EDIF	94213	20.5	Cobertura c/ telha de aço zincado, (trapezoidal, esp. = 0,5mm, incluindo acessórios (fechamento lateral) de telhas parâsulas)	m²	501,09	37,98	37,36	18.722,14	0,00	0,00	501,09	18.722,14	0,00	501,09
CROS	04.03.040	20.6	Reparos de telhas onduladas de fibrocimento/plástica ou alumínio/galva pré-fabricada (revisão e troca de telhas parâsulas)	m²	70,00	5,68	5,59	391,14	0,00	0,00	70,00	391,14	0,00	70,00
SIURB-EDIF	94449	20.7	Telhamento c/ telha ondulada de fibra de vidro, esp. = 0,6mm, para telhado c/ inclinação maior que 10° c/ até 2 águas, incluso (gamento: At. 06/2016 (revisão e troca de telhas transiçãis)	m²	70,00	48,27	47,49	3.323,99	0,00	0,00	70,00	3.323,99	0,00	70,00
CROS	16.33.040	20.8	Ruído em chapa de aço galvanizado p/ 24, desenvolvimento de 40cm	m	62,60	84,73	63,35	5.217,91	0,00	0,00	62,60	5.217,91	0,00	62,60
SIURB-EDIF	95468	20.9	Pinura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção c/ zinco (1 demão)	m²	25,04	40,57	39,91	999,36	0,00	0,00	25,04	999,36	0,00	25,04
SIURB-EDIF	09-02-11	20.10	Estruturo de aço galvanizado eletrolítico Ø 20mm (3/4"), tipo leve - fechamento e instalação	m	97,44	28,98	28,52	2.778,88	0,00	0,00	97,44	2.778,88	0,00	97,44
SIURB-EDIF	17-03-61	20.11	16.04.002 que-03 trave de furepod de solda (sumaga direta)	m	2,00	2.151,00	2.116,05	4.232,09	0,00	0,00	2,00	4.232,09	0,00	2,00
SIURB-EDIF	17-03-63	20.12	3501.16 Tabela completa c/ suporte e rede para basquete	un	2,00	3.863,75	3.800,96	7.601,93	0,00	0,00	2,00	7.601,93	0,00	2,00
SIURB-EDIF	17-03-60	20.13	3501.12 Poste oficial completo c/ rede para voleibol	un	1,00	1.843,56	1.813,60	1.813,60	0,00	0,00	1,00	1.813,60	0,00	1,00
CROS	33.03.710	20.14	Verniz sintético brilhante em concreto ou tijolo, duas demãos	m²	77,80	19,04	18,73	1.457,24	0,00	0,00	77,80	1.457,24	0,00	77,80
SIURB-EDIF	75889	20.15	Pinura para telhas de alumínio c/ tela esmalte automotiva	m²	0,00	18,85	18,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIURB-EDIF	17-04-14	20.16	Limpeza geral de quadra poliesportiva	m²	851,00	5,28	5,20	4.428,64	0,00	0,00	851,00	4.428,64	0,00	851,00
CROS	00.23.020	20.17	Limpeza de armadura c/ escova de aço	m²	0,00	6,19	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIURB-EDIF	10-50-32	20.18	Remoço de calhas e condutores de águas pluvias	m	74,80	3,92	3,86	288,45	0,00	0,00	74,80	288,45	0,00	74,80
SIURB-EDIF	10-50-32	20.18	Revestimento em cédri autocolante 2mm	m²	0,00	85,00	83,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIURB-EDIF	10-50-32	20.18	Revestimento em cédri autocolante 2mm	m²	0,00	85,00	83,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIURB-EDIF	10-50-32	20.18	Revestimento em cédri autocolante 2mm	m²	0,00	85,00	83,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIURB-EDIF	10-50-32	20.18	Revestimento em cédri autocolante 2mm	m²	0,00	85,00	83,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIURB-EDIF	10-50-32	20.18	Revestimento em cédri autocolante 2mm	m²	0,00	85,00	83,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIURB-EDIF	10-50-32	20.18	Revestimento em cédri autocolante 2mm	m²	0,00	85,00	83,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIURB-EDIF	10-50-32	20.18	Revestimento em cédri autocolante 2mm	m²	0,00	85,00	83,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIURB-EDIF	10-50-32	20.18	Revestimento em cédri autocolante 2mm	m²	0,00	85,00	83,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIURB-EDIF	10-50-32	20.18	Revestimento em cédri autocolante 2mm	m²	0,00	85,00	83,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIURB-EDIF	10-50-32	20.18	Revestimento em cédri autocolante 2mm	m²	0,00	85,00	83,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIURB-EDIF	10-50-32	20.18	Revestimento em cédri autocolante 2mm	m²	0,00	85,00	83,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIURB-EDIF	10-50-32	20.18	Revestimento em cédri autocolante 2mm	m²	0,00	85,00	83,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIURB-EDIF	10-50-32	20.18	Revestimento em cédri autocolante 2mm	m²	0,00	85,00	83,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIURB-EDIF	10-50-32	20.18	Revestimento em cédri autocolante 2mm	m²	0,00	85,00	83,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIURB-EDIF	10-50-32	20.18	Revestimento em cédri autocolante 2mm	m²	0,00	85,00	83,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIURB-EDIF	10-50-32	20.18	Revestimento em cédri autocolante 2mm	m²	0,00	85,00	83,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIURB-EDIF	10-50-32	20.18	Revestimento em cédri autocolante 2mm	m²	0,00	85,00	83,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIURB-EDIF	10-50-32	20.18	Revestimento em cédri autocolante 2mm	m²	0,00	85,00	83,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIURB-EDIF	10-50-32	20.18	Revestimento em cédri autocolante 2mm	m²	0,00	85,00	83,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIURB-EDIF	10-50-32	20.18	Revestimento em cédri autocolante 2mm	m²	0,00	85,00	83,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIURB-EDIF	10-50-32	20.18	Revestimento em cédri autocolante 2mm	m²	0,00	85,00	83,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIURB-EDIF	10-50-32	20.18	Revestimento em cédri autocolante 2mm	m²	0,00	85,00	83,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIURB-EDIF	10-50-32	20.18	Revestimento em cédri autocolante 2mm	m²	0,00	85,00	83,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIURB-EDIF	10-50-32	20.18	Revestimento em cédri autocolante 2mm	m²	0,00	85,00	83,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIURB-EDIF	10-50-32	20.18	Revestimento em cédri autocolante 2mm	m²	0,00	85,00	83,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIURB-EDIF	10-50-32	20.18	Revestimento em cédri autocolante 2mm	m²	0,00	85,00	83,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIURB-EDIF	10-50-32	20.18	Revestimento em cédri autocolante 2mm	m²	0,00	85,00	83,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIURB-EDIF	10-50-32	20.18	Revestimento em cédri autocolante 2mm	m²	0,00	85,00	83,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIURB-EDIF	10-50-32	20.18	Revestimento em cédri autocolante 2mm	m²	0,00	85,00	83,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIURB-EDIF	10-50-32	20.18	Revestimento em cédri autocolante 2mm	m²	0,00	85,00	83,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIURB-EDIF	10-50-32	20.18	Revestimento em cédri autocolante 2mm	m²	0,00	85,00	83,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIURB-EDIF	10-50-32	20.18	Revestimento em cédri autocolante 2mm	m²	0,00	85,00	83,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIURB-EDIF	10-50-32	20.18	Revestimento em cédri autocolante 2mm	m²	0,00	85,00	83,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIURB-EDIF	10-50-32	20.18	Revestimento em cédri autocolante 2mm	m²	0,00	85,00	83,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIURB-EDIF	10-50-32	20.18	Revestimento em cédri autocolante 2mm	m²	0,00	85,00	83,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIURB-EDIF	10-50-32	20.18	Revestimento em cédri autocolante 2mm	m²	0,00	85,00	83,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIURB-EDIF	10-50-32	20.18	Revestimento em cédri autocolante 2mm	m²	0,00	85,00	83,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIURB-EDIF	10-50-32	20.18	Revestimento em cédri autocolante 2mm	m²	0,00	85,00	83,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIURB-EDIF	10-50-32	20.18	Revestimento em cédri autocolante 2mm	m²	0,00	85,00	83,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIURB-EDIF	10-50-32	20.18	Revestimento em cédri autocolante 2mm	m²	0,00	85,00	83,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIURB-EDIF	10-50-32	20.18	Revestimento em cédri autocolante 2mm	m²	0,00	85,00	83,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIURB-EDIF	10-50-32	20.18	Revestimento em cédri autocolante 2mm	m²	0,00	85,00	83,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIURB-EDIF	10-50-32	20.18	Revestimento em cédri autocolante 2mm	m²	0,00	85,00	83,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIURB-EDIF	10-50-32	20.18	Revestimento em cédri autocolante 2mm	m²	0,00	85,00	83,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIURB-EDIF	10-50-32	20.18	Revestimento em cédri autocolante 2mm	m²	0,00	85,00	83,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIURB-EDIF	10-50-32	20.18	Revestimento em cédri autocolante 2mm	m²	0,00	85,00	83,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIURB-EDIF	10-50-32	20.18	Revestimento em cédri autocolante 2mm	m²	0,00	85,00	83,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIURB-EDIF	10-50-32	20.18	Revestimento em cédri autocolante 2mm	m²	0,00	85,00	83,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIURB-EDIF	10-50-32	20.18	Revestimento em cédri autocolante 2mm	m²	0,00	85,00	83,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIURB-EDIF	10-50-32	20.18	Revestimento em cédri autocolante 2mm	m²	0,00	85,00	83,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIURB-EDIF	10-50-32	20.18	Revestimento em cédri autocolante 2mm	m²	0,00	85,00	83,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SIURB-EDIF	10-50-32	20.18	Revestimento em											



Obras: Término de Construção da EMBE Alvorada  
Local: R. Antônio Carlos Prado - Parque dos Cochas - Valinhos - SP

BOI Desconto sobre a planilha de obra  
25,00% 21,30%

CPDS-171-SD-NOV/2017  
SINAPI-SD-JAN/2018  
SINAPI-SD-JUL/2017

Contrato: 181/2018  
Preço: 18 meses  
Data Base: nov/18  
Revisão: 0

Base	Código	Item	Descrição dos Serviços	Un	Quant.	Preço de Referência	Preço Unitário	Contrato	INCLUSÕES		EXCLUSÕES		Total	
									Quant.	Total	Quant.	Total	Quant.	Total
CPDS	97.01.010	21.15	Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio (sinalização dos extintores)	un	22,00	14,35	14,12	310,57 M	0,00	0,00	22,00	310,57		
CPDS	97.01.010	21.16	Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio (sinalização dos acionadores de alarmes de incêndio)	un	12,00	14,35	14,12	169,40 M	0,00	0,00	12,00	169,40		
CPDS	97.01.010	21.17	Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio (sinalização de portas de fuga)	un	30,00	14,35	14,12	423,50 M	0,00	0,00	30,00	423,50		
CPDS	97.01.010	21.18	Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio (sinalização das saídas)	un	15,00	14,35	14,12	211,75 E	0,00	0,00	15,00	211,75		
SINAPI	73775/2	21.19	Iluminação autônoma de emergência - led	un	42,00	123,47	121,46	5.101,47 M	0,00	0,00	42,00	5.101,47		
SINAPI	73775/2	21.20	Extintor de incêndio sp 90 Quinica 4kg fornecimento e colocação	un	12,00	114,40	112,54	1.350,49 M	0,00	0,00	12,00	1.350,49		
SINAPI	73775/2	21.21	Extintor de incêndio água-pressurizada 10litros inclusive suporte parede completa, fornecimento e colocação	un	10,00	117,58	115,67	1.156,69 E	0,00	0,00	10,00	1.156,69		
SINAPI	73775/1	21.22-I	Luminária de emergência autônoma c/ 2 lâmpadas fluorescentes de 8W	un	48,00	123,47	121,46	5.828,96 I	0,00	0,00	48,00	5.828,96		
CPDS	50.10.140	21.24-II	Extintor manual de gás carbonico 5 Bc - capacidade de 6 kg	un	1,00	114,40	112,54	112,54 I	0,00	0,00	1,00	112,54		
SINAPI	08.10.36	21.25-II	Iluminação autônoma de emergência - led	un	0,00	359,21	353,36	0,00 II	1,00	0,00	1,00	353,36		
CPDS	48.02.060	21.26-II	Entrada completa de gás GLP com 4 cilindros de 45 kg	un	0,00	123,47	121,46	0,00 II	26,00	0,00	26,00	3.158,05		
SINAPI	91.053	21.27-II	*CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO ATÉ 24 LUGARES	un	0,00	6.541,18	6.434,56	0,00 II	1,00	0,00	1,00	6.434,56		
SINAPI	91.036	21.28-II	*BATERIA ESTACIONARIA CHUMBO/CALCIO 45A - 12V	un	0,00	1.274,25	1.274,25	0,00 II	1,00	0,00	1,00	1.274,25		
CPDS	97.01.010	21.29-II	Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio (sinalização dos extintores)	un	0,00	364,02	358,09	0,00 II	1,00	0,00	1,00	358,09		
CPDS	97.01.010	21.30-II	Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio (sinalização do rota de fuga)	un	0,00	14,35	14,12	0,00 II	14,00	0,00	14,00	197,84		
SINAPI	73859/2	22.1	Serviços Complementares Capina e limpeza manual de terreno com pequenos arbustos	m²	267,34	1,56	1,53	410,27 M	0,00	0,00	267,34	410,27		
SINAPI	01.03.10	22.2	Transporte local c/ caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada (para distâncias superiores a 4km)	m³ x km	40,10	1,22	1,20	48,13 M	0,00	0,00	40,10	48,13		
SINAPI	01.03.05	22.3	Espalhamento de material em bota fora, c/ utilização de trator de esteiras de 155Hp	m³	40,10	0,99	0,99	39,84 M	0,00	0,00	40,10	39,84		
SINAPI	01.03.10	22.4	Água, água verdejante ou água arejada (repleta na jazida, s/ transporte)	m³	53,47	14,92	14,68	784,81 E	0,00	0,00	53,47	784,81		
SINAPI	01.03.10	22.5	Transporte local c/ caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada (para distâncias superiores a 4km)	m³ x km	64,16	1,22	1,20	77,00 E	0,00	0,00	64,16	77,00		
SINAPI	96995	22.6	Rebaterio interno (edifícios) compactado manualmente	m³	53,47	47,03	46,27	2.473,83 M	0,00	0,00	53,47	2.473,83		
SINAPI	65180	22.7	Platão de grama arenosa em rolo	m²	300,00	12,31	12,11	3.632,99 I	0,00	0,00	300,00	3.632,99		
CPDS	46.10.020	22.8	Tubo de cobre classe A, Ø 22mm (3/4"), inclusive conexões	m	12,00	57,85	56,91	682,92 M	0,00	0,00	12,00	682,92		
SINAPI	73787/1	22.9	Alumbrado em tubos de aço galvanizado c/ cobertura, dia 24x0, Ø 2", H= 3,00m, fardos a cada 2,00m em blocos de concreto, c/ tela de arame galvanizado revestido com PVC, Ho 12 Dwg e malha 7,5 x 7,5cm	m²	102,80	197,26	194,05	19.948,81 I	0,00	0,00	102,80	19.948,81		
CPDS	33.01.280	22.10	fardos de tintas rasas até 5,0mm de largura, na massa	m	14,25	31,14	30,63	436,53 M	0,00	0,00	14,25	436,53		
CPDS	03.02.040	22.11	Demolição de estrutura estrutural de blocos vazados de concreto	m³	0,28	56,60	57,65	16,14 M	0,00	0,00	0,28	16,14		
SINAPI	72990	22.12	Transporte de enchimento c/ caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada, DMT 0,5 e 1,0km	m³	0,34	5,96	5,86	1,99 M	0,00	0,00	0,34	1,99		
SINAPI	11.03.03	22.13	Chapisco auto-retardo 1:3 (cimento e areia grossa), esp. = 2cm, preparo manual da argamassa	m²	7,13	10,81	10,63	75,62 M	0,00	0,00	7,13	75,62		
SINAPI	87529	22.14	Massa única, para acabamento de pintura, em argamassa traço 1:2,8, preparo mecânico c/ betoneira 400kg, aplicada manualmente em traços menores de paredes de ambientes c/ área maior que 10m², esp. = 20mm, c/ preparo de bacias. At. 06/2014	m²	7,13	27,14	26,70	190,36 M	0,00	0,00	7,13	190,36		
CPDS	13.03.710	22.15	Aplicação manual de pintura c/ tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	m²	128,36	17,55	17,26	2.216,11 M	0,00	0,00	128,36	2.216,11		
CPDS	55.01.020	22.17	Verniz sintético brilhante em concreto ou tijolo, duas demãos	m²	81,43	19,04	18,73	1.525,23 M	0,00	0,00	81,43	1.525,23		
SINAPI	188413	22.18	Limpça final da obra	m²	4446,50	10,26	10,09	44.879,75 M	0,00	0,00	4.446,50	44.879,75		
CPDS	30.04.020	22.19	Aplicação manual de fundo selador acrílico em superfícies externas de sacada de edifícios de múltiplos pavimentos. At. 06/2014	m²	7,13	3,51	3,47	24,76 E	0,00	0,00	7,13	24,76		
CPDS	14.30.160	22.20	Boracha colada - piso still de alvenaria	m²	15,00	140,55	138,27	2.073,99 M	0,00	0,00	15,00	2.073,99		
SINAPI	96113	22.21	Ferro em placas de peso, para ambientes comerciais. At. 09/2017, p	m²	1252,73	32,60	32,07	40.175,36 E	0,00	0,00	1.159,29	37.178,72		
CPDS	44.02.060	22.22	Tempo/parada em granito c/ esp. = 3cm (tempo de granite: proteções DM1, e cozinha)	m²	9,50	940,61	925,33	8.790,59 M	0,00	0,00	9,50	8.790,59		
						<b>1.903.309,18</b>		<b>1.903.309,18</b>		<b>49.383,11</b>		<b>216.273,81</b>		



Obra: Término da Construção da EMEB Alvorada  
 Local: R. Antônio Carlos Prado - Parque dos Cocais - Vailinhos - SP

BDI 125,00%  
 Desconto sobre a planilha de custos 21,30%  
 CPROS-171-SO-NOV/2017  
 SINAPI-SO-JAN/2018  
 SINAPI-EDIF-SO-JUL/2017  
 Contrato: 18/1/2018  
 Prazo: 18 meses  
 Data Base: m/v/18  
 Revisão: 0

Base	Codigo	Item	Descrição dos Serviços	Un	Quant.	Preço de Referência	Preço Unitário Final	Contratação	CASO	INCLUSÕES		EXCLUSÕES		Total Geral Final	
										Quant.	Total	Quant.	Total	Quant.	Total
CPOS	62.20.330	22.23	Coifa em aço inox/diável / filtro e exaustor axial - área até 3,00m² (coifa / exaustor (cozinha))	Un	1,00	5.405,65	5.317,82	5.317,82 E		1,00	5.317,82	0,00	0,00	0,00	0,00
FDE	16.06.090	22.24-1	Lousa Branca LG-08 - pedida FDE Cód. 16.06.090	m²	81,60	509,00	491,85	40.134,99 I			0,00	40.134,99	0,00	40.134,99	81,60
CPOS	14.20.010	22.25-1	Veigas, contravergas e pilares de concreto armado	m³	4,22	1.089,04	1.092,21	4.442,41 I			0,00	4.442,41	0,00	4.442,41	4,22
CPOS	62.20.340	22.26-1I	* Coifa em aço inox/diável com filtro e exaustor axial - área de 3,01 até 7,50 m²	m³	0,00	5.494,67	5.405,11	0,00 II	3,75		20.269,17	0,00	20.269,17	3,75	20.269,17
CPOS	14.30.160	22.27-1I	Reparo de divisórias em placas de gesso acartonado resistente ao fogo 30min 73/48mm - 1st/1st	m²	0,00	131,21	129,08	0,00 II	53,48		6.903,06	0,00	6.903,06	53,48	6.903,06
SINAPI	74244/1	22.28-1I	Alumbrando em tubos de aço galvanizado, / costura, din 2440, Ø 2", H= 3,00m, fixados a cada 2,00m em blocos de concreto, / tela de arame galvanizado revestido com PVC, fio 12 hwg e malha 7,5 x 7,5cm	m²	0,00	197,26	194,05	0,00 II	217,08		42.125,36	0,00	42.125,36	217,08	42.125,36
SINAPI	73859/2	22.29-1I	Capina e limpeza manual de terreno com pequenas arbustos	m²	0,00	1,56	1,53	0,00 II	32,66		50,12	0,00	50,12	32,66	50,12
				<b>TOTAL GERAL CONTRATO</b>				<b>2.178.348,28</b>	<b>0,00 II</b>	<b>11,37%</b>	<b>247.496,40</b>	<b>3,85%</b>	<b>80.009,27</b>	<b>7,69%</b>	<b>2.345.866,28</b>

Emp. José Eduardo Figueiredo  
 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS - DOP  
 CONTRATO  
 VALOR INICIAL DO CONTRATO 1.923.908,22

Mário Luis Fernandes  
 Engº Civil - CREA: 0601007597  
 D.O.P./S.O.S.P.

% DO 1º ADITIVO	
VALOR DO 1º ADITIVO	254.441,03
VALOR CONSOLIDADO C/ 1º ADITIVO	2.178.349,25
%	
VALOR DO 2º ADITIVO	167.517,13
VALOR CONSOLIDADO C/ 2º ADITIVO	2.345.866,38
%	
% TOTAL 1º E 2º ADITIVO	21,93%



Nº

RF-01

RE

V. 00

CLIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

FOLHA

1 de 9

TÍTULO:

FINALIZAÇÃO DA OBRA EMEB ALVORADA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO ADITIVO 2



Quadra de esportes – Fechamento lateral com telhas



Quadra de esportes – pintura de muretas, telhas




Peitoril em granito, pintura de paredes internas



Regularização, Impermeabilização e pintura de fachadas



Pintura de paredes internas

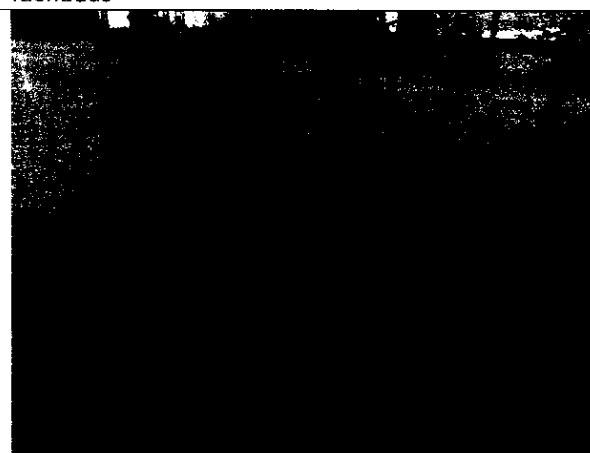

Regularização e acabamento do piso da Quadra.




Nº RF-01 RE V. 00


CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS FOLHA:

2 de 9

TÍTULO: FINALIZAÇÃO DA OBRA EMEB ALVORADA  
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO ADITIVO 2

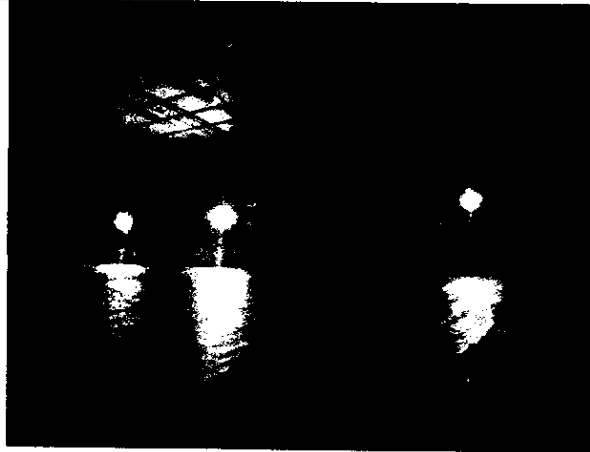

Regularização e acabamento do piso da Quadra.

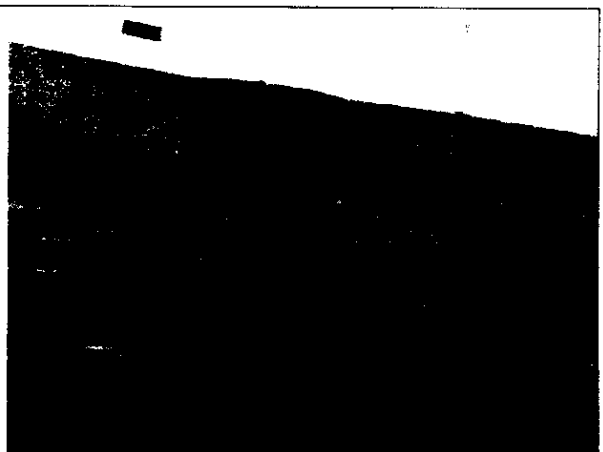

Regularização e acabamento do piso da Quadra.



Malha de aço, concreto do piso da Quadra



Pinturas internas



Tubulação, peitoril em granito



Instalação de Águas pluviais



Nº.

RF-01

RE  
V. 00

CLIENTE


PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

FOLHA:


3 de 9

TÍTULO:

FINALIZAÇÃO DA OBRA EMEB ALVORADA  
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO ADITIVO 2

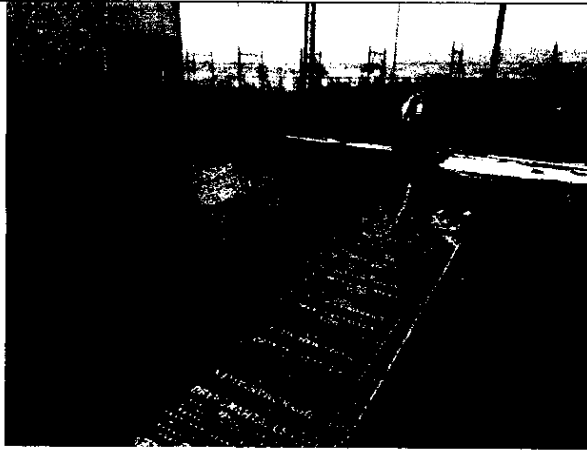

Impermeabilização do piso da Quadra

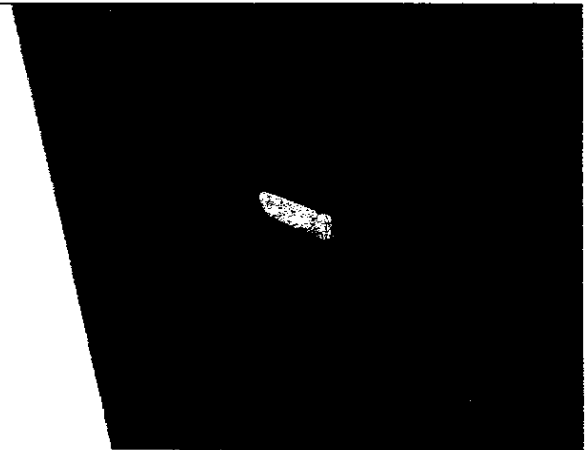

Instalação de portas e maçanetas



Instalação elétrica, luminárias



Retirada de terra- execução dos muros de arrimo



Corte de terra- execução dos muros de arrimo



Instalação de aparelhos de Ar Condicionado



Nº:

RF-01

RE

V. 00

CLIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

FOLHA:

4 de 9

TÍTULO:

FINALIZAÇÃO DA OBRA EMEB ALVORADA  
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO ADITIVO 2




Movimento de terra- execução dos muros de arrimo



Execução de fundação dos muros de arrimo




Execução de fundação dos muros de arrimo

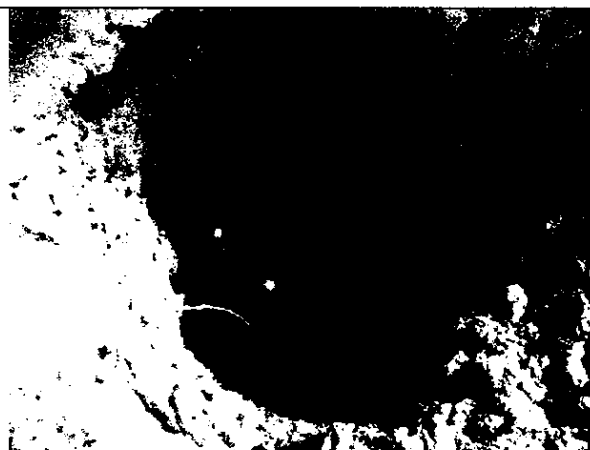

Execução de fundação dos muros de arrimo



Execução de fundação dos muros de arrimo

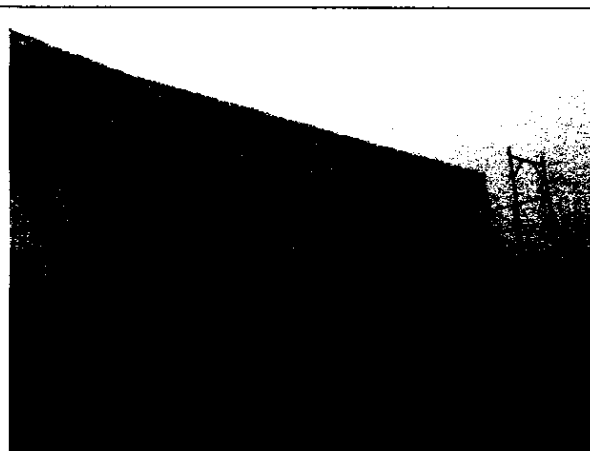

Instalação de Condensadoras do sistema de Ar Condicionado



Nº:

RF-01

RE

V.

00

CLIENTE


PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

FOLHA:

5 de 9

TÍTULO:

FINALIZAÇÃO DA OBRA EMEB ALVORADA  
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO ADITIVO 2

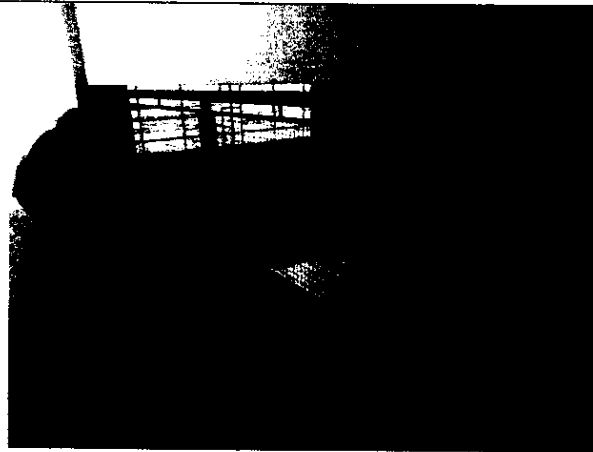


Pintura das grades de proteção das rampas



Execução de soleiras em granito, portas, pintura e maçanetas.



Pintura interna

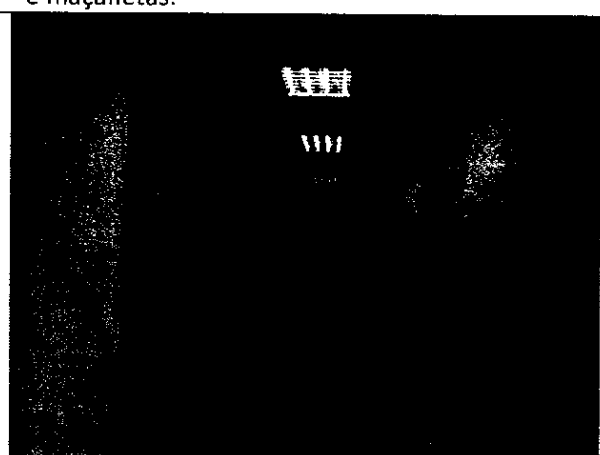

Instalações elétricas



Execução de Alambrados nos limites do terreno



Execução de Alambrados nos limites do terreno



Nº

RF-01

RE  
V 00

CLIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

FOLHA:

6 de 9


TÍTULO:

FINALIZAÇÃO DA OBRA EMEB ALVORADA


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO ADITIVO 2




Execução do Muro de arrimo

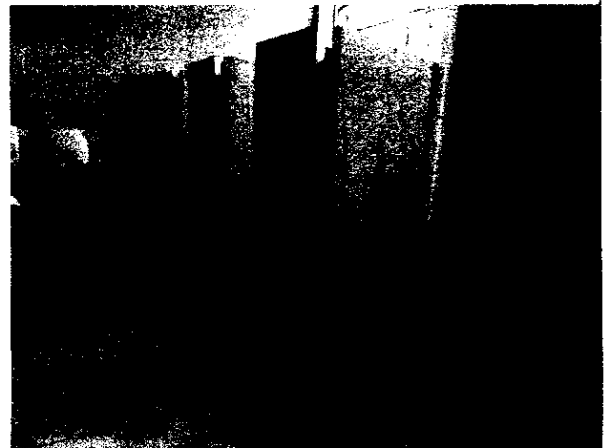

Execução de divisórias sanitárias em ardósia e instalação de portas

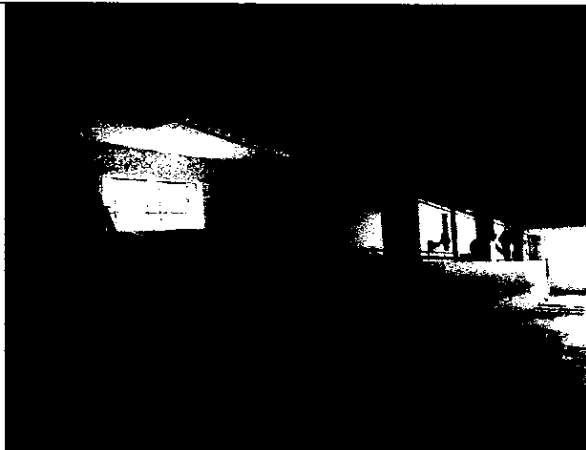

Pintura de corrimão, grades de proteção e paredes

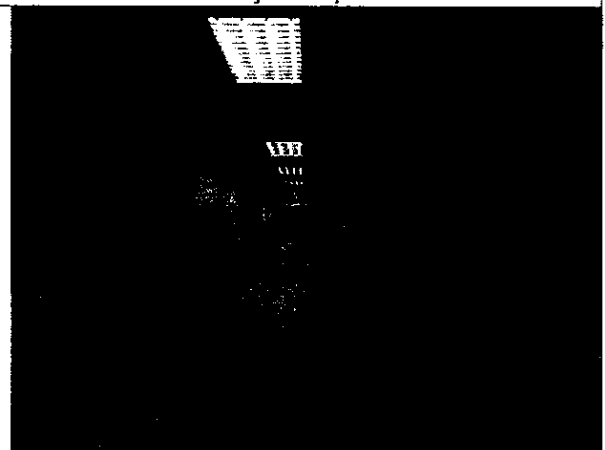

Pintura de corrimão, esquadrias e paredes. Instalações elétricas



Execução do Muro de arrimo



Pintura de caixilhos



Nº:

RF-01

RE  
V. 00

CLIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS


FOLHA:

7 de 9


TÍTULO:

FINALIZAÇÃO DA OBRA EMEB ALVORADA


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO ADITIVO 2

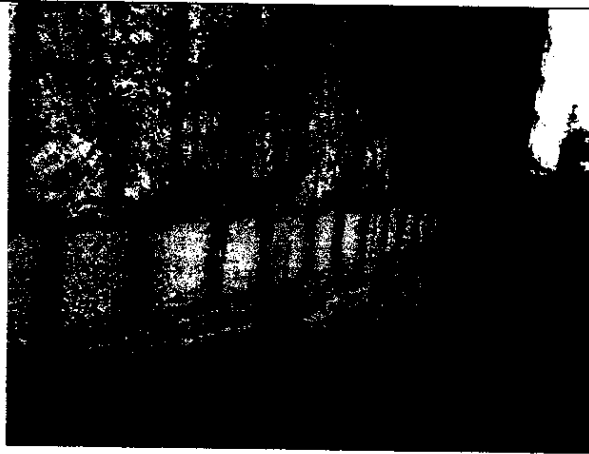


Execução do Muro de arrimo

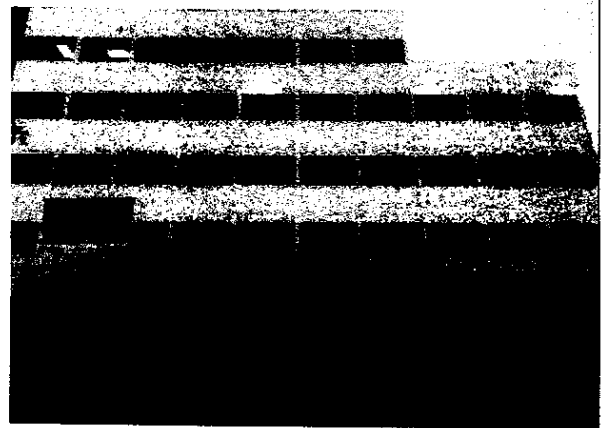


Pintura das fachadas concluídas.

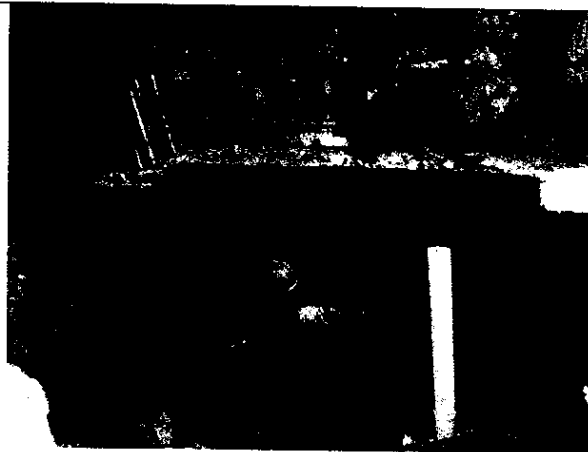

Impermeabilização e regularização dos muros de arrimo

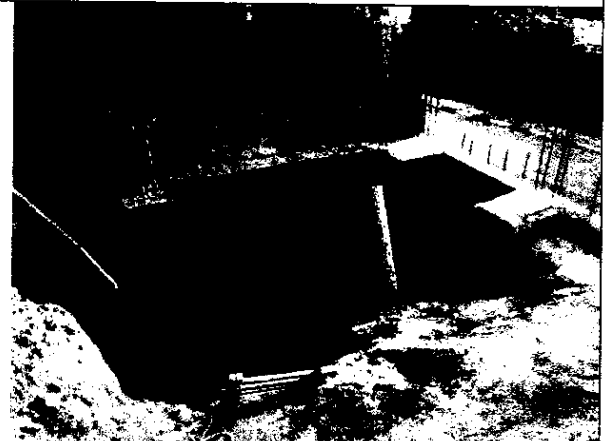

Impermeabilização e regularização dos muros de arrimo

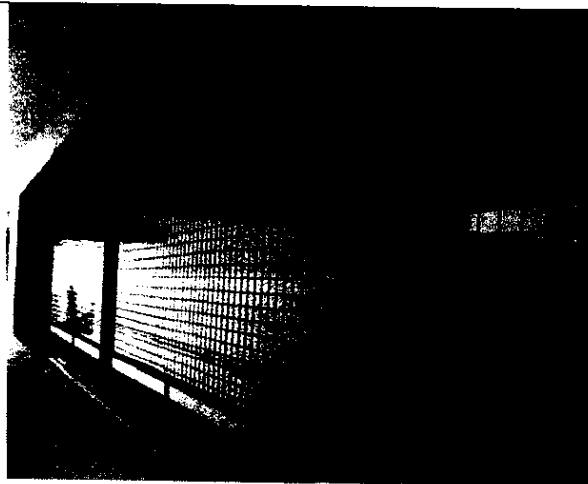

Detalhe das grades de proteção.



Retirada e transporte de terra





Nº:

RF-01

RE  
V. 00

CLIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

FOLHA:

8 de 9

TÍTULO:

**FINALIZAÇÃO DA OBRA EMEB ALVORADA**  
**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO ADITIVO 2**

Instalação de ventiladores, luminárias



Retirada e transporte de terra



Salas internas concluídas



Pintura esmalte



Pintura de paredes externas



Instalação de alambrado, pintura dos pilaretes



Nº:

RF-01

RE  
V. 00


CLIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS


FOLHA:

9 de 9


TÍTULO:

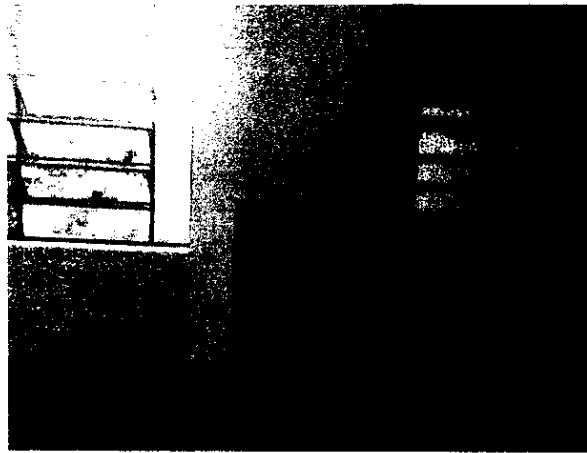FINALIZAÇÃO DA OBRA EMEB ALVORADA  
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO ADITIVO 2


Instalações de incêndio, pintura esmalte

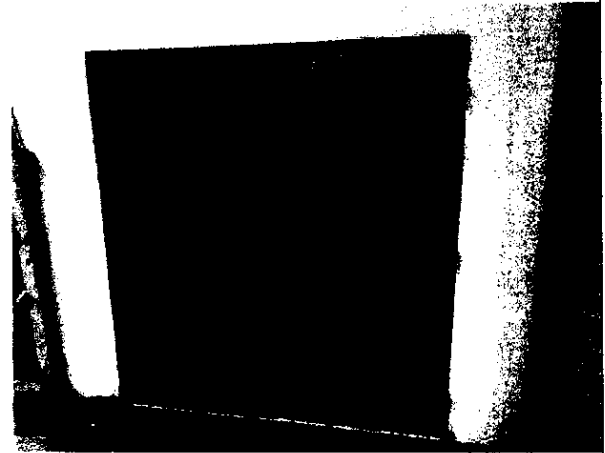

Pintura esmalte de esquadrias metálicas

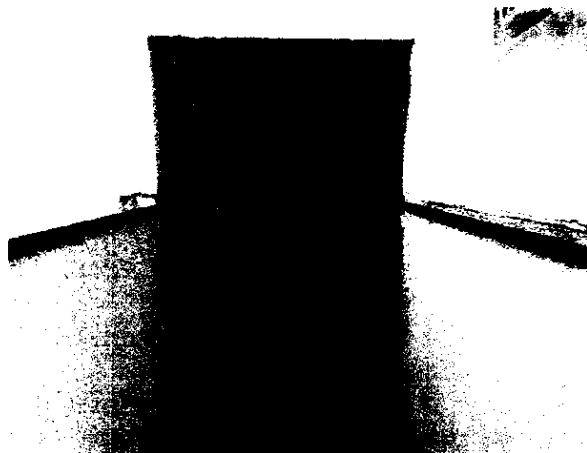

Pintura esmalte de esquadrias metálicas

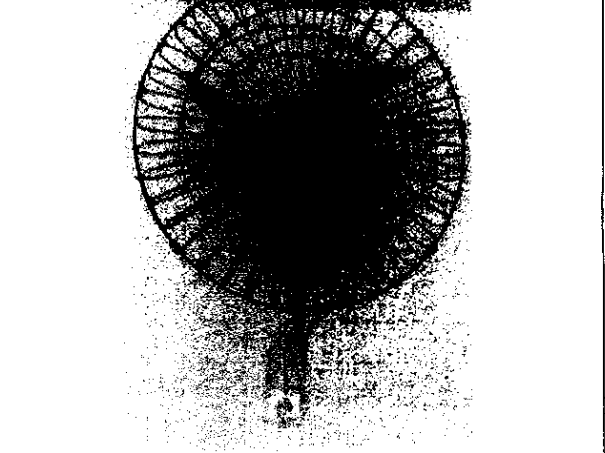

Ventiladores de parede



# PREFEITURA DE VALINHOS

C.I. nº 026/2020 – D.O.P. / S.O.S.P.

Valinhos, Estado de São Paulo, 07 de fevereiro de 2020.

**Do:** Depto. de Obras Públicas / Secretaria de Obras e Serviços Públicos.

**Para:** Secretaria de Licitações – S.L.


**Assunto:** Envio de Documentação EMEB Alvorada..

Estamos encaminhando anexo os seguintes documentos:

- Justificativas do Aditivo II da EMEB Alvorada – Parque Cocais
- Projeto do Muro de Arrimo.
- Projeto da Mureta de Contenção de Talude.

Atenciosamente.

  
**Eng.º Jose Eduardo Figueiredo**  
Departamento de Obras Públicas  
Diretor

  
**Gerson Luiz Segato**  
Secretaria de Obras e Serviços Públicos  
Secretário

AO  
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ADITIVOS  
Para *Prendencia*  
S.L., em *12/02/2020*

  
**Markson Elianai Vieira**  
Secretaria de Licitações  
Secretário

## JUSTIFICATIVAS DO ADITIVO II DA EMEB ALVORADA – PARQUE DOS COCAIS

Item 1.16 – Será instalado o portão de divisa entre a quadra de esportes e o acesso a unidade escolar, visando a segurança dos alunos, para impedimento da entrada de pessoas estranhas ao interior da unidade e também para o controle de acesso de alunos à quadra durante o período de aulas.

Item 1.17, 1.18, 1.19 e 10.20 – O aumento de quantidade das guias é referente à alteração de projeto da calçada externa, para melhorias no acesso de veículos escolares e também adequação da quantidade de vagas e atendimento à acessibilidade.

Item 2.30, 2.31, 2.32 e 2.33 – Na planilha contratual estavam previstos itens referentes ao muro de arrimo, porém não havia projeto executivo com o detalhamento. Sendo assim, foi necessária a adequação dos itens conforme projeto elaborado e aprovado pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos.

Item 3.26, 3.27, 3.28, 3.29 e 3.30 – Na planilha inicial foi estimada a quantidade para a mureta de arrimo considerando altura de 0,80 m, porém durante a execução da obra foi necessário a elaboração do projeto executivo alterando a altura para 1,60 m e, conseqüentemente o ajuste de quantidades da planilha.

Item 4.6 - Na elaboração do projeto executivo do muro e mureta de arrimo, foi detectada a necessidade de execução de drenagem não prevista no contrato inicial.

Item 7.21 – No projeto inicial não havia previsão de ralos para escoamento da água de lavagem da escola, portanto foi incluído este serviço no escopo deste contrato.

Item 11.11 – Devido a alteração de escopo da unidade de ensino básico com a inclusão do ensino infantil, foi necessária a alteração de uma das salas de aula, para criação de uma secretaria para o diretor e vice-diretor da unidade, trazendo a necessidade de um local para atendimento exclusivo de pais de alunos no andar onde são ministradas as aulas, afim de evitar a circulação pelas rampas e assim melhorando o acesso interno e segurança dos alunos nos compartimentos internos da escola.

Item 11.12 – Devido a alteração de uso da escola para o ensino básico com a inclusão do ensino infantil, será necessário o fechamento dos vãos existentes acima do guarda-corpo das rampas, para a segurança dos alunos.



Item 14.51 – No projeto executivo aprovado, os ventiladores previstos são de parede, portanto foi necessário estornar os ventiladores de teto e acrescentar a quantidade dos ventiladores de parede previstos na planilha contratual em menor quantidade.

Item 14.52 – Conforme informado no item 11.11, devido a criação de uma nova secretaria na unidade escolar, foi necessária a inclusão de um aparelho de ar condicionado para climatização do ambiente.

Item 14.53 e 14.54 – Foi necessária a adequação das quantidades de planilha conforme projeto executivo aprovado.

Item 14.55 e 14.56 – O padrão executado anteriormente estava em desacordo com as normas vigentes da concessionária CPFL, sendo assim foi necessária a elaboração de um novo projeto que foi submetido à aprovação da concessionária para posterior execução do padrão. Desta forma os itens previstos inicialmente na planilha foram adequados à necessidade do projeto.

Item 16.14, 16.16 e 16.17 – Devido à paralisação da obra por vários anos, em razão do abandono pela gestão passada, o revestimento dos muros externos deteriorou-se e, após a retomada da obra, foi detectada a necessidade de execução do chapisco, emboço e reboco da fachada. Além disso o revestimento existente apresentava pontos de infiltração, portanto o novo revestimento também tem a função de impermeabilização para maior durabilidade.

Item 16.15 – Em razão da deterioração dos azulejos instalados na primeira fase da obra pela gestão passada, tornou-se necessária a substituição parcial desses revestimentos e a instalação sobre os bebedouros para proteção da pintura das paredes.

Item 18.3 – Conforme item 11.11, foi necessária a instalação de um guichê na nova secretaria.

Item 19.28 – Os lavatórios e bebedouros instalados na primeira fase da obra, pela gestão passada sofreram vandalismo e deterioração durante o período de paralisação da obra, trazendo a necessidade de substituição. Além disso, a quantidade de bebedouros prevista anteriormente era insuficiente para atender a atual demanda, inclusive em todos os andares do prédio, portanto foram criados novos bebedouros nos corredores da unidade.

Item 20.28 – O item previsto inicialmente era de pintura acrílica para o piso da quadra de esportes, e será alterado para pintura epóxi, visando a maior durabilidade e resistência ao atrito durante as atividades dos alunos. Minimizando a necessidade de repintura e manutenção por parte da gestão atual.



Item 20.29 – A planilha inicial previa o fechamento lateral da quadra conforme projeto, porém a medida da quadra construída na primeira fase da obra estava divergente. Sendo assim, foi necessária a adequação do quantitativo.

Item 20.30 – Para evitar a entrada de pombos e a proteção das luminárias e cobertura da quadra de esportes, foi solicitada a instalação de tela de proteção em nylon em toda a quadra.

Item 21.24, 21.25, 21.26, 21.27, 21.28, 21.29 e 21.30 – O projeto anterior do corpo de bombeiros foi elaborado durante a primeira fase da obra, devido ao tempo decorrido desde a aprovação do mesmo, foi necessária a elaboração de um novo projeto para atendimento as normas vigentes, e o ajuste de quantitativos da planilha.

Item 22.26 – A Secretaria de Educação solicitou o acréscimo de um fogão na cozinha, para melhor atendimento aos alunos, portanto será necessária a alteração do modelo da coifa inicialmente prevista para uma maior que atenda aos dois fogões.

Item 22.27 – Conforme justificado no item 11.11, para a criação de uma nova secretaria será necessária a adequação das paredes em drywall.


Item 22.28 – Os alambrados instalados na primeira fase da obra sofreram deterioração durante o período de paralisação da obra, visando a segurança dos alunos e colaboradores da unidade, serão substituídos em sua totalidade.

Item 22.29 – Adequação da quantidade conforme levantamento realizado em projeto e in loco.

Valor atualizado do contrato: R\$ 2.345.866,38

Valor do aditivo proposto: R\$ 167.517,13

Valinhos, 07 de Janeiro de 2020




---

José Eduardo Figueiredo

**Departamento de Obras Públicas**

Diretor



---

Engenheiro Mario Luís Fernandes

**Departamento de Obras Públicas**

Fiscal de Obras



# PREFEITURA DE VALINHOS

## TERMO ADITIVO Nº 02 TERMO DE CONTRATO Nº 181/2018 (Aditamento Contratual)

Pelo presente **TERMO ADITIVO** que entre si celebram, de um lado, a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS**, com sede na Rua Antonio Carlos, n.º 301, Centro, Valinhos, SP, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, **ORESTES PREVILATE JÚNIOR**, devidamente assistido pelo Secretário de Licitações, **MARKSON ELIANAI VIEIRA**, pelo Secretário de Educação, **ZENO RUEDELL**, pelo Secretário de Obras e Serviços Públicos, **Engº Civil GERSON LUIS SEGATO**, e pelo Diretor do Departamento de Obras Públicas, **JOSE EDUARDO FIGUEIREDO** e pelo Fiscal **Engº MÁRIO LUIS FERNANDES**, de ora em diante denominada pura e simplesmente **PREFEITURA** e, de outro lado, a empresa **LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.**, com sede na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, n.º 1748, 11º andar, sala 1105 e 1108, Cidade Monções, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP.: 04571-000, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 04.002.395/0001-12, neste ato representada pelo procurador, **LUIZ CARLOS GOMES**, Portador da Cédula de identidade RGn.º 7824196-9 e do CPF n.º 046.446.378-58, residente e domiciliado na cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, de ora em diante denominada pura e simplesmente **CONTRATADA**, têm entre si certo e avençado, em conformidade com os elementos e despachos constantes do **PROCESSO DE COMPRAS Nº 245/2018 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01A/2018 ADITAR O TERMO DE CONTRATO nº 181/2018**, que passa a vigor com a seguinte redação:

### DO VALOR:

**Cláusula 14ª.** O valor total da obra passa a ser de **R\$ 2.345.866,38 (dois milhões trezentos e quarenta e cinco mil oitocentos e sessenta e seis reais e trinta e oito centavos)** devido ao pedido de aditamento no percentual de 8,70% correspondente à importância de R\$ 167.517,13 (cento e sessenta e sete mil quinhentos e dezessete reais e treze centavos).

### DA GARANTIA:

**Cláusula 36ª.** Para garantir o cumprimento das obrigações contratuais, a **CONTRATADA** deverá depositar junto à Secretaria da Fazenda da **PREFEITURA**, na data da assinatura do presente Termo de Contrato, a importância de **R\$ 8.375,85 (oito mil trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos)**, equivalente a **5% (cinco por cento) do valor total do aditamento** nas modalidades previstas no artigo 56, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores atualizações, a qual fará parte integrante deste contrato.

Neste ato ficam **RATIFICADAS** todas as demais cláusulas e parágrafos da Carta Contrato nº 181/2018, inalterados pelo presente Termo Aditivo.



# PREFEITURA DE VALINHOS

**TERMO ADITIVO Nº 02**  
**TERMO DE CONTRATO Nº 181/2018**  
(Aditamento Contratual)

E, por estarem assim, certas e avençadas, assinam as partes, já qualificadas no preâmbulo do presente **TERMO ADITIVO**, digitado em 02 (duas) laudas e firmado em 03 (três) vias, ficando a primeira e segunda vias em poder da Secretaria de Licitações, Compras e Suprimentos da **PREFEITURA** e a terceira via, entregue à **CONTRATADA**.

Valinhos/SP, 15 de janeiro de 2020

Pela **PREFEITURA**:

  
**ORESTES PREVITALE JUNIOR**  
Prefeito Municipal

  
**MARKSON ELIANA VIEIRA**  
Secretário de Licitações

  
**Engº Civil GERSON LUIS SEGATO**  
Secretário de Obras e Serviços Públicos

  
**ZENO RUEDELL**  
Secretário de Educação

  
**JOSE EDUARDO FIGUEIREDO**  
Diretor do Departamento de Obras Públicas

  
**Engº MÁRIO LUIS FERNANDES**  
Fiscal de Obras

Pela **CONTRATADA**:

  
**LEMAM CONST. E COMÉRCIO S.A.**  
Luiz Carlos Gomes





# PREFEITURA DE VALINHOS

## TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

**CONTRATANTE:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS – SP.

**CONTRATADA:** LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A., inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.002.395/0001-12.

### **TERMO CONTRATO Nº 181/2018**

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada de engenharia, para execução do término da construção da EMEB ALVORADA localizada na Rua Antônio Carlos Prado, Parque dos Cocais, na cidade de Valinhos, Estado de São Paulo, na qual engloba o fornecimento de material, mão-de-obra e ferramental necessário para a execução do objeto, conforme as especificações constantes neste anexo.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

#### **1. Estamos CIENTES de que:**

- a) O ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

#### **2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:**

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Valinhos, 15 de janeiro de 2020

#### **GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:**

Nome: **GERSON LUIS SEGATO**

Cargo: Secretário de Obras e Serviços Públicos

CPF: 120.609.628-46 e RG: 9.297.434-X

Data de Nascimento: 20.06.1964

Endereço residencial completo: Rua Modesta Poli Martins, nº 51, Vila Norma, Valinhos/SP

E-mail institucional: [glsegato@yahoo.com.br](mailto:glsegato@yahoo.com.br)

E-mail pessoal: [glsegato@valinhos.sp.gov.br](mailto:glsegato@valinhos.sp.gov.br)

Telefone: (19) 38278007

Assinatura: \_\_\_\_\_

Nome: **ZENO RUEDELL**

Cargo: Secretário da Educação

CPF: 337.872.208-87 e RG: 4.322.282

Data de Nascimento: 31/08/1942

Endereço residencial completo: Rua Paulo Setubal, nº 576, Nova Valinhos, Valinhos/SP

E-mail pessoal: [zeno.ruedell42@gmail.com](mailto:zeno.ruedell42@gmail.com)

E-mail institucional: [zruedell@valinhos.sp.gov.br](mailto:zruedell@valinhos.sp.gov.br)

Telefone: (19) 38712507

Assinatura: \_\_\_\_\_

Nome: **JOSÉ EDUARDO FIGUEIREDO**

Cargo: Diretor do Departamento de Obras Públicas

CPF: 964.209.938-68 e RG: 9.098.940-5

Data de Nascimento: 20/03/1958

Endereço residencial completo: ESTRADA DO JEQUITIBA, 1750 – CASA 150 VENEZA – VALINHOS/SP

E-mail pessoal: [edu.figue@yahoo.com.br](mailto:edu.figue@yahoo.com.br)

E-mail institucional: [edu.figue@yahoo.com.br](mailto:edu.figue@yahoo.com.br)

Telefone: (19) 38296018

Assinatura: \_\_\_\_\_



# PREFEITURA DE VALINHOS

Nome: **MÁRIO LUIS FERNANDES**

Cargo: Engenheiro

CPF: 005.637.848-30 e RG: 6.661.643-8

Data de Nascimento: 08/04/1954

Endereço residencial completo: Rua João Alencar, nº 183, Jardim Santa Helena, Valinhos/SP

E-mail pessoal: [mlfernandes@valinhos.sp.gov.br](mailto:mlfernandes@valinhos.sp.gov.br)

E-mail institucional: [mlfernandes@valinhos.sp.gov.br](mailto:mlfernandes@valinhos.sp.gov.br)

Telefone: (19) 99278-2417

Assinatura: \_\_\_\_\_

## Responsáveis que assinaram o ajuste:

### Pelo CONTRATANTE:

Nome: **ORESTES PREVITALE JUNIOR**

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 079.675.168-42 e RG: 15.854.987-9

Data de Nascimento: 03/04/1967

Endereço residencial completo: Rua Paiquerê, nº 165, casa 07, Monte Carlos - Valinhos/SP

E-mail institucional: [gabinete.prefeito@valinhos.sp.gov.br](mailto:gabinete.prefeito@valinhos.sp.gov.br)

E-mail pessoal: [gabinete.prefeito@valinhos.sp.gov.br](mailto:gabinete.prefeito@valinhos.sp.gov.br)

Telefone: (19) 3849-8072

Assinatura: \_\_\_\_\_

Nome: **MARKSON ELIANAI VIEIRA**

Cargo: Secretário de Licitações

CPF: 205.361.378-54 e RG: 23532735-9

Data de Nascimento: 14/12/1974

Endereço residencial: Rua Vitório Colombo Rossi, 238, Valinhos/SP

E-mail institucional: [marcksonvieira@gmail.com](mailto:marcksonvieira@gmail.com)

E-mail pessoal: [marcksonvieira@gmail.com](mailto:marcksonvieira@gmail.com)

Telefone: (19) 3327-8456

Assinatura: \_\_\_\_\_

Nome: **GERSON LUIS SEGATO**

Cargo: Secretário de Obras e Serviços Públicos

CPF: 120.609.628-46 e RG: 9.297.434-X

Data de Nascimento: 20.06.1964

Endereço residencial completo: Rua Modesta Poli Martins, nº 51, Vila Norma, Valinhos/SP

E-mail institucional: [gsegato@yahoo.com.br](mailto:gsegato@yahoo.com.br)

E-mail pessoal: [gsegato@valinhos.sp.gov.br](mailto:gsegato@valinhos.sp.gov.br)

Telefone: (19) 38278007

Assinatura: \_\_\_\_\_

Nome: **ZENO RUEDELL**

Cargo: Secretário da Educação

CPF: 337.872.208-87 e RG: 4.322.282

Data de Nascimento: 31/08/1942

Endereço residencial completo: Rua Paulo Setubal, nº 576, Nova Valinhos, Valinhos/SP

E-mail pessoal: [zeno.ruedell42@gmail.com](mailto:zeno.ruedell42@gmail.com)

E-mail institucional: [zruedell@valinhos.sp.gov.br](mailto:zruedell@valinhos.sp.gov.br)

Telefone(s): (19) 38712507

Assinatura: \_\_\_\_\_

Nome: **JOSÉ EDUARDO FIGUEIREDO**

Cargo: Diretor do Departamento de Obras Públicas

CPF: 964.209.958-68 e RG: 9.098.940-5

Data de Nascimento: 20/03/1958

Endereço residencial completo: ESTRADA DO JEQUITIBA, 1750 - CASA 150 VENEZA - VALINHOS/SP

E-mail pessoal: [edu.figue@yahoo.com.br](mailto:edu.figue@yahoo.com.br)

E-mail institucional: [edu.figue@yahoo.com.br](mailto:edu.figue@yahoo.com.br)

Telefone: (19) 38296018

Assinatura: \_\_\_\_\_



# PREFEITURA DE VALINHOS

Nome: **MÁRIO LUIS FERNANDES**

Cargo: Engenheiro

CPF: 005.637.848-30 e RG: 6.661.643-8

Data de Nascimento: 08/04/1954

Endereço residencial completo: Rua João Alencar, nº 183, Jardim Santa Helena, Valinhos/SP

E-mail pessoal: [mlfernandes@valinhos.sp.gov.br](mailto:mlfernandes@valinhos.sp.gov.br)

E-mail institucional: [mlfernandes@valinhos.sp.gov.br](mailto:mlfernandes@valinhos.sp.gov.br)

Telefone: (19) 99278-2417

Assinatura: \_\_\_\_\_

**Pela CONTRATADA:**

Nome: **LUIZ CARLOS GOMES**

Cargo: Procurador

CPF: 046.446.378-58 e RG: 17.824.196-9

Data de Nascimento: não informado

Endereço residencial completo: Conde Luiz Eduardo Matarazzo, 250, apto 41 – Cidade São Francisco, São Paulo-SP

E-mail: [comercial@lemamconstruções.com.br](mailto:comercial@lemamconstruções.com.br)

Assinatura: \_\_\_\_\_

Termo de Aditivo nº: 02  
 Termo de Contrato nº: 001/2018  
 Processo Compras nº: 321/2017  
 Modalidade de Licitação: PP 133/2017  
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS  
 Contratada: UNICA – LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ/MF sob nº 46.235.461/0001-44

Objeto: Contratação de empresa especializada para a realização dos serviços de limpeza técnica hospitalar na Unidade UPA Valinhos, localizada na Avenida Gessy Lever, nº 550, bairro Lenheiro, na cidade de Valinhos, São Paulo, com o fornecimento de equipamentos, mão de obra e materiais, em conformidade com o estabelecido no ANEXO 01 – CARACTERÍSTICAS DO OBJETO

Fonte de Recurso: Própria  
 Vigência: Prorrogado por 12 meses  
 Valor: R\$ 507.277,75  
 Data da Assinatura: 03/01/2020

Termo Aditivo nº: 02

Termo de Contrato nº: 181/2018

Processo Compras nº: 245/2018

Modalidade de Licitação: Concorrência 01/2018

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Contratada: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A., com sede na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 1748, 11º andar, sala 1105 e 1108, Cidade Moções, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04571-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.002.395/0001-12

Objeto: Contratação de empresa especializada de engenharia, para execução do término da construção da EMEB ALVORADA localizada na Rua Antônio Carlos Prado, Parque dos Cocais, na cidade de Valinhos, Estado de São Paulo, na qual engloba o fornecimento de material, mão-de-obra e ferramental necessário para a execução do objeto, conforme as especificações constantes neste anexo

Fonte de Recurso: Própria  
 Vigência: Sem alteração  
 Valor: R\$ 167.517,13  
 Data da Assinatura: 15/01/2020

Termo de Aditivo nº: 08

Termo de Contrato nº: 048/2016

Processo Compras nº: 368/2015

Modalidade de Licitação: Concorrência 01A/2015

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Contratada: MAIC ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 45.787.678/0001-02

Objeto: Constitui objeto do presente instrumento contratual a Contratação de empresa especializada de engenharia, para o fornecimento de material, mão-de-obra e ferramental necessário para construção da Creche no Bairro São Luiz, na cidade de Valinhos, São Paulo, pelo critério do menor preço global.

Fonte de Recurso: Convênio com o Governo do Estado de São Paulo – Convênio PAEM/Educação Infantil/2014 – Código FDE: 12.02.277, PI – 2013/02243, Processo nº 06918/2013-SE

Vigência: Prorrogado por 03 meses  
 Valor: Sem alteração  
 Data da Assinatura: 22/01/2020

Termo de Aditivo nº: 06

Termo de Contrato nº: 076/2016

Processo Compras nº: 393/2015

Modalidade de Licitação: PP 122/2015

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Contratada: LOUVEL COMUNICAÇÃO COMERCIAL LTDA ME, com sede Rua Bento Martins Cruz, nº 253, Vila Pasti, Louveira, Estado de São Paulo, CEP 13.290-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.058.304/0001-84

Objeto: Constitui objeto do presente a contratação de empresa especializada para a locação de sistema de rádio comunicação digital, dimensionado para a rede de comunicação de Guarda Civil Municipal e para a Secretaria de Transportes e Trânsito a cidade de Valinhos, São Paulo, em conformidade com o estabelecido no Anexo 01 - Características do Objeto.

Fonte de Recurso: Própria  
 Vigência: Prorrogado por 12 meses  
 Valor: R\$ 146.400,00  
 Data da Assinatura: 04/02/2020

Termo de Aditivo nº: 01

Termo de Contrato nº: 24/2019

Processo Compras nº: 397/2018

Modalidade de Licitação: PP 188/2018

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Contratada: ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL GIZ COLORÊ LTDA - ME, com sede Rua Campos Salles, nº 289, Centro, CEP 13.271-900, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.029.682/0001-06

Objeto: Contratação de escolas de educação infantil, para a disponibilização de vagas, de creches, distribuídos em lotes, conforme segue: Lote 01 – 40 (quarenta) vagas multisseriadas em período integral, em conformidade com as especificações constantes neste anexo.

Fonte de Recurso: Própria  
 Vigência: Prorrogado por 12 meses  
 Valor: R\$ 466.881,60  
 Data da Assinatura: 30/01/2020

Termo de Aditivo nº: 01

Termo de Contrato nº: 25/2019

Processo Compras nº: 397/2018

Modalidade de Licitação: PP 188/2018

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Contratada: COLÉGIO RINNOVARE BERCARIO E EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob nº 31.089.715/0001-96

Objeto: Contratação de escolas de educação infantil, para a disponibilização de vagas, de creches, distribuídos em lotes, conforme segue: Lote 02 – 60 (sessenta) vagas multisseriadas em período integral, em conformidade com as especificações constantes neste anexo.

Fonte de Recurso: Própria

Vigência: Prorrogado por 12 meses

Valor: R\$ 707.774,40

Data da Assinatura: 30/01/2020

Termo de Aditivo nº: 01

Termo de Contrato nº: 26/2019

Processo Compras nº: 397/2018

Modalidade de Licitação: PP 188/2018

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Contratada: INSTITUTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL LÁPIS DE COR S/C LTDA-ME., inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.566.275/0001-50

Objeto: Contratação de escolas de educação infantil, para a disponibilização de vagas, de creches, distribuídos em lotes, conforme segue: Lote 05 – 60 (sessenta) vagas multisseriadas em período integral, em conformidade com as especificações constantes do Anexo 01 – Características do Objeto.

Lote 06 – 60 (sessenta) vagas multisseriadas em período integral, em conformidade com as especificações constantes do Anexo 01 – Características do Objeto

Fonte de Recurso: Própria

Vigência: Prorrogado por 12 meses

Valor: R\$ 1.415.548,80

Data da Assinatura: 30/01/2020

Termo de Aditivo nº: 01

Termo de Contrato nº: 27/2019

Processo Compras nº: 397/2018

Modalidade de Licitação: PP 188/2018

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Contratada: JL NSTITUTO EDUCACIONAL DE VALINHOS LTDA-EPP., inscrita no CNPJ/MF sob nº 18.829.162/0001-00

Objeto: Contratação de escolas de educação infantil, para a disponibilização de vagas, de creches, distribuídos em lotes, conforme segue:

Lote 07 – 60 (sessenta) vagas multisseriadas em período integral, em conformidade com as especificações constantes do Anexo 01 – Características do Objeto.

Lote 08 – 60 (sessenta) vagas multisseriadas em período integral, em conformidade com as especificações constantes do Anexo 01 – Características do Objeto

Fonte de Recurso: Própria

Vigência: Prorrogado por 12 meses

Valor: R\$ 1.415.548,80

Data da Assinatura: 30/01/2020

Termo de Aditivo nº: 02

Termo de Contrato nº: 23/2018

Processo Compras nº: 458/2017

Modalidade de Licitação: PP 198/2017

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Contratada: ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL GIZ COLORÊ LTDA - ME, com sede Rua Campos Salles, nº 289, Centro, CEP 13.271-900, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.029.682/0001-06

Objeto: Constitui objeto do presente instrumento a contratação de escola de educação infantil para a disponibilização de vagas, conforme segue: Lote 02 – 60 (sessenta) vagas multisseriadas em período integral em conformidade com as especificações constantes do ANEXO 01 – CARACTERÍSTICAS DO OBJETO

Fonte de Recurso: Própria

Vigência: Prorrogado por 12 meses

Valor: R\$ 727.099,20

Data da Assinatura: 29/01/2020

Termo de Aditivo nº: 02

Termo de Contrato nº: 24/2018

Processo Compras nº: 458/2017

Modalidade de Licitação: PP 198/2017

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Contratada: COLÉGIO CASTELO BALUARTE BABY LTDA - EPP, com sede à Rua Pietro Stopiglia, nº 578, Parque Santana, CEP 13.274-260, inscrita no CNPJ/MF sob nº 26.173.890/0001-27

Objeto: Constitui objeto do presente instrumento a contratação de escola de educação infantil para a disponibilização de vagas, conforme segue: Lote 03 – 100 (cem) vagas multisseriadas em período integral em conformidade com as especificações constantes do ANEXO 01 – CARACTERÍSTICAS DO OBJETO

Fonte de Recurso: Própria

Vigência: Prorrogado por 12 meses

Valor: R\$ 1.488.720,00

Data da Assinatura: 30/01/2020

Termo de Aditivo nº: 02

Termo de Contrato nº: 20/2019

Processo Compras nº: 382/2018

Modalidade de Licitação: PP 182/2018

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Contratada: MACTUR FRETAMENTOS LTDA. EPP., inscrita no CNPJ/MF sob nº 64.170.087/0001-28

Objeto: Contratação de empresa especializada para a realização de serviços de transporte para utilização de professores e alunos em eventuais atividades extracurriculares e eventos coordenados pela Secretaria de Educação da Prefeitura de Valinhos/SP, em conformidade com as especificações estabelecidas no ANEXO 01 – "Características do Objeto" e seguintes: Item 02 - Serviços de Transporte tipo VAN, com capacidade para 15 (quinze) lugares, cujo ano de fabricação não seja inferior a 2008, para a quantidade estimada de 12.000 (doze mil) quilômetros, pelo período de 12 (doze) meses, no qual engloba motorista e monitor

Fonte de Recurso: Própria

Vigência: Prorrogado por 12 meses

Valor: R\$ 94.783,20

Data da Assinatura: 29/01/2020
